



| ID | Režim | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 4.XII.17 | 18.XII.17 | 11.1.18 | 15.1.18 | 29.1.18 | 12.2.18 | 26.2.18 | 12.3.18 | 26.3.18 | 9.4.18 | 23.4.18 | 7.5.18 | 21.5.18 | 4.6.18 | |
|----|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---|
| | úkolů | | | | | U | S | S | N | C | P | P | U | S | S | N | C | P | P | U |
| 0 | | Rekonstrukce potrubních rozvodů CTR III | 176 dny | 8.12.17 | 1.6.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ✓ | Odevzdání nabídky | 0 dny | 8.12.17 | 8.12.17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ✓ | Oznámení o výsledku výběrového řízení | 0 dny | 15.12.17 | 15.12.17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Odvlačací doba | 14 dny | 15.12.17 | 28.12.17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Podpis SOD | 1 den | 29.12.17 | 29.12.17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Zpracování WPS | 1 den | 30.12.17 | 30.12.17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Matenář na rekonstrukci potrubních větví | 9 týdnů | 30.12.17 | 2.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Technická příprava vyhotovení detailních technologických postupů | 21 dny | 30.12.17 | 19.1.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Zpracování detailního dokumentu "Analýza rizik" | 21 dny | 30.12.17 | 19.1.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Zhotovení výrobní dokumentace včetně detailního plánu kontrol a zkoušek | 28 dny | 30.12.17 | 26.1.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Ověření technologických postupů, příprava vybavení pro TZ | 28 dny | 30.12.17 | 26.1.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Nátěr potrubí kromě ořezávacích konců | 12 dny | 19.2.18 | 2.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Předvýroba - potrubní větev č.209-RO-700-AFB | 10 dny | 3.3.18 | 12.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Předvýroba nové části potrubí cca 20m (včetně technol.hrdla) | 5 dny | 3.3.18 | 7.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Tlaková zkouška potrubí | 2 dny | 8.3.18 | 9.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Nátěr potrubí | 3 dny | 10.3.18 | 12.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Předvýroba potrubní větev č.201-RO-700-AFB část1 + část2 | 7 dny | 8.3.18 | 14.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Předvýroba částí nového potrubí (kompenzátor, 2x úsek s technol.hrdlem, 20m úseky koncová klenutá dna) | 7 dny | 8.3.18 | 14.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Předvýroba potrubní větev č.202-RO-700-AFB | 7 dny | 15.3.18 | 21.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Předvýroba částí nového potrubí (kompenzátor, úsek s technol.hrdlem, 20m úseky koncové klenuté dna) | 7 dny | 15.3.18 | 21.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Předvýroba potrubní větev č.302-RO-700-AFB část1 + část2 | 7 dny | 27.3.18 | 2.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Předvýroba částí nového potrubí (kompenzátor, úsek s technol.hrdlem, 20m úseky koncové klenuté dna) | 7 dny | 27.3.18 | 2.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Předvýroba potrubní větev č.219-RO-700-AFB | 12 dny | 22.3.18 | 2.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Předvýroba nové části potrubí cca 20m (včetně technol.hrdla) | 5 dny | 22.3.18 | 26.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Tlaková zkouška potrubí | 2 dny | 27.3.18 | 28.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Nátěr potrubí | 5 dny | 29.3.18 | 2.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Výbudování zařízení staveniště | 14 dny | 7.3.18 | 21.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ✓ | 1.etapa odstávka březen 2018 | 30 dny | 26.3.18 | 24.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Potrubní větev č.209-RO-700-AFB | 12 dny | 26.3.18 | 6.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Bezpečnostní zasípení DN700 na rozdělovači | 1 den | 26.3.18 | 26.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |

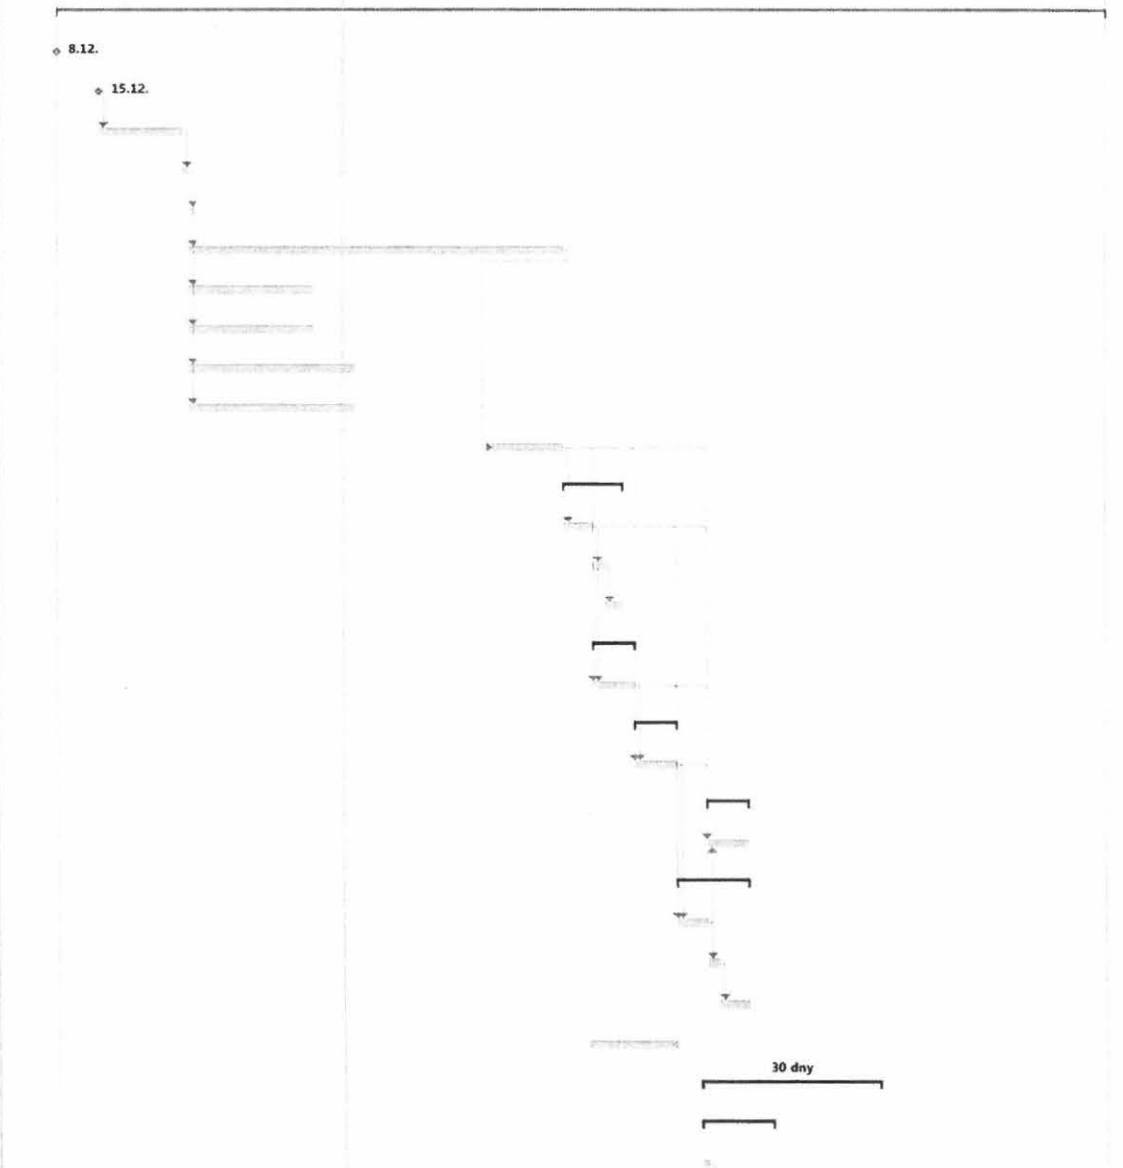


Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 00261/INV

| ID | Režim | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 4 XII 17 | 18 XII 17 | 1 I 18 | 15 I 18 | 29 I 18 | 12 II 18 | 26 II 18 | 12 III 18 | 26 III 18 | 9 IV 18 | 23 IV 18 | 7 V 18 | 21 V 18 | 4 V | |
|----|-------|--|---------------|----------------|----------------|----------|-----------|--------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|-----|---|
| | | | | | | U | S | S | N | C | P | P | U | S | S | N | C | P | P | U |
| 30 | | Bezpečnostní slopení na hrdlech tanku H04 | 1 den | 26.3.18 | 26.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Demontáž vyměňované části potrubí | 3 dny | 27.3.18 | 29.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Odvoz dílů na čištní a do výkupu šrotu | 8 dny | 30.3.18 | 6.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | Zaslepení stávající části pomocí těsnícího vaku | 1 den | 27.3.18 | 28.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Vyčištění konce od zbytku ropy, odmaštění, vysušení | 0,5 dny | 28.3.18 | 28.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Zhotovení ochrany čela těs. vaku bentonitovou zátkou | 0,5 dny | 29.3.18 | 29.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | Montáž vyměňované části, včetně závěrečného svaru a NDT | 2 dny | 29.3.18 | 31.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Vyjmutí těsnícího vaku montáž záslepek technologického hrdla | 1 den | 31.3.18 | 1.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Oprava nářetí, technologické značení potrubí | 1 den | 1.4.18 | 2.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | Geodetické zaměření spádů potrubí | 1 den | 2.4.18 | 3.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Dokumentace skutečného provedení | 3 dny | 1.4.18 | 4.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Odslepení potrubí předání do provozu | 1 den | 4.4.18 | 5.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | Potrubní větev č. 201-RO-700-AFB část 1 + část 2 | 18 dny | 26.3.18 | 12.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | Bezpečnostní zaslepení DN700 na odbočkách k jednotlivým tankům | 3 dny | 26.3.18 | 28.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Bezpečnostní slopení na koncovém rozdělovači | 1 den | 29.3.18 | 29.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | Bezpečnostní slopení na odbočce k čerpací stanici | 1 den | 29.3.18 | 29.3.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | Potrubní větev č. 201-RO-700-AFB část 1 | 11 dny | 30.3.18 | 9.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | Demontáž vyměňované části potrubí | 3 dny | 30.3.18 | 1.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Odvoz dílů na čištní a do výkupu šrotu | 6 dny | 2.4.18 | 7.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Zaslepení stávající části pomocí těsnícího vaku 2x | 1 den | 2.4.18 | 2.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | Vyčištění konce od zbytku ropy, odmaštění, vysušení 2x | 1 den | 3.4.18 | 3.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | Zhotovení ochrany čela těs. vaku bentonitovou zátkou 2x | 1 den | 4.4.18 | 4.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | Montáž vyměňované části, včetně NDT | 4 dny | 2.4.18 | 5.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | Tlaková zkouška potrubí | 1 den | 6.4.18 | 6.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | Odfiznutí klenutých vik, montáž koncových dílců včetně NDT | 2 dny | 7.4.18 | 8.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | Vyjmutí těsnících vaků montáž záslepek technologických hrdel | 1 den | 9.4.18 | 9.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | Potrubní větev č. 201-RO-700-AFB část 2 | 10 dny | 1.4.18 | 10.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | Demontáž vyměňované části potrubí | 3 dny | 1.4.18 | 3.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | Odvoz dílů na čištní a do výkupu šrotu | 6 dny | 4.4.18 | 9.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | Zaslepení stávající části pomocí těsnícího vaku 2x | 1 den | 4.4.18 | 4.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |



| ID | Režim | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 4.XII.17 | 18.XII.17 | 11.1.18 | 15.1.18 | 29.1.18 | 12.2.18 | 26.2.18 | 12.3.18 | 26.3.18 | 9.4.18 | 23.4.18 | 7.5.18 | 21.5.18 | 4.VI.18 | |
|-------|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---|
| ukolu | | | | | | U | S | S | N | C | P | P | U | S | S | N | C | P | P | U |
| 60 | | Vyčistění konce od zbytku ropy, odmaštění, vysušení 2x | 1 den | 5.4.18 | 5.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | Zhotovení ochrany čela těs. vaku bentonitovou zátkou 2x | 1 den | 6.4.18 | 6.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | Montáž vyměřované části, včetně zásepky pro TZ, a včetně NDT | 4 dny | 4.4.18 | 7.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | Tlaková zkouška potrubí | 1 den | 8.4.18 | 8.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | Odfiznutí klenutých vik, montáž koncových dílců včetně NDT | 2 dny | 9.4.18 | 10.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | Vyjmutí těsnících vaku montáž zásepky technologických hrdel | 1 den | 10.4.18 | 10.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | Dokumentace skutečného provedení | 1 den | 10.4.18 | 10.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Odslepení potrubí, předání do provozu | 2 dny | 11.4.18 | 12.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | Oprava nálezů, technologické značení potrubí | 1 den | 11.4.18 | 11.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | Geodetické zaměření spádů potrubí | 1 den | 11.4.18 | 11.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | Potrubní větev č.202-RO-700-AFB | 12 dny | 13.4.18 | 24.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | Bezpečnostní zaslepení DN700 na odbočkách k jednotlivým tankům | 2 dny | 13.4.18 | 14.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | Bezpečnostní slepení na koncovém rozdělovači | 1 den | 15.4.18 | 15.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | Bezpečnostní slepení na odbočce k čerpací stanici | 1 den | 15.4.18 | 15.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | Demontáž vyměřované části potrubí | 3 dny | 16.4.18 | 18.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | Zaslepení stávající části pomocí těsnícího vaku | 0,5 dny | 16.4.18 | 16.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | Vyčistění konce od zbytku ropy, odmaštění, vysušení | 0,5 dny | 17.4.18 | 17.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | Zhotovení ochrany čela těs. vaku bentonitovou zátkou | 1 den | 17.4.18 | 18.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | Montáž vyměřované části, včetně zásepky pro TZ, a včetně NDT | 3,5 dny | 17.4.18 | 20.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | Tlaková zkouška potrubí | 1 den | 20.4.18 | 20.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | Odfiznutí klenutého vika, montáž koncového dílu včetně NDT | 1 den | 21.4.18 | 21.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | Vyjmutí těsnícího vaku montáž zásepky technologického hrdla | 1 den | 22.4.18 | 22.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | Odslepení potrubí | 2 dny | 22.4.18 | 23.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | Oprava nálezů, technologické značení potrubí | 2 dny | 20.4.18 | 22.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | Geodetické zaměření spádů potrubí | 1 den | 20.4.18 | 21.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | Dokumentace skutečného provedení | 1 den | 21.4.18 | 22.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | Předání do provozu | 1 den | 24.4.18 | 24.4.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | 2.etapa odstávka (3 týdny) duben - červen 2018 | 21 dny | 30.4.18 | 20.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | Potrubní větev č.302-RO-700-AFB část1 + část2 | 21 dny | 30.4.18 | 20.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | Bezpečnostní zaslepení DN700 na odbočkách k jednotlivým tankům | 3 dny | 30.4.18 | 2.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |

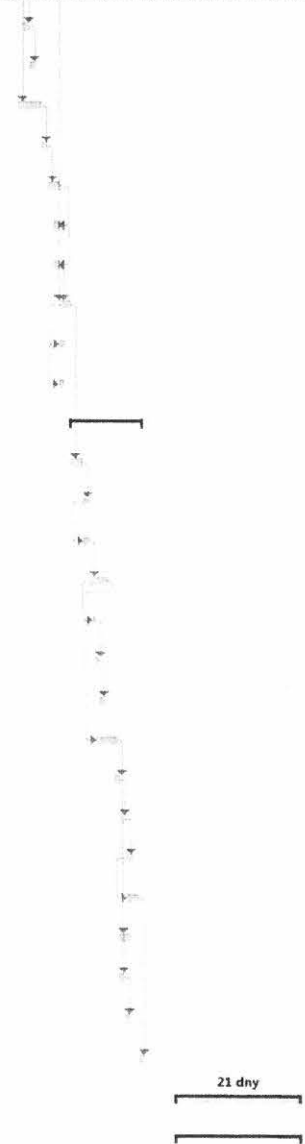

| ID | Režim účelů | Název úkolu | Doba (trvání) | Zahájení | Dokončení | 4.XII.17 | 18.XII.17 | 11.1.18 | 15.1.18 | 29.1.18 | 12.2.18 | 26.2.18 | 12.3.18 | 26.3.18 | 9.4.18 | 23.4.18 | 7.5.18 | 21.5.18 | 4.6.18 | |
|-----|-------------|---|-----------------|---------------|----------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---|
| | | | | | | U | S | N | C | P | U | S | N | C | P | U | S | N | C | P |
| 90 | | Bezpečnostní slepení na koncovém rozdělovači | 1 den | 3.5.18 | 3.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | Bezpečnostní slepení na odbočce k čerpačím stanicím | 1 den | 3.5.18 | 3.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | Demontáž vyměňované části potrubí část1 + část2 | 4 dny | 4.5.18 | 7.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | Zaslepení stávající části pomocí těsnícího vaku | 0,5 dny | 8.5.18 | 8.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | Výšštění konce od zbytků ropy, odmaštění, vysušení | 0,5 dny | 8.5.18 | 8.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | Zhotovení ochrany čela těs vaku bentonitovou zátkou | 1 den | 9.5.18 | 9.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | Montáž vyměňované části včetně záslepky pro TZ a včetně NDT | 6 dny | 8.5.18 | 13.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | Tlaková zkouška potrubí | 2 dny | 13.5.18 | 14.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | Odliznutí klenutého víka, montáž koncového dílu včetně NDT | 1 den | 15.5.18 | 15.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | Vymutí těsnícího vaku montáž záslepky technologického hrdla | 1 den | 16.5.18 | 16.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | Oprava nátěru, technologické značení potrubí | 1 den | 15.5.18 | 15.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | Geodetické zaměření spádů potrubí | 1 den | 16.5.18 | 16.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | Dokumentace skutečného provedení | 1 den | 16.5.18 | 16.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | Odslepení potrubí, předání do provozu | 4 dny | 17.5.18 | 20.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | Potrubní větev č.219-RO-700-AFB | 10,5 dny | 3.5.18 | 13.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | Bezpečnostní zaslepení DN700 na rozdělovači | 1 den | 3.5.18 | 3.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | Bezpečnostní slepení na hrdlech tanku H09 | 1 den | 3.5.18 | 3.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | Demontáž vyměňované části potrubí | 1 den | 4.5.18 | 4.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | Zaslepení stávající části pomocí těsnícího vaku | 0,5 dny | 5.5.18 | 5.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | Výšštění konce od zbytků ropy, odmaštění, vysušení | 0,5 dny | 5.5.18 | 5.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | Zhotovení ochrany čela těs vaku bentonitovou zátkou | 1 den | 5.5.18 | 6.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | Montáž vyměňované části včetně závěrečného svaru a NDT | 2 dny | 6.5.18 | 8.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | Vymutí těsnícího vaku montáž záslepky technologického hrdla | 1 den | 8.5.18 | 9.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | Oprava nátěru, technologické značení potrubí | 1 den | 9.5.18 | 10.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | Geodetické zaměření spádů potrubí | 1 den | 10.5.18 | 11.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | Dokumentace skutečného provedení | 3 dny | 9.5.18 | 12.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | Odslepení potrubí, předání do provozu | 1 den | 12.5.18 | 13.5.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | Likvidace zařízení staveniště | 10 dny | 23.5.18 | 1.6.18 | | | | | | | | | | | | | | | |

