


# Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2 - odlety v T1

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	19.XII 16 So 17.12	16.I 17 Pá 30.12	13.II 17 Čt 12.1	13.III 17 St 25.1	10.IV 17 Út 7.2	8.V 17 Po 20.2	5.VI 17 Ne 5.3	3.VII 17 So 18.3	31.VII 17 Pá 31.3	28.VIII 17 Čt 13.4	25.VIII 17 St 26.4	22.VIII 17 Út 9.5	19.VIII 17 Po 22.5	16.VIII 17 Ne 4.6	13.VIII 17 So 17.6	10.VIII 17 Pá 30.6	7.VIII 17 Čt 13.7	4.VIII 17 St 26.7	1.VIII 17 Út 8.8	29.VII 17 Po 21.8	26.VII 17 Ne 3.9	23.VII 17 So 16.9
1	<b>Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2</b>	<b>20.2. 17</b>	<b>5.9. 17</b>																						
2	Předání Staveniště Dodavateli	20.2. 17	20.2. 17																						
3	Vybudování zařízení staveniště	20.2. 17	24.2. 17																						
4	<b>COB - všechny zóny COB, stanoviště Policie ČR, přípojný body technologií</b>	<b>20.2. 17</b>	<b>1.6. 17</b>																						
5	Předání staveniště COB Zhotoviteli	20.2. 17	20.2. 17																						
6	Demolice	20.2. 17	11.3. 17																						
7	Stavební a konstrukční část	2.3. 17	7.5. 17																						
8	ZTI, VZT, TOPENÍ	8.4. 17	27.5. 17																						
9	Elektroinstalace silno, slabo	29.3. 17	22.5. 17																						
10	Bezpečnostní systémy, informační systém	13.5. 17	1.6. 17																						
11	Předání díla a stanoviště Objednateli	1.6. 17	1.6. 17																						
12	<b>Přeložka sděl. slaboproudých podz. vedení</b>	<b>22.3. 17</b>	<b>1.4. 17</b>																						
13	Přeložení kabelů do nové trasy	22.3. 17	1.4. 17																						
14	<b>Nové únikové cesty (schodiště + lávka)</b>	<b>1.4. 17</b>	<b>15.6. 17</b>																						
15	Předání staveniště schodiště	1.4. 17	1.4. 17																						
16	Zakládání mikropiloty	2.4. 17	16.4. 17																						
17	OK schodiště a lávky	17.4. 17	31.5. 17																						
18	Úprava fasády	22.5. 17	15.6. 17																						
19	Předání Únikové cesty Objednateli	15.6. 17	15.6. 17																						
20	<b>Vybudování zázemí bezpečnostní kontroly, Celní správa, Směnárna</b>	<b>17.4. 17</b>	<b>15.6. 17</b>																						
21	Předání staveniště bezpečnostní kontroly Zhotoviteli	17.4. 17	17.4. 17																						
22	Stavební úpravy Stanoviště bezpečnostní kontroly	17.4. 17	5.6. 17																						
23	Vnitřní vybavení	3.6. 17	15.6. 17																						
24	Předání díla a staveniště SO 02 Objednateli	15.6. 17	15.6. 17																						
25	<b>Nové WC a úprava prostor po stávající bezpečnostní kontrole</b>	<b>1.7. 17</b>	<b>3.9. 17</b>																						
26	Předání staveniště WC Zhotoviteli	1.7. 17	1.7. 17																						
27	Úprava prostor po stávající bezpečnostní kontrole	1.7. 17	24.8. 17																						
28	Demolice stávajících WC	1.7. 17	10.7. 17																						
29	Stavební práce - nové WC	11.7. 17	3.9. 17																						
30	Vybavení WC	25.8. 17	3.9. 17																						
31	Předání díla - Nové WC Objednateli	3.9. 17	3.9. 17																						
32	Zpětné předání Staveniště Objednateli	5.9. 17	5.9. 17																						

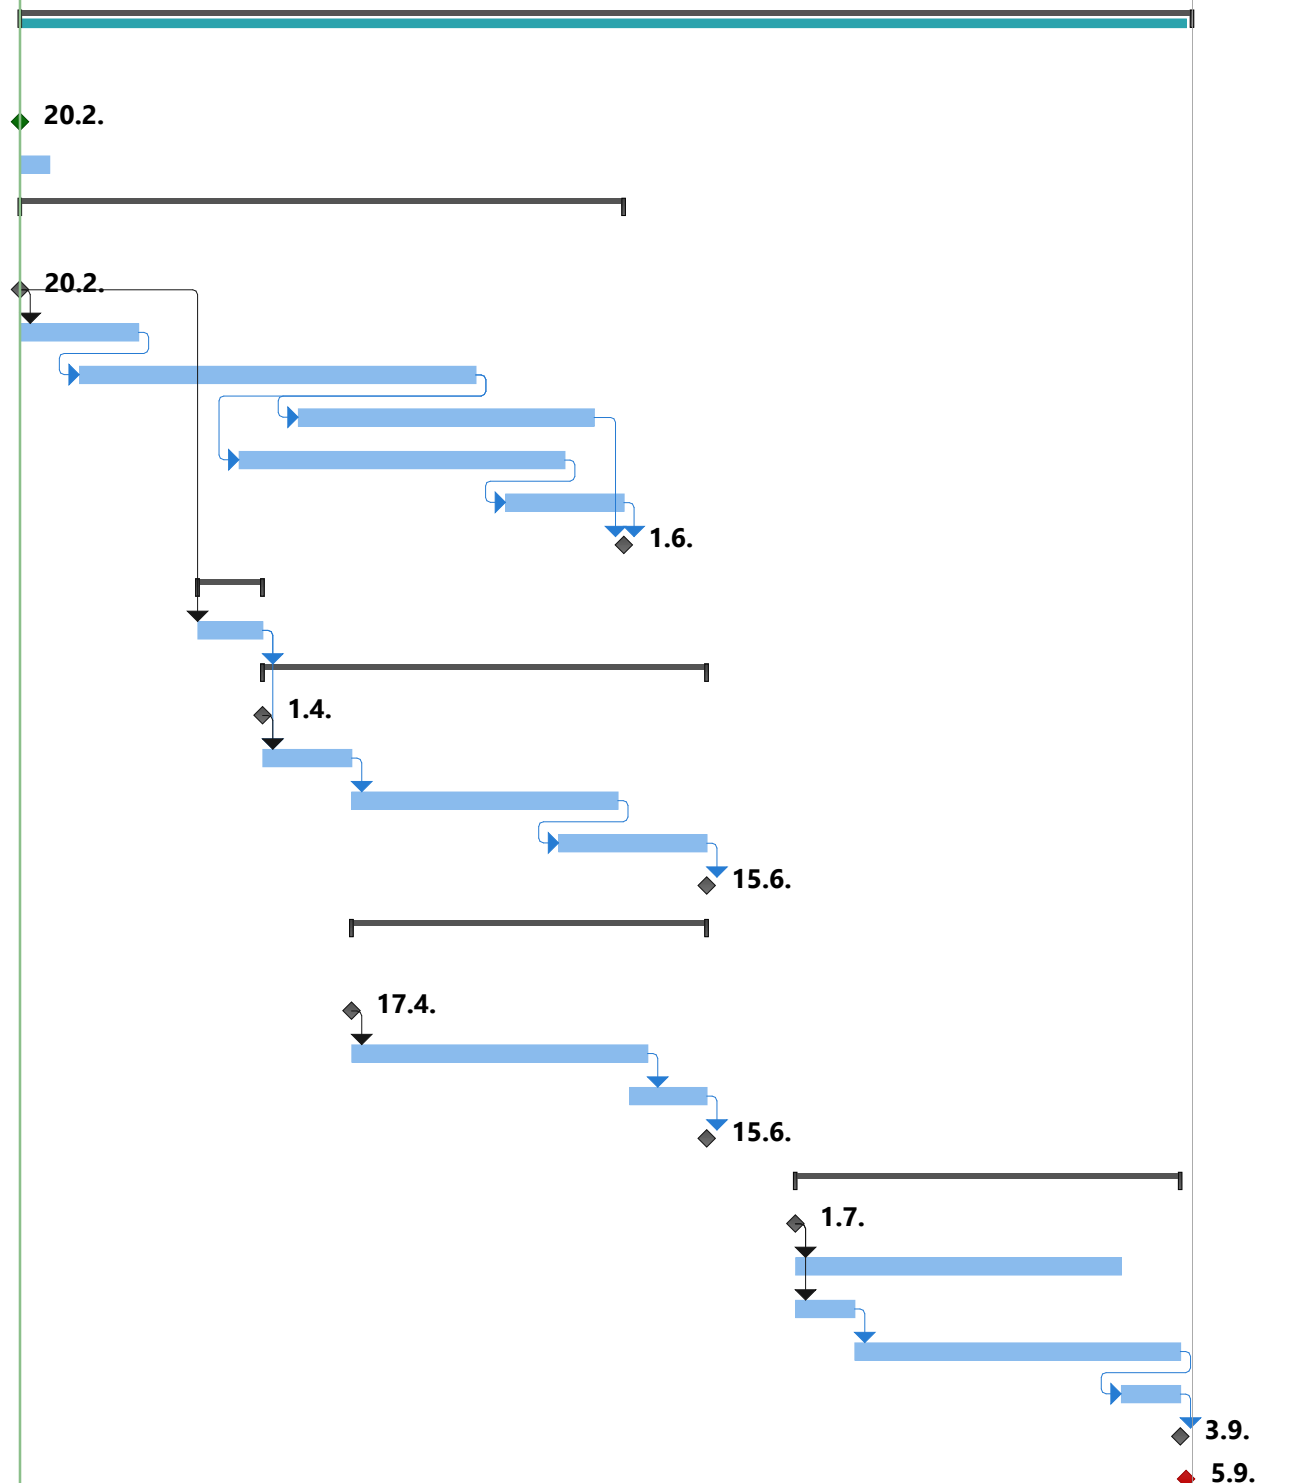

Projekt: Hmg Zvýšení kapacity C  
Datum: 20.2. 17

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			
