


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Poznámky	IV.	2021	I.	II.	III.	IV.
1		Rekonstrukce lávky přes Městský ostrov o mostu v Ostrovní ulici v Písku	121 dny?	08.02. 21	08.06. 21								
2		předání staveniště	0 dny	08.02. 21	08.02. 21								
3		zařízení staveniště	1 den	08.02. 21	08.02. 21	2							
4		sanace	118 dny?	09.02. 21	06.06. 21								
5		Most ev. č. PI-013 v ulici Ostrovní	118 dny?	09.02. 21	06.06. 21								
6		montáž provizorní lávky pro pěší	21 dny	09.02. 21	01.03. 21	3							
7		přepojení sítě Eon	1 den?	02.03. 21	02.03. 21	6							
8		odkrytí vrstev na nosné KCI	7 dny	03.03. 21	09.03. 21	7							
9		příprava povrchů	7 dny	10.03. 21	16.03. 21	8							
10		hrubá sanace	30 dny	17.03. 21	15.04. 21	9							
11		injektáže	21 dny	01.04. 21	21.04. 21	10FS-15 dny							
12		izolace	7 dny	01.04. 21	07.04. 21	11SS							
13		jemná sanace	30 dny	15.04. 21	14.05. 21	11FS-7 dny							
14		nátěry	7 dny	15.05. 21	21.05. 21	13							
15		vrstvy na nosné konstrukci	30 dny	08.05. 21	06.06. 21	13FS-7 dny							
16		Eon - pokládka kabelů do chodníku	2 dny	22.05. 21	23.05. 21	15SS+14 dny							
17		dlažba	30 dny	08.05. 21	06.06. 21	15SS							
18		dmtž lávky provizorní lávky	14 dny	23.05. 21	05.06. 21	17FS-15 dny							
19		Lávka ev. č. PI-010 a PI-011	91 dny	02.03. 21	31.05. 21								
20		lešení - opěry + pilíře	14 dny	02.03. 21	15.03. 21	6							
21		příprava povrchů	21 dny	09.03. 21	29.03. 21	20FS-7 dny							
22		hrubá sanace	45 dny	23.03. 21	06.05. 21	21FS-7 dny							
23		injektáže	25 dny	16.04. 21	10.05. 21	22FS-21 dny							
24		jemná sanace	18 dny	04.05. 21	21.05. 21	23FS-7 dny							
25		nátěry	10 dny	15.05. 21	24.05. 21	24FS-7 dny							
26		dokončovací práce	7 dny	25.05. 21	31.05. 21	25							
27		Ocelová konstrukce	120 dny	09.02. 21	08.06. 21								
28		demontáž zábradlí	7 dny	09.02. 21	15.02. 21	3							
29		montáž pomocných kolejnic Lávka 1	7 dny	09.02. 21	15.02. 21	3							
30		montáž podpěry - ostrov lávka 1 - pro výměnu polorámu	1 den	16.02. 21	16.02. 21	29							
31		výměna polorámu - lávka 1	6 dny	17.02. 21	22.02. 21	30							
32		demontáž mostovky a podélníků - lávka 1	6 dny	23.02. 21	28.02. 21	31							
33		montáž podpěry na břehu - lávka 1	3 dny	26.02. 21	28.02. 21	32FS-3 dny							
34		výměna polorámu - lávka 1	5 dny	01.03. 21	05.03. 21	33							
35		tryskání + nátěr - lávka 1	45 dny	09.03. 21	22.04. 21	34FS+3 dny							
36		montáž zábradlí - lávka 1+ rampa na ostrov	3 dny	03.05. 21	05.05. 21	35FS+10 dny							
37		montáž pomocných kolejnic Lávka 2	7 dny	09.02. 21	15.02. 21	3							
38		montáž podpěry - ostrov lávka 2 - pro výměnu polorámu	1 den	16.02. 21	16.02. 21	29							
39		výměna polorámu - lávka 2	6 dny	17.02. 21	22.02. 21	30							
40		demontáž mostovky a podélníků - lávka 2	6 dny	23.02. 21	28.02. 21	31							
41		montáž podpěry na břehu - lávka 2	3 dny	26.02. 21	28.02. 21	32FS-3 dny							
42		výměna polorámu - lávka 2	5 dny	01.03. 21	05.03. 21	33							
43		tryskání + nátěr - lávka 2	45 dny	09.03. 21	22.04. 21	34FS+3 dny							
44		montáž zábradlí - lávka 2	1 den	03.05. 21	03.05. 21	35FS+10 dny							
45		pokládka inženýrských sítí	7 dny	04.05. 21	10.05. 21	44							
46		mostovka	10 dny	11.05. 21	20.05. 21	45							
47		dokončovací práce	34 dny	04.05. 21	06.06. 21	44							
48		úklid staveniště	2 dny	07.06. 21	08.06. 21	47							
49		předání díla	0 dny	08.06. 21	08.06. 21	48							

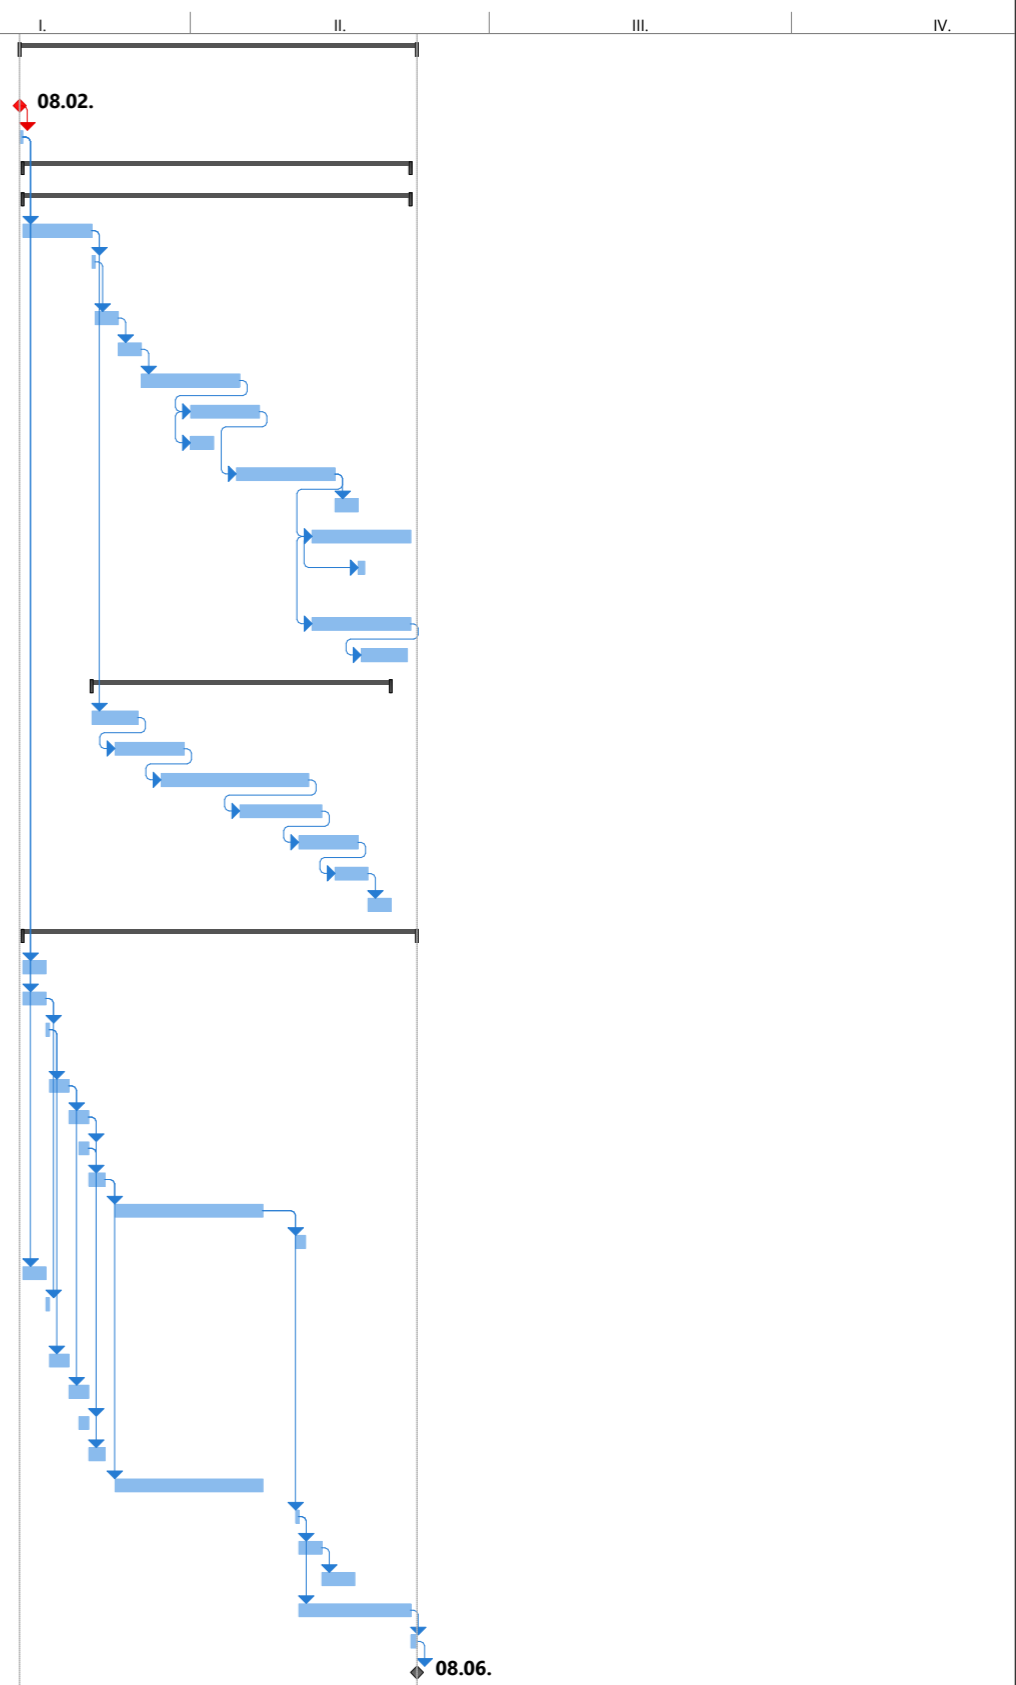

Projekt: Rekonstrukce lávky pře Datum: 11.01. 21	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Pouze s datem dokončení		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Průběh	
	Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník					
