



**PŘÍLOHA DODATKU SMLOUVY O DÍLO STAVBY
"ROZŠÍŘENÍ ČOV+ČVK JIH-LETIŠTĚ PRAHA/RUŽYŇE, DOKONČENÍ DÍLA"
HARMONOGRAM STAVBY**

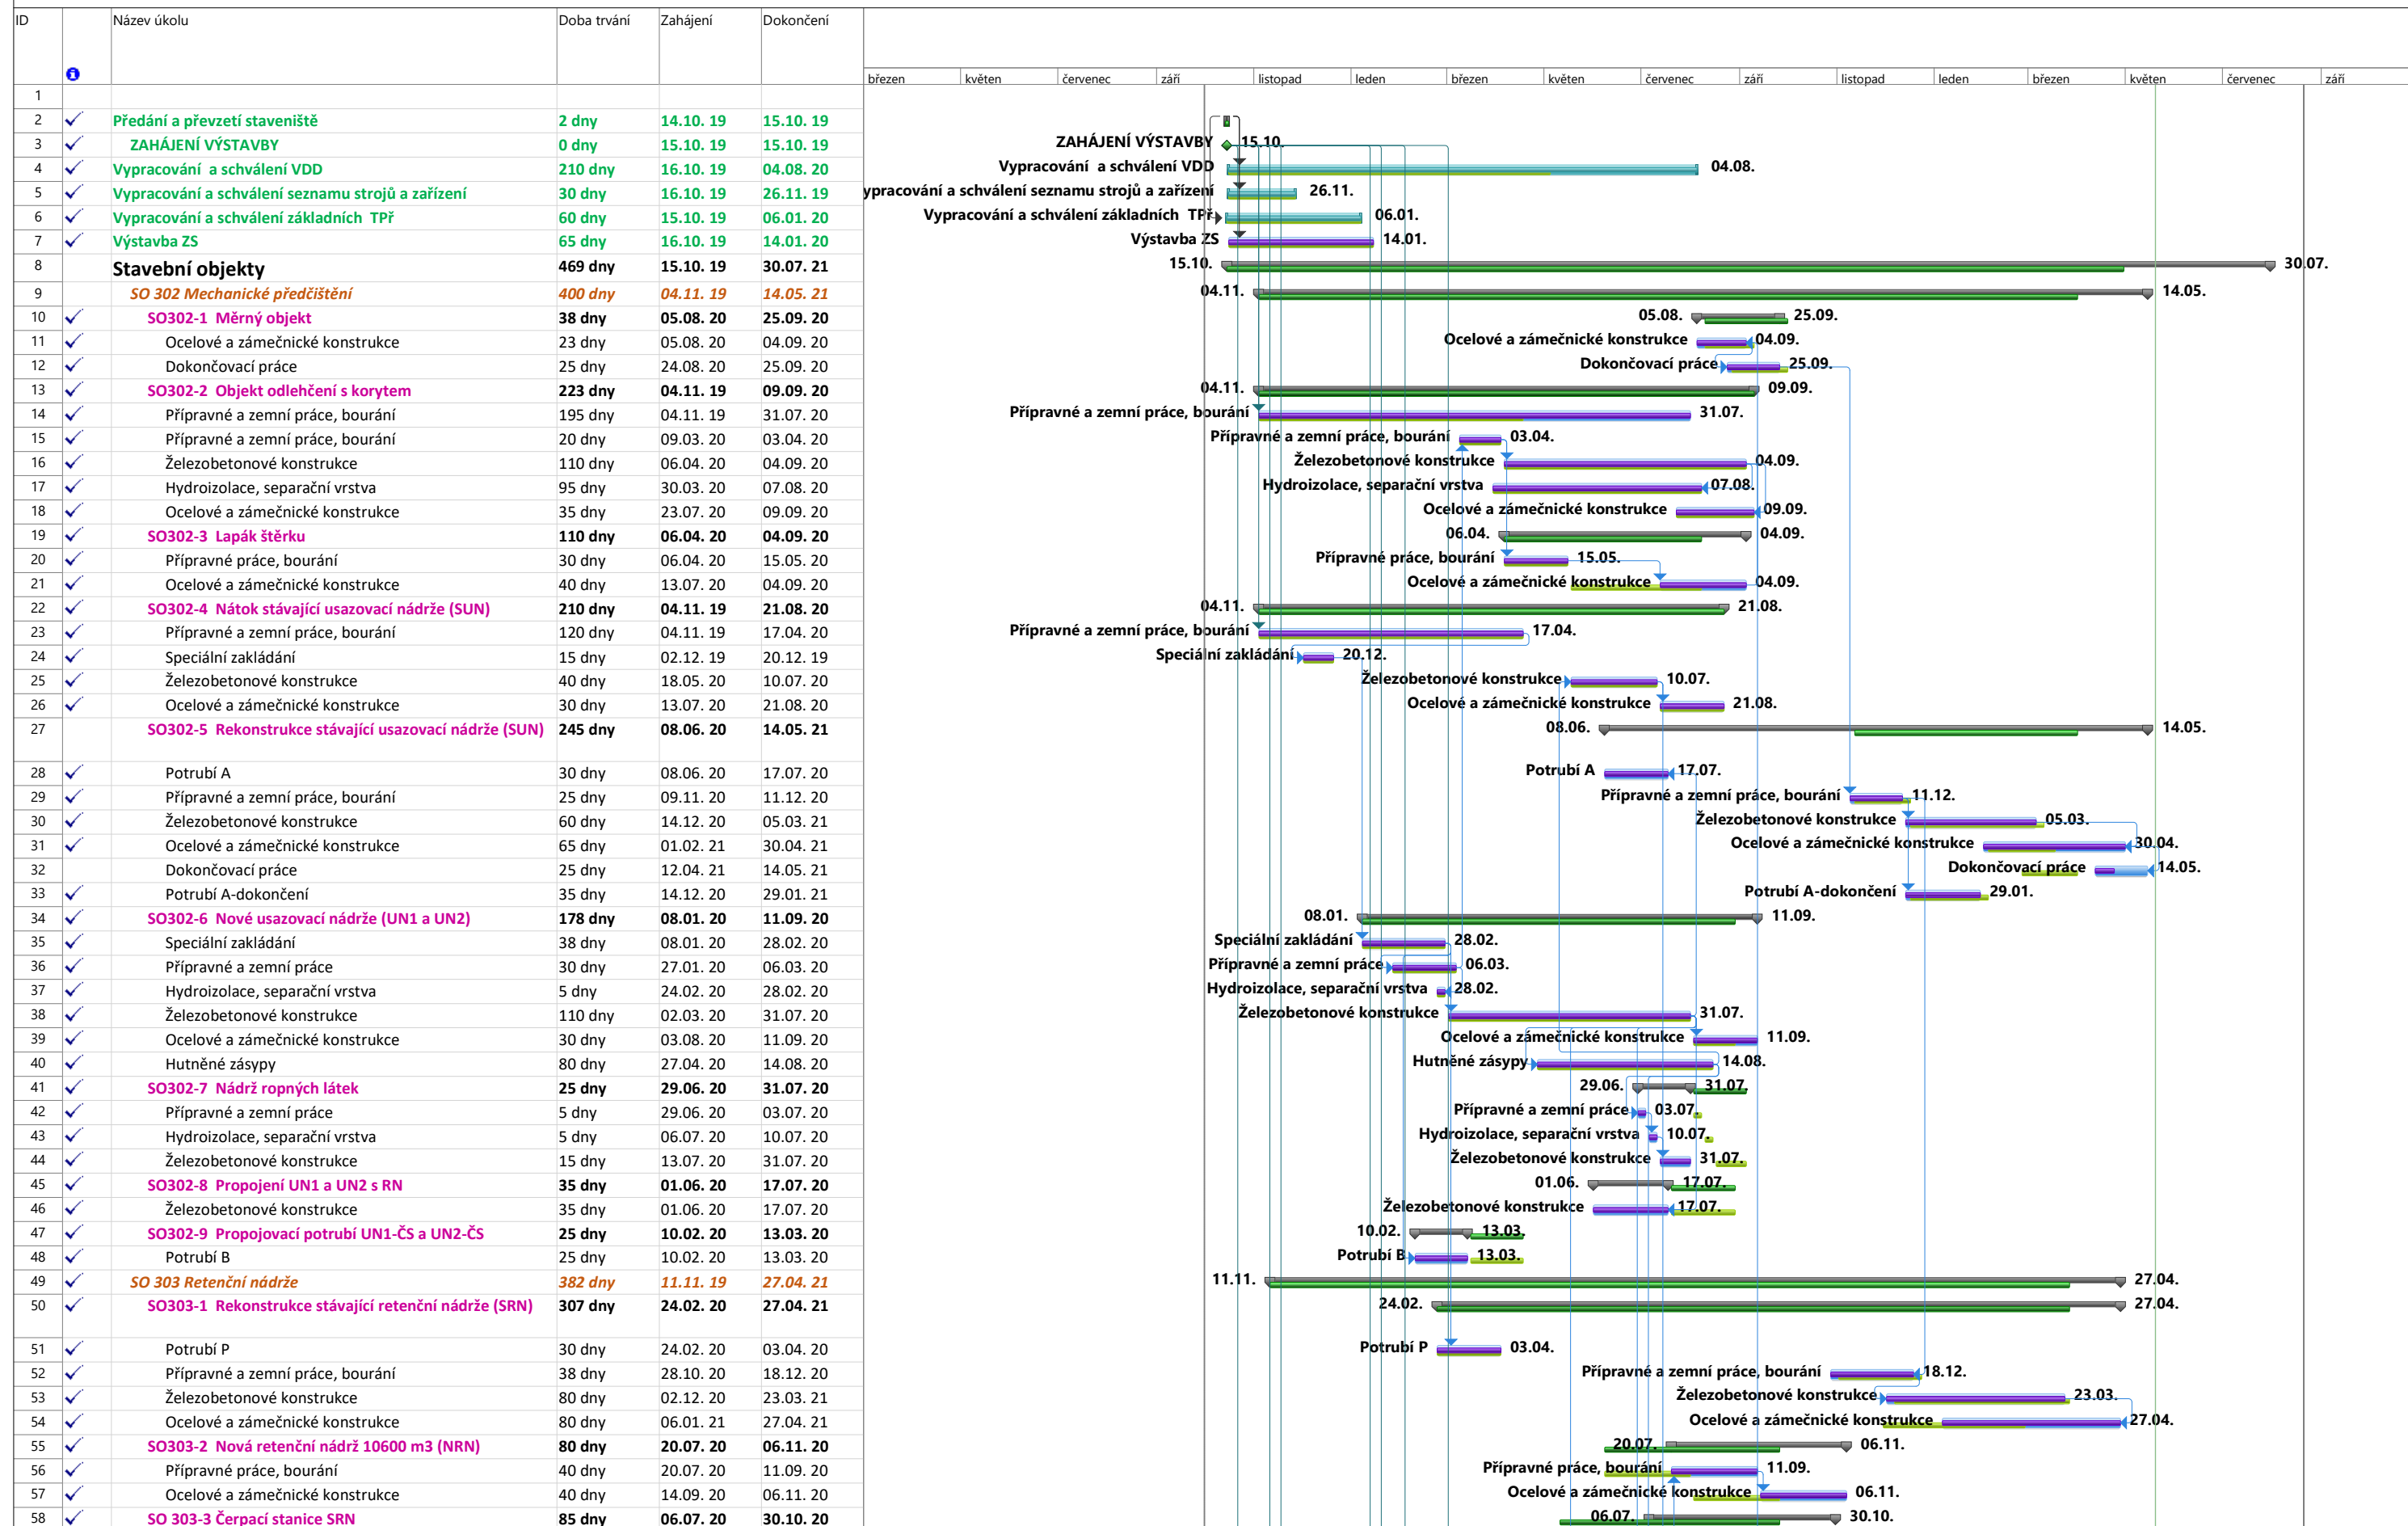

**PŘÍLOHA DODATKU SMLOUVY O DÍLO STAVBY
"ROZŠÍŘENÍ ČOV+ČVK JIH-LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ, DOKONČENÍ DÍLA"
HARMONOGRAM STAVBY**

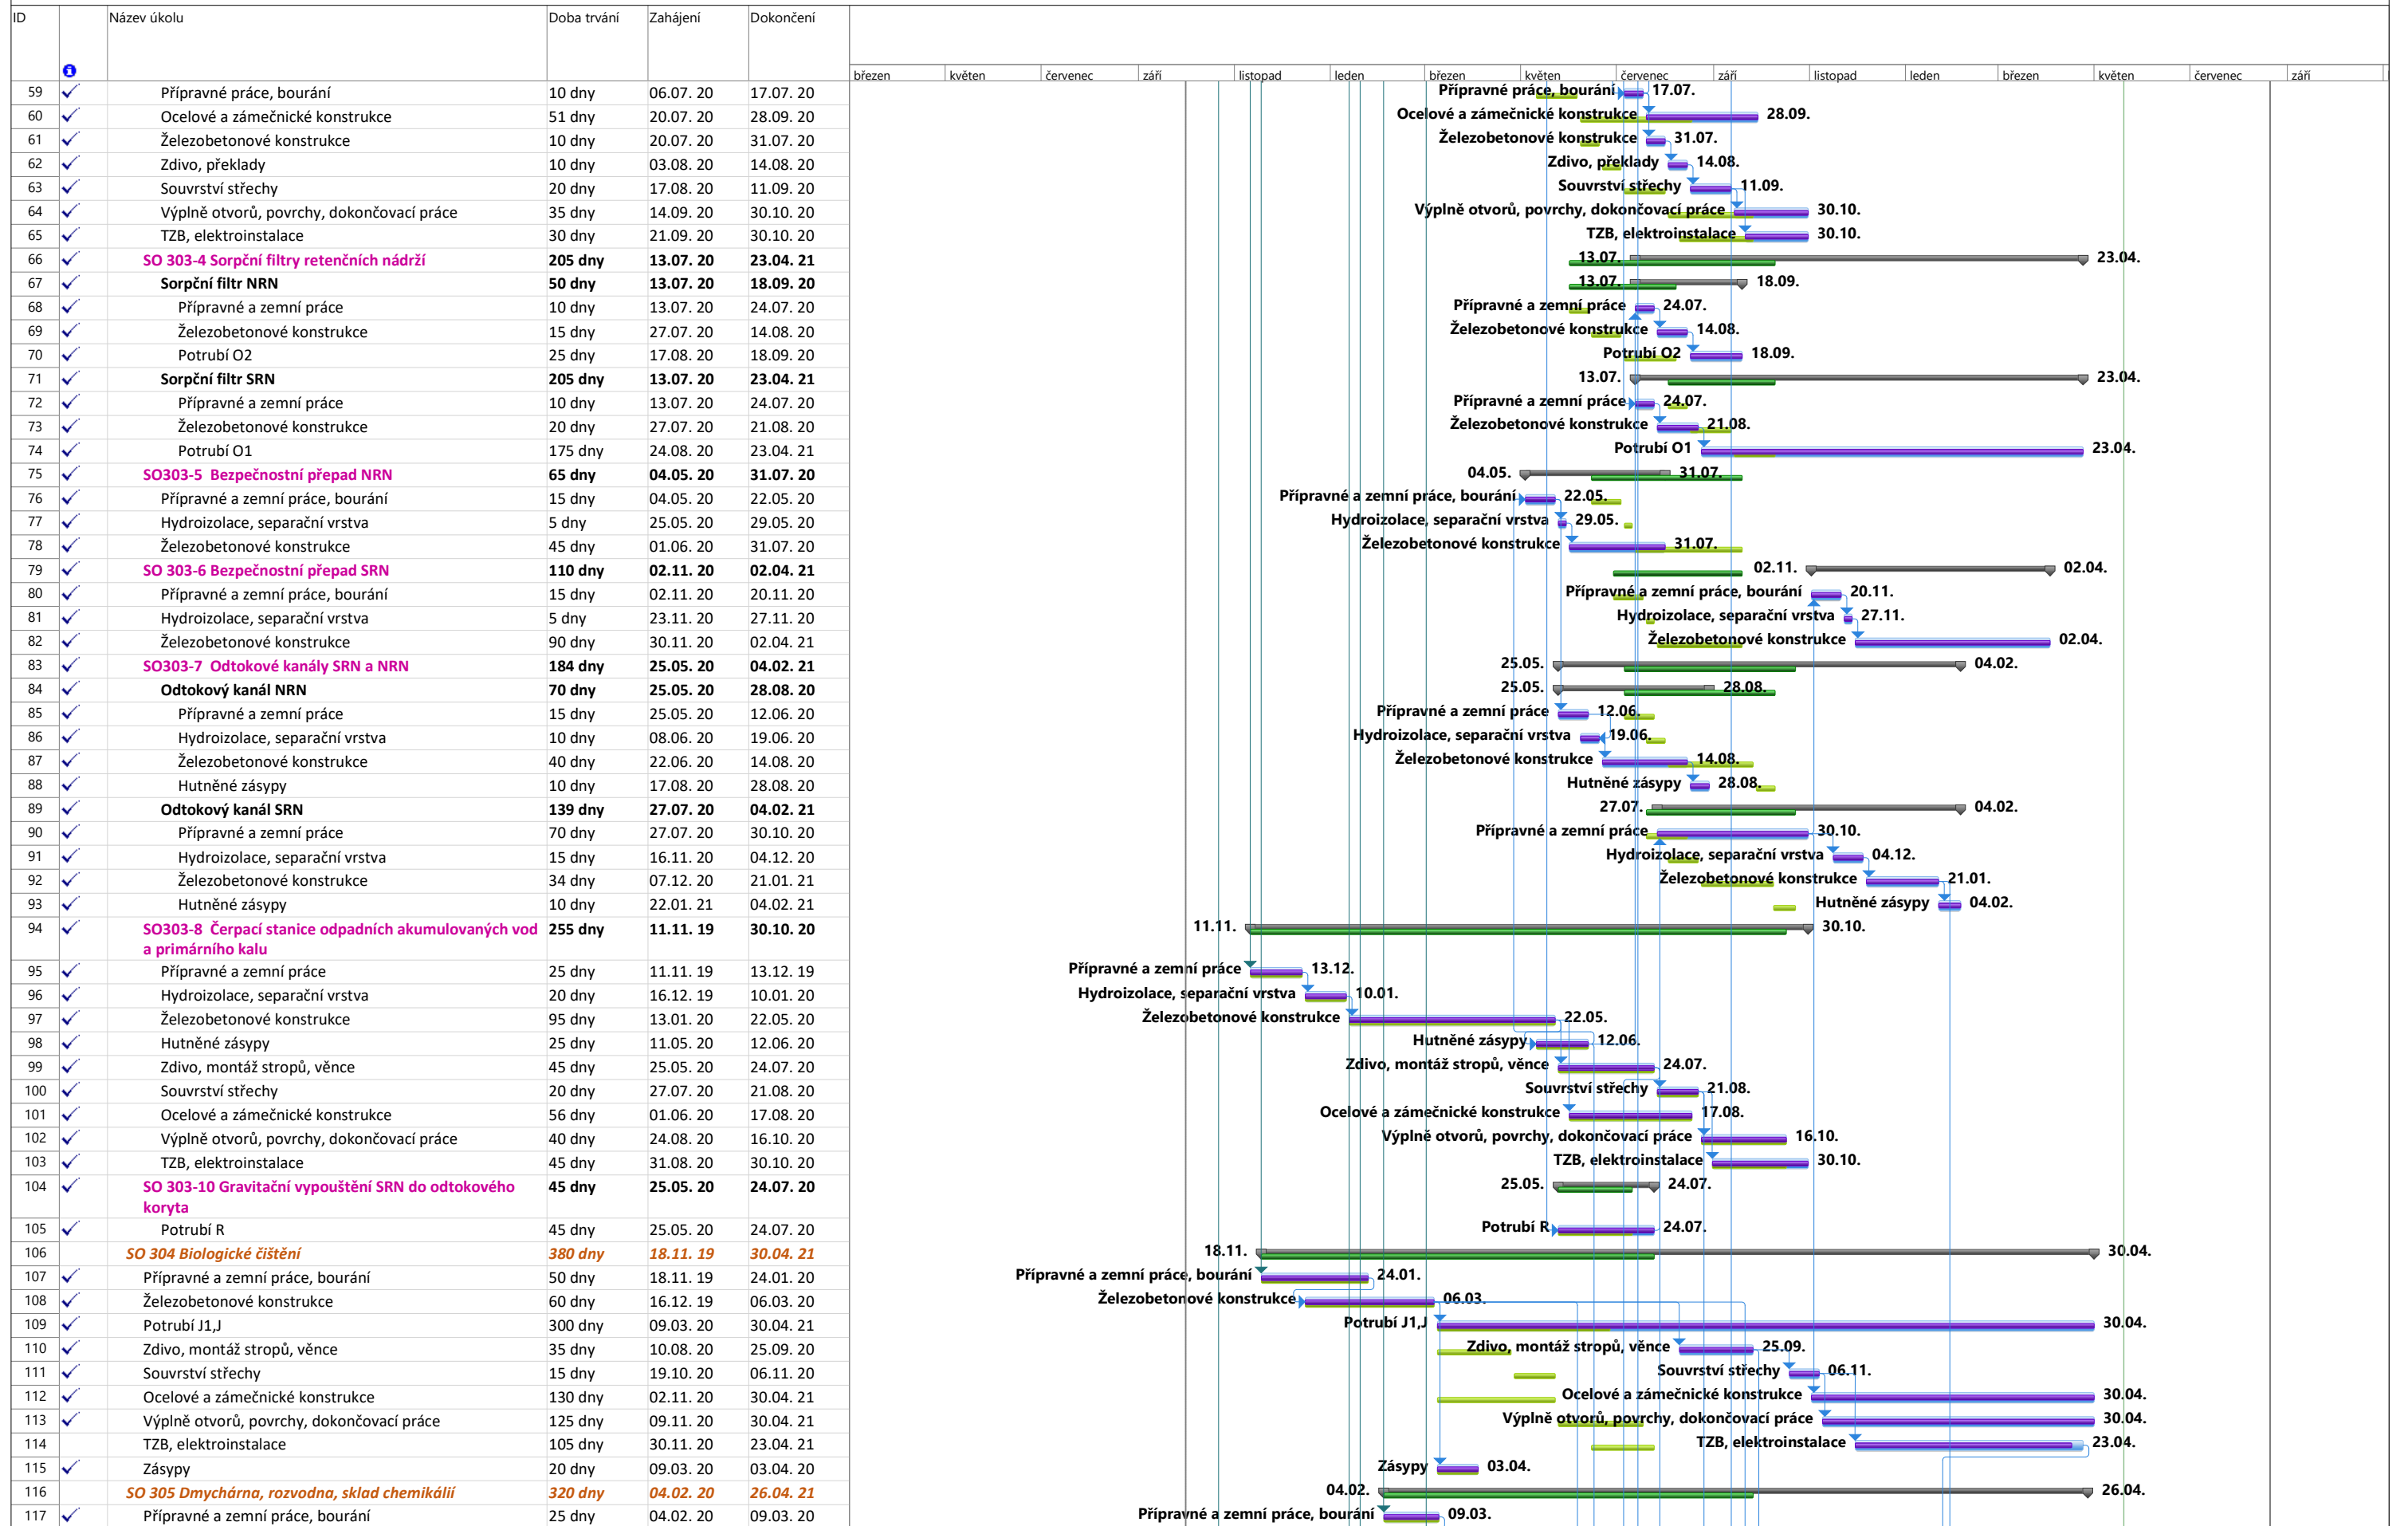


**PŘÍLOHA DODATKU SMLOUVY O DÍLO STAVBY
"ROZŠÍŘENÍ ČOV+ČKV JIH-LETIŠTĚ PRAHA/RUŽYŇE, DOKONČENÍ DÍLA"
HARMONOGRAM STAVBY**

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	HARMONOGRAM STAVBY											
					březen	květen	červenec	září	listopad	leden	březen	květen	červenec	září	listopad	leden
118	✓ Železobetonové konstrukce	210 dny	18.02. 20	07.12. 20												
119	✓ Hydroizolace, separační vrstva	185 dny	17.03. 20	30.11. 20												
120	✓ Speciální zakládání	25 dny	21.04. 20	25.05. 20												
121	✓ Zdivo, montáž stropů, věnce	50 dny	15.09. 20	23.11. 20												
122	✓ Souvrství střechy	30 dny	24.11. 20	04.01. 21												
123	Ocelové a zámečnické konstrukce	155 dny	22.09. 20	26.04. 21												
124	✓ Montáž potrubí v TKSS	95 dny	15.12. 20	26.04. 21												
125	✓ Výplně otvorů, povrchy, dokončovací práce	125 dny	03.11. 20	26.04. 21												
126	TZB, elektroinstalace	95 dny	15.12. 20	26.04. 21												
127	✓ SO 306 Nádrž na rozmrazovací látky	335 dny	20.01. 20	30.04. 21												
128	✓ Přípravné a zemní práce, bourání, zajištění stávající kanalizace	50 dny	20.01. 20	27.03. 20												
129	✓ Železobetonové konstrukce	30 dny	19.10. 20	27.11. 20												
130	✓ Ocelové a zámečnické konstrukce	120 dny	16.11. 20	30.04. 21												
131	✓ SO 307 Přeložky dešťová kanalizace	221 dny	23.12. 19	26.10. 20												
132	✓ SO 307-1 Nepostavená potrubí gravitačních kanalizací	125 dny	07.04. 20	28.09. 20												
133	✓ Výkopy, zajištění, podsypy	45 dny	07.04. 20	06.07. 20												
134	✓ Rozdělovací a lomové šachty	45 dny	21.04. 20	20.07. 20												
135	✓ Potrubí O včetně chrániček a napojení vpustí	30 dny	14.07. 20	24.08. 20												
136	✓ Zkoušky, obsypy, zásypy	30 dny	18.08. 20	28.09. 20												
137	✓ SO 307-2 Spojná a odlehčovací šachta Š3	155 dny	25.02. 20	28.09. 20												
138	✓ Přípravné a zemní práce, bourání	25 dny	25.02. 20	30.03. 20												
139	✓ Zdivo, dlažba a obklad šachty	60 dny	31.03. 20	22.06. 20												
140	✓ Ocelové a zámečnické konstrukce	30 dny	21.07. 20	31.08. 20												
141	✓ Dokončovací práce	20 dny	01.09. 20	28.09. 20												
142	✓ SO 307-3 Vývar	160 dny	25.02. 20	05.10. 20												
143	✓ Přípravné a zemní práce, bourání	120 dny	03.03. 20	17.08. 20												
144	✓ Železobetonové konstrukce	20 dny	18.08. 20	14.09. 20												
145	✓ Zdivo, dlažba a obklad	90 dny	24.03. 20	27.07. 20												
146	✓ Ocelové a zámečnické konstrukce	30 dny	28.07. 20	07.09. 20												
147	✓ Vypouštěcí potrubí včetně výústního objektu	140 dny	25.02. 20	07.09. 20												
148	✓ Dokončovací práce	20 dny	08.09. 20	05.10. 20												
149	✓ SO 307-4 Opravy rozestavěných objektů	130 dny	31.03. 20	28.09. 20												
150	✓ Přípravné a zemní práce, bourání	30 dny	31.03. 20	11.05. 20												
151	✓ Stoka G, oprava šachet Š4 – Š14, obklad čedičem	75 dny	12.05. 20	24.08. 20												
152	✓ Dokončovací práce	25 dny	25.08. 20	28.09. 20												
153	✓ SO 307-5 Přeložka stoky A-jih	145 dny	07.04. 20	26.10. 20												
154	✓ Výkopy, zajištění, podsypy	25 dny	07.04. 20	11.05. 20												
155	✓ Železobetonové konstrukce	20 dny	11.08. 20	07.09. 20												
156	✓ Potrubí A JIH včetně obetonování	30 dny	21.04. 20	01.06. 20												
157	✓ Ocelové a zámečnické konstrukce	20 dny	08.09. 20	05.10. 20												
158	✓ Zkoušky, obsypy, zásypy	20 dny	02.06. 20	29.06. 20												
159	✓ Dokončovací práce	15 dny	06.10. 20	26.10. 20												
160	✓ SO 307-6 Oprava stoky ČS PHM Shell	80 dny	28.04. 20	17.08. 20												
161	✓ Výkopy, zajištění, podsypy	60 dny	28.04. 20	20.07. 20												
162	✓ Potrubí SHELL včetně opravy šachet a napojení vpustí	60 dny	12.05. 20	03.08. 20												
163	✓ Zkoušky, obsypy, zásypy	60 dny	26.05. 20	17.08. 20												
164	✓ SO 307-7 Oprava obtoku ČKV (Š3 – VÝVAR)	114 dny	10.03. 20	14.08. 20												
165	✓ Výkopy, zajištění (včetně zajištění potrubí G) , podsypy	54 dny	10.03. 20	22.05. 20												
166	✓ Potrubí OBTOK ČKV včetně obetonování	70 dny	06.04. 20	10.07. 20												
167	✓ Zkoušky, obsypy, zásypy	75 dny	20.04. 20	31.07. 20												
168	✓ Železobetonové konstrukce	30 dny	06.07. 20	14.08. 20												
169	✓ SO 307-8 Oprava úseku Š11 - Š14	115 dny	23.12. 19	29.05. 20												
170	✓ Výkopy, zajištění, podsypy	40 dny	23.12. 19	14.02. 20												
171	✓ Potrubí PROVIZORNÍHO OBTOKU včetně úpravy šachet	25 dny	17.02. 20	20.03. 20												
172	✓ Potrubí G včetně obetonování	20 dny	23.03. 20	17.04. 20												

**PŘÍLOHA DODATKU SMLOUVY O DÍLO STAVBY
"ROZŠÍŘENÍ ČOV+ČKV JIH-LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ, DOKONČENÍ DÍLA"
HARMONOGRAM STAVBY**

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	HARMONOGRAM STAVBY																			
					březen	květen	červenec	září	listopad	leden	březen	květen	červenec	září	listopad	leden	březen	květen	červenec	září				
173	✓ Odstranění potrubí PROVIZORNÍHO OBTOKU	15 dny	20.04. 20	08.05. 20																				
174	✓ Zkoušky, obsypy, zásypy	15 dny	11.05. 20	29.05. 20																				
175	✓ SO 307-9 Zabetonování potrubí původních nátoků	85 dny	02.06. 20	28.09. 20																				
176	✓ Přípravné a zemní práce, bourání	25 dny	02.06. 20	06.07. 20																				
177	✓ Zabetonování potrubí	40 dny	07.07. 20	31.08. 20																				
178	✓ Obsypy, zásypy	20 dny	01.09. 20	28.09. 20																				
179	SO 308 Přeložky IS	290 dny	02.03. 20	09.04. 21																				
180	✓ Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení	250 dny	02.03. 20	12.02. 21																				
181	✓ Pokládka kabelů a podsypy	250 dny	30.03. 20	12.03. 21																				
182	✓ Zkoušky, zásypy	250 dny	27.04. 20	09.04. 21																				
183	✓ SO 309 Rozvody pitné vody, požární vodovod	50 dny	18.08. 20	26.10. 20																				
184	✓ Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení	30 dny	18.08. 20	28.09. 20																				
185	✓ Pokládka potrubí a podsypy	30 dny	01.09. 20	12.10. 20																				
186	✓ Zkoušky, zásypy	30 dny	15.09. 20	26.10. 20																				
187	SO 310 Sílové rozvody NN	188 dny	07.09. 20	26.05. 21																				
188	✓ Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení	80 dny	07.09. 20	06.01. 21																				
189	✓ Pokládka kabelů a podsypy	180 dny	14.09. 20	21.05. 21																				
190	✓ Trasa TS 16-Rozvodna SO305 v terénu	70 dny	24.12. 20	31.03. 21																				
191	✓ Trasa Rozvodna SO305-Armaturní komora SO304-2 v TKSS	20 dny	04.03. 21	31.03. 21																				
192	✓ Trasa Rozvodna SO305-Stávající rozvodna SRTP (objekt 174/20) v TKSS	30 dny	01.04. 21	12.05. 21																				
193	✓ Trasa Armaturní komora SO304-2 - ČS1 SO303-3 v TKSS	180 dny	14.09. 20	21.05. 21																				
194	✓ Trasa Armaturní komora SO304-2 - ČS2 SO303-8 v TKSS	180 dny	14.09. 20	21.05. 21																				
195	✓ Trasa ČS2 SO303-8 - Spojná a odlehčovací šachta Š3 v terénu	60 dny	14.09. 20	04.12. 20																				
196	✓ Zkoušky, zásypy	148 dny	02.11. 20	26.05. 21																				
197	SO 311 Strukturovaná kabeláž	85 dny	01.02. 21	28.05. 21																				
198	✓ Rozvody	70 dny	01.02. 21	07.05. 21																				
199	✓ Trasa Administrativní budova (objekt 174/14) -Rozvodna slaboproudu SO305 v komunikaci	70 dny	01.02. 21	07.05. 21																				
200	✓ Trasa Rozvodna slaboproudu SO305 - Stávající rozvodna SRTP (objekt 174/20) v TKSS	40 dny	15.03. 21	07.05. 21																				
201	✓ Trasa Rozvodna slaboproudu SO305 - ČS1 SO303-3 v TKSS	70 dny	01.02. 21	07.05. 21																				
202	✓ Trasa Rozvodna slaboproudu SO305 - ČS2 SO303-8 v TKSS	70 dny	01.02. 21	07.05. 21																				
203	✓ Zařízení a koncové prvky	65 dny	22.02. 21	21.05. 21																				
204	✓ Oživení a zkoušky	20 dny	03.05. 21	28.05. 21																				
205	SO 312 SRTP	85 dny	01.02. 21	28.05. 21																				
206	✓ Rozvody	70 dny	01.02. 21	07.05. 21																				
207	✓ Trasa Rozvaděč DT17-Armaturní komora SO304-2 v TKSS	70 dny	01.02. 21	07.05. 21																				
208	✓ Trasa Armaturní komora SO304-2 - Severní část TKSS v TKSS	40 dny	15.03. 21	07.05. 21																				
209	✓ Trasa z ČS1 SO303-3 v TKSS	70 dny	01.02. 21	07.05. 21																				
210	✓ Trasa z ČS2 SO303-8 v TKSS	70 dny	01.02. 21	07.05. 21																				
211	✓ Zařízení a koncové prvky, vizualizace	35 dny	05.04. 21	21.05. 21																				
212	✓ Oživení a zkoušky	20 dny	03.05. 21	28.05. 21																				
213	SO 313 Venkovní osvětlení	105 dny	08.03. 21	30.07. 21																				
214	✓ Rozvody, demontáž stávajících stožárů	80 dny	08.03. 21	25.06. 21																				
215	✓ Montáž stožárů a ovládání	40 dny	17.05. 21	09.07. 21																				
216	✓ Zapojení a zkoušky	15 dny	12.07. 21	30.07. 21																				
217	SO 314 Obslužné areálové plochy	215 dny	05.10. 20	30.07. 21																				
218	✓ Přípravné a zemní práce, bourání, vytýčení	20 dny	05.10. 20	30.10. 20																				
219	✓ Zárubní zdi 1 a 4	35 dny	26.10. 20	11.12. 20																				
220	✓ Podkladní vrstvy, drenáže	160 dny	05.10. 20	14.05. 21																				
221	✓ Obrubníky, vpusti, žlaby	155 dny	02.11. 20	04.06. 21																				
222	✓ Konečné vrstvy	35 dny	31.05. 21	16.07. 21																				
223	✓ Zárubní zeď u dosazovacích nádrží	35 dny	05.04. 21	21.05. 21																				

**PŘÍLOHA DODATKU SMLOUVY O DÍLO STAVBY
"ROZŠÍŘENÍ ČOV+ČKV JIH-LETIŠTĚ PRAHA/RUŽYŇE, DOKONČENÍ DÍLA"
HARMONOGRAM STAVBY**

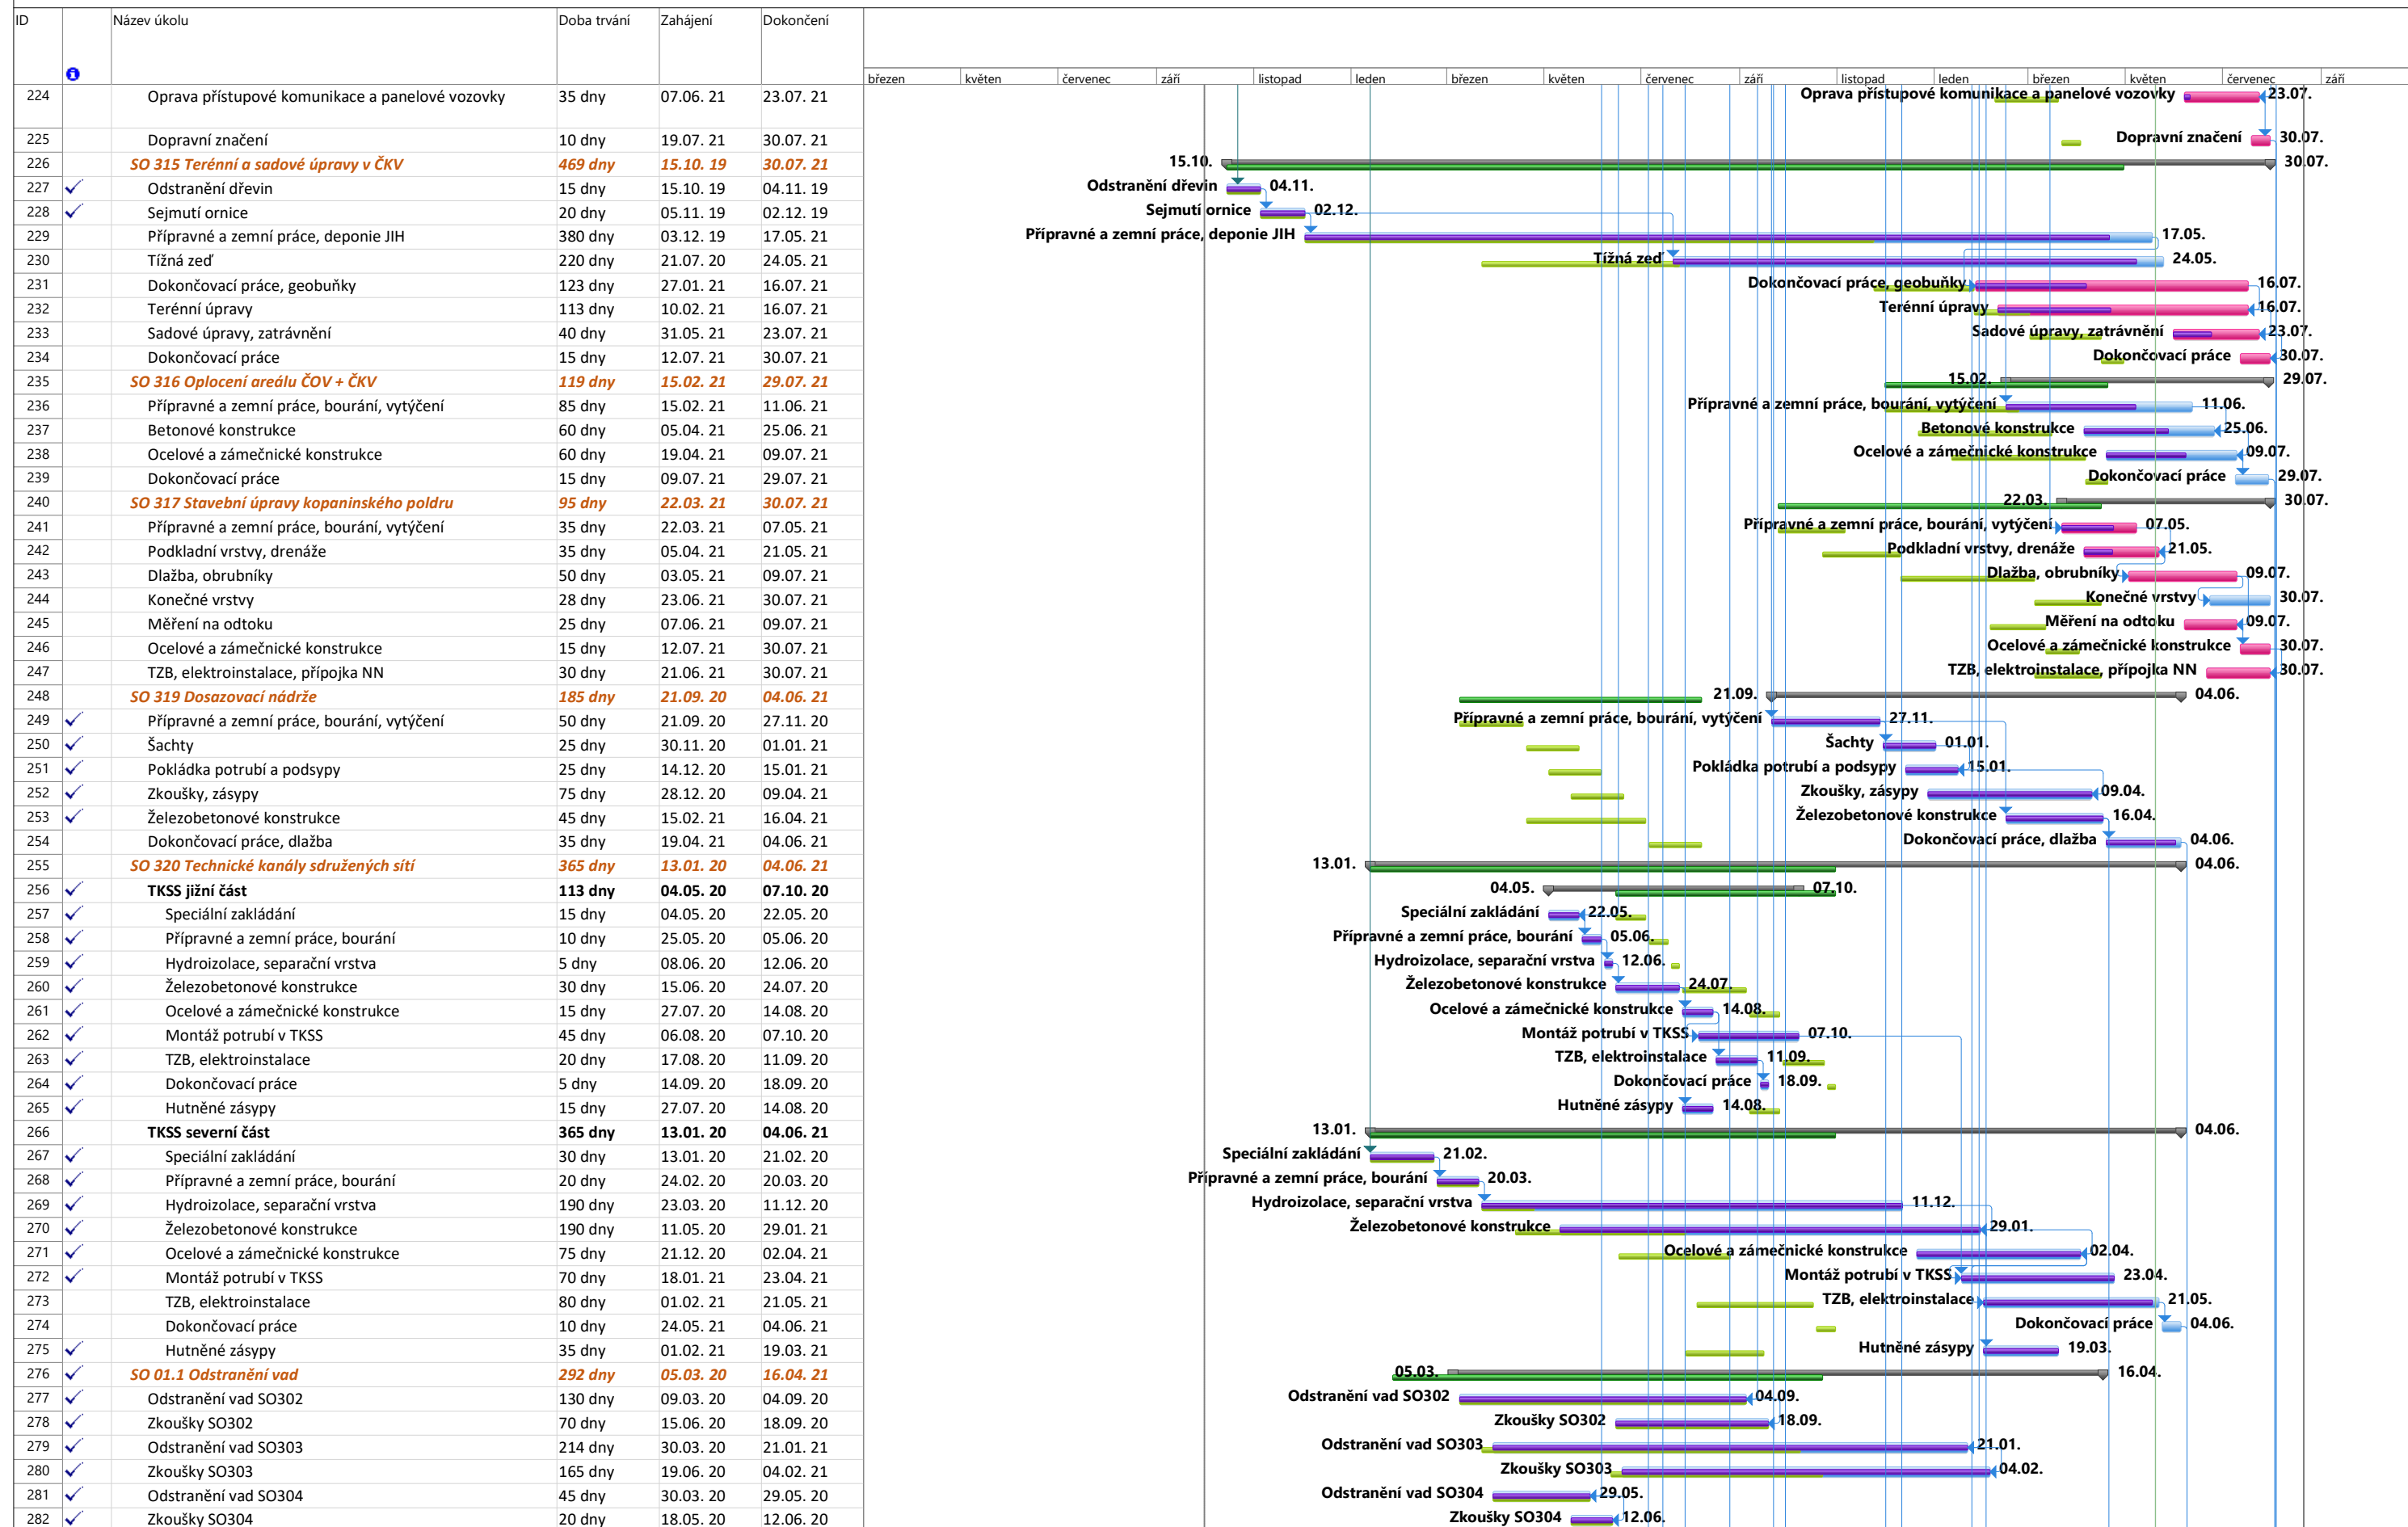

**PŘÍLOHA DODATKU SMLOUVY O DÍLO STAVBY
"ROZŠÍŘENÍ ČOV+ČKV JIH-LETIŠTĚ PRAHA/RUŽYŇĚ, DOKONČENÍ DÍLA"
HARMONOGRAM STAVBY**

