


ID	Název úkolu	Doba trvání	Začátek	Dokončení	Předchozí	Následní	Text
1	VŠCHT	485 dny	19.10.20	15.02.22			
2	Přidání a převzetí stavebního	1 den	19.10.20	19.10.20		3	
3	Vybudování objektů zařízení stavební (funkční, oplocení, přípojky a osvětlení)	14 dny	20.10.20	02.11.20	2	455:5F5-7 dny	
4	Projektování stávajícího stavu objektu a stávajících Ing. sítí	14 dny	20.10.20	02.11.20	355		
5	Přípravné práce	10 dny	27.10.20	05.11.20	3F5-7 dny	6F5-5 dny	
6	Bourací práce - nosné	50 dny	01.11.20	20.12.20	5F5-5 dny		
7	Stavební statické průzkumy	37 dny	26.10.20	01.12.20		8:10F5-1 den	
8	Revizní PD na základě Stavební statického průzkumu - činnost fotovoltické PS	15 dny	02.12.20	16.12.20	7		
9	ZL02a - Skladba podlah - odstavení nábytku	37 dny	08.12.20	13.01.21	105S+7 dny	16:225S+2 d	
10	ZL02b - Provedení statického podchyzování kol	58 dny	01.12.20	27.01.21	7F5-1 den	11F5-14 dny	
11	Bourací práce - nosné + ZL 5	32 dny	14.01.21	14.02.21	10F5-14 dny	125S:13F5-3C	
12	Zděné příčky + ZL 06	45 dny	14.01.21	27.02.21	115S	44F5-18 dny	
13	SDK příčky	100 dny	21.01.21	30.04.21	11F5-30 dny	165S+26 dny	
14	Projektový pokyn PF21 - ZL31 - PRK krov	92 dny	30.06.21	29.09.21	43	30:31:15	
15	Provedení SDK a zdění - krov	30 dny	30.09.21	29.10.21	14	39F5-20 dny	
16	ZL02a Provedení hrubých podlah - doplnění EPS	10 dny	16.02.21	25.02.21	135S+26 dny; 11:185S+7 dny		
17	Projektový pokyn PF25 - ZL 31 PRK Řídla EPS nad podhled	90 dny	30.06.21	27.09.21	43	48:46:30:31:	
18	ZL č. 08 - příprava pro AV techniku v podláhách	7 dny	23.02.21	01.03.21	165S+7 dny	19	
19	Provedení hrubých podlah	60 dny	02.03.21	30.04.21	18	48F5+57 dny	
20	Projektový pokyn pro ZL č. 18 - terasa	218 dny	07.12.20	12.07.21		21F5+25 dny	
21	Provedení hrubých podlah vč. Podkladů - ZL č. 18	23 dny	07.08.21	29.08.21	20F5+25 dny	48	
22	montáž rozvody ZTI	150 dny	10.12.20	08.05.21	95S+2 dny	44F5-59 dny	
23	Doplnění a koordinace nájemci - ZTI (bufet, klokniov ústav)	150 dny	04.05.21	30.09.21	35FF		
24	ZL č.15 - doplnění rozvodů ZTI	30 dny	09.05.21	07.06.21		44F5-80 dny	
25	montáž zařízení pro silnoproud - rozvody SIL	200 dny	10.12.20	27.06.21	225S	44F5-70 dny	
26	Montáž hrubých rozvodů z rozvodny NN přes stávající užívatele	35 dny	28.06.21	01.08.21	25	27	
27	Montáž a sprovazování rozvodny NN - stávající část 40 dny	02.08.21	10.09.21	26			
28	montáž zařízení pro slaboproud - rozvody SLP	200 dny	10.12.20	27.06.21	255S	335S:44F5-7C	
29	Montáž čidel EPS	30 dny	28.09.21	27.10.21	17		
30	Montáž aktivních prvků do m.č. 1402a, 1402b (server, veštin)	40 dny	30.09.21	08.11.21	28:17:14		
31	Montáž aktivní prvky m.č. B3315 (technická místnost SLP)	38 dny	30.09.21	06.11.21	17:14		
32	Projektový pokyn pro ZL č. 17 - podhledy	187 dny	12.11.20	17.05.21		33FF-10 dny	
33	montáž zařízení pro ochlazování - rozvody chlazení 190 dny	10.12.20	17.06.21	285S:32FF-10 dny 345S:405S:44			
34	montáž zařízení pro vytápění - rozvody ÚT	150 dny	10.12.20	08.05.21	335S	385S:44F5-7C	
35	Doplnění a koordinace nájemci - ÚT (bufet, klokniov ústav)	150 dny	04.05.21	30.09.21	34F5-80 dny; 37FF	23FF:36FF	
36	Vykližení prostor v rámci 1PP a 1NP provedení rozvodů ÚT v rámci nájemce (Klokniov ústav)	150 dny	04.05.21	30.09.21	35FF		
37	montáž rozvodů potrubí ZPP - 1PP (bypass) - PP23 220 dny	23.02.21	30.09.21	345S	35FF		
38	montáž zařízení pro vadaotechniku - rozvody VZ 150 dny	10.12.20	08.05.21	345S	44F5-70 dny		
39	montáž zařízení pro VZTESI - krov	30 dny	10.10.21	08.11.21	15F5-20 dny	41F5-18 dny	
40	montáž zařízení pro měření a regulaci - rozvody M 195 dny	10.12.20	09.10.21	335S			
41	montáž zařízení MARI - rozváděč krov	20 dny	22.10.21	10.11.21	39F5-18 dny	56F5-1 den	
42	ZL č. 013 - regulace OT tělesa	60 dny	13.04.21	11.06.21		44F5-83 dny	
43	ZL č. 011 - výměna okenní soc. zařízení + 4.NP	30 dny	31.05.21	29.06.21		17:14	
44	Provedení omítek	173 dny	08.05.21	27.10.21	22F5-59 dny; 25F5:45F5-45 dny		
45	Provedení keramických obkladů	45 dny	13.09.21	27.10.21	44F5-45 dny; 195S:60		
46	Provedení akustických podhledů a dokončení SDK 44 dny	14.10.21	26.11.21	17:44F5-50 dny			
47	Samonivelační omítka ZL32	36 dny	25.09.21	30.10.21			
48	Provedení nášlapných vrstev podlah	110 dny	28.09.21	15.01.22	19F5+57 dny; 21:162F5-88 dny	dělitel doba realizace, nemá vliv na celkový termín	
49	Dodávka a montáž vnitřních dveří	86 dny	22.10.21	15.01.22		63FF-9 dny; 6	
50	Dodávka a montáž prosklená stěna	21 dny	27.12.21	16.01.22			
51	Zámečnické konstatce	45 dny	28.10.21	11.12.21			
52	Montáž výtahu V1 a V2	30 dny	18.10.21	16.11.21	44F5-10 dny		
53	Kancelářské klokniov ústav	34 dny	28.10.21	30.11.21			
54	Provedení maleb	30 dny	15.10.21	13.11.21	44F5-13 dny; 13F5:55F5-7 dny		
55	Kompletace profesí (světla, baterie, otopná tělesa, vybavení hygienických zařízení...)	65 dny	22.11.21	25.01.22	54F5-7 dny	65	
56	Doplnění glykolové směsi ZL24c	7 dny	10.11.21	16.11.21	41F5-1 den		
57	Pernírování sálí Žilova, Šolínova	35 dny	07.01.22	10.02.22	63FF+2 dny	ZL42 - práce v doč. č.4	
58	Puklaté sloupky	34 dny	21.12.21	23.01.22			
59	Olina - vrbnice Žilova, Šolínova	100 dny	21.10.21	28.01.22			
60	Santární příčky	14 dny	01.11.21	14.11.21	45		
61	Systém gamaráního klíče	15 dny	16.01.22	30.01.22	49		
62	Dodávka a montáž interiérového nábytku	85 dny	28.10.21	20.01.22	48F5-88 dny		
63	Závěrečný úklid	39 dny	05.01.22	12.02.22	49FF-9 dny; 57FF+2 dny	65	úklid mohl být dokončen až po dokončení většiny stavebních prací (pernírování sálí)
64	Kompletní školení	3 dny	28.01.22	30.01.22	65F5-1 den		

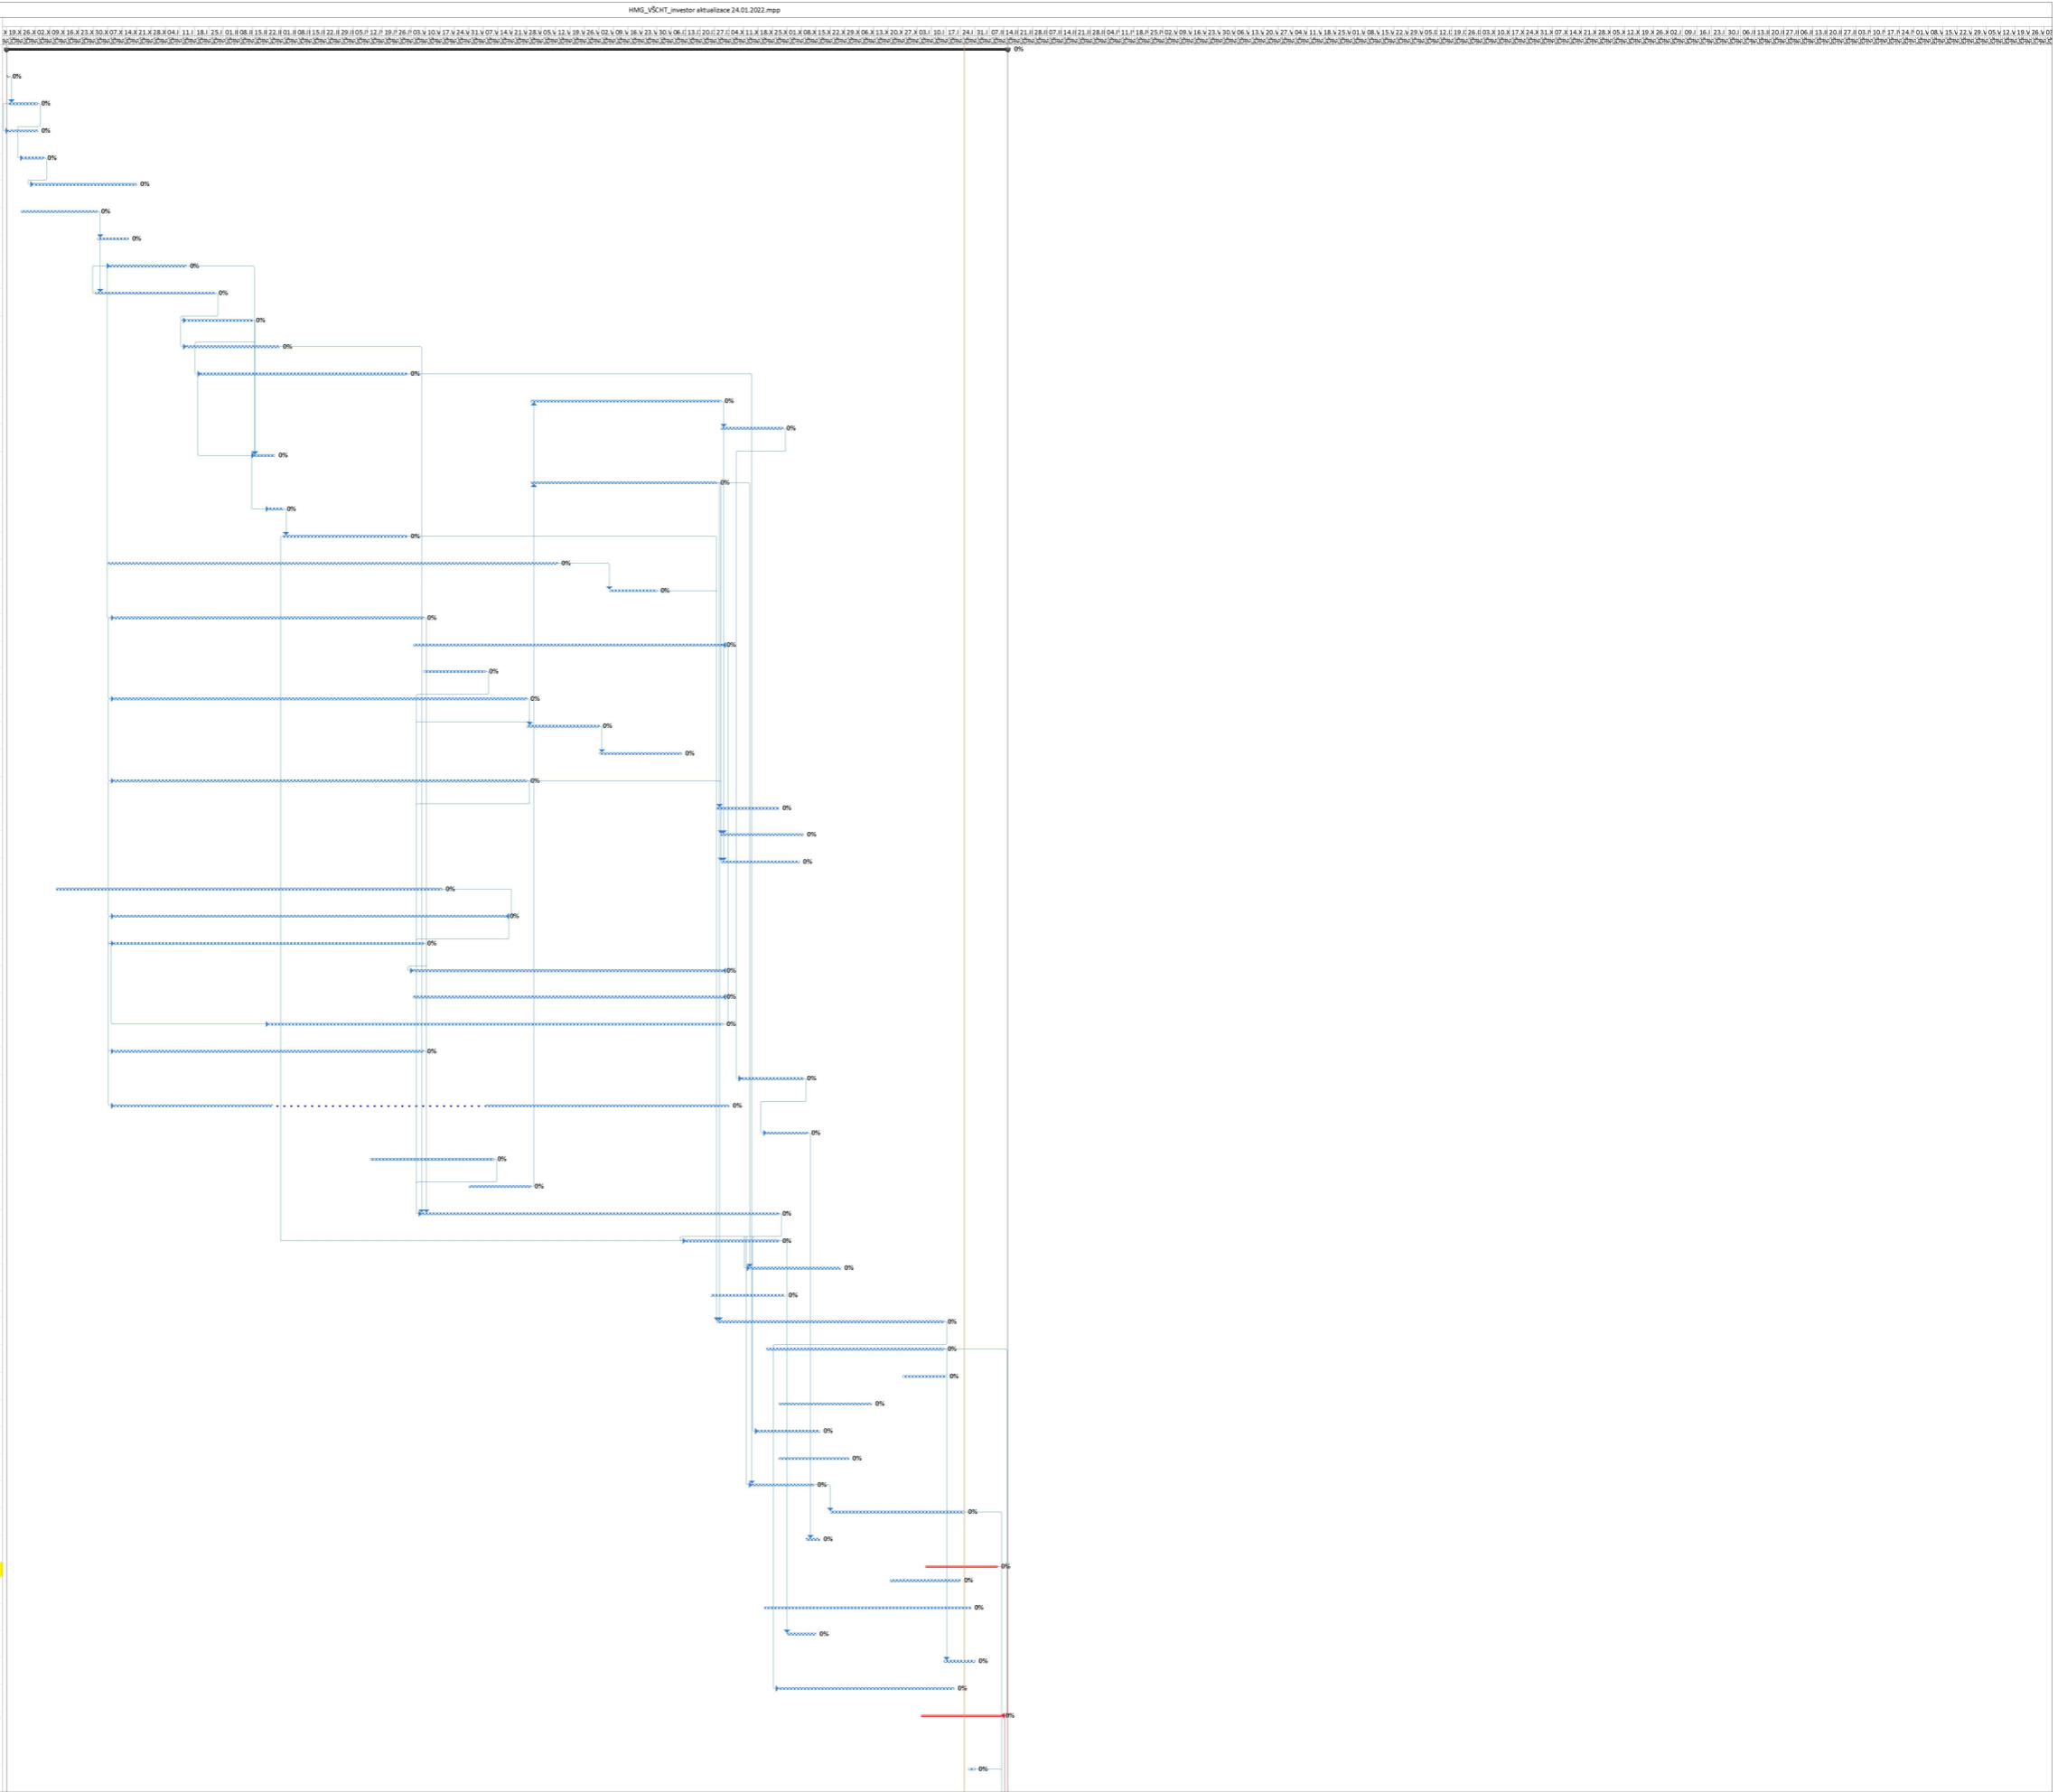

Kritický	Průběh kritického úkolu	Rozdělení	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	3	Směrný plán	Míně podle směrného plánu	Průběh souhrnného úkolu	Ruční rozhr	Vstříž úkoly	Nestrukt. úkol	Nestrukt. souhr
Rozdělení kritického úkolu	Úkol	Průběh úkolu	Pouze zahájen	Pouze s dobou trvání	C	Rozdělení podle směrného plánu	Míně	Souhrnný	Souhrn projektu	Vstříž míně	Nestrukt. míně	Konečný termín

ID	Průběh stav úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchozí	Následní	Typ
65	Předení díla	3 dny	13.02.22	15.02.22	63-5-4FS+1 den,55		
