

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	2022		2023		2024		2025		2026	
									p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2
1			Rekonstrukce stropní desky Florenc metro C	1643 dny	01.03. 22	29.08. 26			01.03.									1643 dny
2			Projektové práce a autorský dozor	1643 dny	01.03. 22	29.08. 26			01.03.									1643 dny
3			Stavební dozor investora	1643 dny	01.03. 22	29.08. 26			01.03.									1643 dny
4			Dopravní omezení metra linka C	1500 dny	21.05. 22	28.06. 26			21.05.									1500 dny
5			1.ETAPA	520 dny	21.05. 22	22.10. 23			21.05.		1.ETAPA		520 dny					
6			1.fáze	23 dny	21.05. 22	12.06. 22			21.05.		1.fáze		23 dny					
7			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	21.05. 22	22.05. 22	115		21.05.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů		2 dny					
8			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	04.06. 22	05.06. 22	121		04.06.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů		2 dny					
9			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	28.05. 22	29.05. 22	117		28.05.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.		2 dny					
10			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	11.06. 22	12.06. 22	123		11.06.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.		2 dny					
11			2.fáze	23 dny	06.08. 22	28.08. 22			06.08.		2.fáze		23 dny					
12			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	06.08. 22	07.08. 22	132		06.08.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů		2 dny					
13			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	20.08. 22	21.08. 22	138		20.08.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů		2 dny					
14			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	13.08. 22	14.08. 22	134		13.08.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.		2 dny					
15			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	27.08. 22	28.08. 22	140		27.08.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.		2 dny					
16			3.fáze	36 dny	31.10. 22	05.12. 22			31.10.		3.fáze		36 dny					
17			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	31.10. 22	01.11. 22	149		31.10.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů		2 dny					
18			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	27.11. 22	28.11. 22	155		27.11.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů		2 dny					
19			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	20.11. 22	21.11. 22	151		20.11.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.		2 dny					
20			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	04.12. 22	05.12. 22	157		04.12.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.		2 dny					
21			4.fáze	30 dny	18.02. 23	19.03. 23			18.02.		4.fáze		30 dny					
22			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	18.02. 23	19.02. 23	166		18.02.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů		2 dny					
23			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	11.03. 23	12.03. 23	172		11.03.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů		2 dny					
24			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	04.03. 23	05.03. 23	168		04.03.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.		2 dny					
25			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	18.03. 23	19.03. 23	174		18.03.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.		2 dny					
26			5.fáze	29 dny	30.04. 23	28.05. 23			30.04.		5.fáze		29 dny					
27			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	30.04. 23	01.05. 23	183		30.04.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů		2 dny					
28			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	27.05. 23	28.05. 23	189		27.05.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů		2 dny					
29			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	20.05. 23	21.05. 23	185		20.05.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.		2 dny					
30			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	27.05. 23	28.05. 23	191		27.05.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.		2 dny					
31			6.fáze	37 dny	15.07. 23	20.08. 23			15.07.		6.fáze		37 dny					
32			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	15.07. 23	16.07. 23	200		15.07.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů		2 dny					
33			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	05.08. 23	06.08. 23	206		05.08.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů		2 dny					
34			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr. Term.	2 dny	29.07. 23	30.07. 23	202		29.07.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr. Term.		2 dny					
35			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr. term.	2 dny	19.08. 23	20.08. 23	208		19.08.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr. term.		2 dny					
36			7.fáze	30 dny	23.09. 23	22.10. 23			23.09.		7.fáze		30 dny					
37			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	23.09. 23	24.09. 23	217		23.09.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů		2 dny					
38			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	07.10. 23	08.10. 23	223		07.10.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů		2 dny					
39			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	07.10. 23	08.10. 23	219		07.10.		Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.		2 dny					
40			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr term.	2 dny	21.10. 23	22.10. 23	225		21.10.		Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr term.		2 dny					
41			2a.ETAPA	149 dny	12.11. 22	09.04. 23			12.11.		2a.ETAPA		149 dny					
42			1.fáze	79 dny	12.11. 22	29.01. 23			12.11.		1.fáze		79 dny					

Rekonstr.stropní desky Florenc C	Úkol	Souhrnný	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník	Průběh ručně zadaného úkolu
	Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín	Průběh
	Milník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Průběh	

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	2022		2023		2024		2025		2026	
									p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2		
43			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	12.11.22	13.11.22	257				Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 12.11. 2 dny							
44			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	22.11.22	23.11.22	263				Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 22.11. 2 dny							
45			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	15.11.22	16.11.22	259				Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term. 15.11. 2 dny							
46			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	28.01.23	29.01.23	265				Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term. 28.01. 2 dny							
47			2.fáze	37 dny	04.03.23	09.04.23					2.fáze 04.03. 37 dny							
48			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	08.04.23	09.04.23	275				Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 08.04. 2 dny							
49			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	11.03.23	12.03.23	281				Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 11.03. 2 dny							
50			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	04.03.23	05.03.23	277				Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term. 04.03. 2 dny							
51			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	18.03.23	19.03.23	283				Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term. 18.03. 2 dny							
52			2b.ETAPA	289 dny	15.07.23	28.04.24					15.07. 289 dny 2b.ETAPA							
53			1.fáze	37 dny	15.07.23	20.08.23					1.fáze 15.07. 37 dny							
54			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	15.07.23	16.07.23	307				Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 15.07. 2 dny							
55			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	05.08.23	06.08.23	313				Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 05.08. 2 dny							
56			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	29.07.23	30.07.23	309				Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term. 29.07. 2 dny							
57			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	19.08.23	20.08.23	315				Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term. 19.08. 2 dny							
58			2.fáze	30 dny	23.09.23	22.10.23					2.fáze 23.09. 30 dny							
59			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	23.09.23	24.09.23	324				Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 23.09. 2 dny							
60			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	07.10.23	08.10.23	330				Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 07.10. 2 dny							
61			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	07.10.23	08.10.23	326				Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term. 07.10. 2 dny							
62			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	21.10.23	22.10.23	332				Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term. 21.10. 2 dny							
63			2c.ETAPA	30 dny	30.03.24	28.04.24					30.03. 30 dny 2c.ETAPA							
64			Výluka provozu metra linky C - demolice str. monolitické předp.desky	2 dny	30.03.24	31.03.24	355				Výluka provozu metra linky C - demolice str. monolitické předp.desky 30.03. 2 dny							
65			Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky	2 dny	13.04.24	14.04.24					Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky 13.04. 2 dny							
66			Výluka provozu metra linky C - demolice str. monolitické předp.desky - náhradní termín	2 dny	13.04.24	14.04.24	357				Výluka provozu metra linky C - demolice str. monolitické předp.desky - náhradní termín 13.04. 2 dny							
67			Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky - náhradní termín	2 dny	27.04.24	28.04.24	363				Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky - náhradní termín 27.04. 2 dny							
68			3a.ETAPA	107 dny	11.01.25	27.04.25					11.01. 107 dny 3a.ETAPA							
69			1.fáze	30 dny	11.01.25	09.02.25					1.fáze 11.01. 30 dny							
70			Výluka provozu metra linky C - demolice str. monolitické předp.desky	2 dny	11.01.25	12.01.25					Výluka provozu metra linky C - demolice str. monolitické předp.desky 11.01. 2 dny							
71			Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky	2 dny	25.01.25	26.01.25					Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky 25.01. 2 dny							
72			Výluka provozu metra linky C - demolice str. monolitické předp. Desky náhr.termín	2 dny	25.01.25	26.01.25					Výluka provozu metra linky C - demolice str. monolitické předp. Desky náhr.termín 25.01. 2 dny							
73			Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky - náhradní termín	2 dny	08.02.25	09.02.25					Výluka provozu metra linky C - montáž ocel.nosníků str. desky - náhradní termín 08.02. 2 dny							
74			2.fáze	30 dny	29.03.25	27.04.25					2.fáze 29.03. 30 dny							
75			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	29.03.25	30.03.25					Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 29.03. 2 dny							
76			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	12.04.25	13.04.25					Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 12.04. 2 dny							
77			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	12.04.25	13.04.25					Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term. 12.04. 2 dny							
78			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	26.04.25	27.04.25					Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term. 26.04. 2 dny							
79			3b.ETAPA	114 dny	26.07.25	16.11.25					26.07. 114 dny 3b.ETAPA							
80			1.fáze	30 dny	26.07.25	24.08.25					1.fáze 26.07. 30 dny							
81			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	26.07.25	27.07.25					Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů 26.07. 2 dny							
82			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	09.08.25	10.08.25					Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů 09.08. 2 dny							
83			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	09.08.25	10.08.25					Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term. 09.08. 2 dny							
84			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	23.08.25	24.08.25					Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term. 23.08. 2 dny							

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrnný		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Pouze s datem dokončení		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Pouze s datem dokončení		Konečný termín		Průběh
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhrn		Vnější úkoly		Průběh		Průběh		Průběh

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	2022	2023	2024	2025	2026	
									p1	p2	p1	p2	p1	p2
85			2.fáze	30 dny	18.10.25	16.11.25								
86			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	18.10.25	19.10.25								
87			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	01.11.25	02.11.25								
88			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	01.11.25	02.11.25								
89			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	15.11.25	16.11.25								
90			3c.ETAPA	100 dny	21.03.26	28.06.26								
91			1.fáze	30 dny	21.03.26	19.04.26								
92			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	21.03.26	22.03.26								
93			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	04.04.26	05.04.26								
94			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	04.04.26	05.04.26								
95			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	18.04.26	19.04.26								
96			2.fáze	30 dny	30.05.26	28.06.26								
97			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů	2 dny	30.05.26	31.05.26								
98			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů	2 dny	13.06.26	14.06.26								
99			Výluka provozu metra linky C - demontáž str. panelů - náhr.term.	2 dny	13.06.26	14.06.26								
100			Výluka provozu metra linky C - usazování str. panelů - náhr.term.	2 dny	27.06.26	28.06.26								
101			Rekonstrukce desky Florenc - C	1642 dny	01.03.22	28.08.26								
102			Rekostrukce str. desky sloučená etapa 1 a 2	856 dny	01.03.22	03.07.24								
103			1.ETAPA	687 dny	01.03.22	16.01.24								
104	SO-01		Příprava území	15 dny	01.03.22	15.03.22								
105	SO-02		ZS, vjezdy na staveniště	7 dny	01.03.22	07.03.22								
106	SO-07		Staveništní přípojka NN kV - TS 2848	6 dny	01.03.22	06.03.22								
107			přeložka kanalizace	21 dny	01.03.22	21.03.22								
108	SO-08		Ochrana inženýrských sítí	4 dny	16.03.22	19.03.22	104							
109	SO-01		Demolice	8 dny	20.03.22	27.03.22	108							
110	SO-20		Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 1.fáze	91 dny	28.03.22	26.06.22								
111			stavební jáma	15 dny	28.03.22	11.04.22	109							
112			Provizorní ochranná konstrukce (výstavba)	24 dny	28.03.22	20.04.22	109							
113			Stavební úpravy - výzvednutí vč podstojkování a diagnostiky	15 dny	21.04.22	05.05.22	112							
114			Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	14 dny	06.05.22	19.05.22	113							
115			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	20.05.22	20.05.22	114							
116			Demontáž stropních panelů	2 dny	21.05.22	22.05.22	115							
117			stavební proluka	5 dny	23.05.22	27.05.22	116							
118			náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	28.05.22	29.05.22	117							
119			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	30.05.22	30.05.22	118							
120			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	31.05.22	02.06.22	119							
121			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	03.06.22	03.06.22	120							
122			Uložení nových str. panelů	2 dny	04.06.22	05.06.22	121							
123			stavební proluka	5 dny	06.06.22	10.06.22	122							
124			náhradní termín uložení str. panelů	2 dny	11.06.22	12.06.22	123							
125			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	13.06.22	13.06.22	124							
126			nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	12 dny	14.06.22	25.06.22	125							

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrnný		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Pouze s datem dokončení		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Souhrm projektu		Neaktivní souhrm		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Průběh		Konečný termín		Průběh
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhrm		Vnější úkoly		Průběh		Průběh		Průběh

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	2022	2023	2024	2025	2026
127			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	26.06.22	26.06.22	126		2022	2023	2024	2025	2026
128	SO-20		Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 2.fáze	69 dny	07.07.22	13.09.22			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 26.06. 1 den	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 2.fáze 07.07. 69 dny			
145	SO-20		Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 3.fáze	79 dny	05.10.22	22.12.22			Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 3.fáze 05.10. 79 dny	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 3.fáze 05.10. 79 dny			
162	SO-20		Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 4.fáze	103 dny	23.12.22	04.04.23	129		Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 4.fáze 23.12. 103 dny	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 4.fáze 23.12. 103 dny			
179	SO-20		Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 5.fáze	63 dny	12.04.23	13.06.23			Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 5.fáze 12.04. 63 dny	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 5.fáze 12.04. 63 dny			
196	SO-20		Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 6.fáze	84 dny	14.06.23	05.09.23	130		Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 6.fáze 14.06. 84 dny	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 6.fáze 14.06. 84 dny			
213	SO-20		Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 7.fáze	123 dny	06.09.23	06.01.24	131		Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 7.fáze 06.09. 123 dny	Úpravy stropní konstrukce - 1.etapa - 7.fáze 06.09. 123 dny			
214			Stavební jáma	6 dny	06.09.23	11.09.23	212		Stavební jáma 06.09. 6 dny	Stavební jáma 06.09. 6 dny			
215			Stavební úpravy - pro přípravu výhlednutí str. panelů, vč. podstojkování stropní kce, vč. diagnostiky	5 dny	12.09.23	16.09.23	214		Stavební úpravy - pro přípravu výhlednutí str. panelů, vč. podstojkování stropní kce, vč. diagnostiky 12.09. 5 dny	Stavební úpravy - pro přípravu výhlednutí str. panelů, vč. podstojkování stropní kce, vč. diagnostiky 12.09. 5 dny			
216			Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	5 dny	17.09.23	21.09.23	215		Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu 17.09. 5 dny	Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu 17.09. 5 dny			
217			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	22.09.23	22.09.23	216		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 22.09. 1 den	Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 22.09. 1 den			
218			Demontáž stropních panelů	2 dny	23.09.23	24.09.23			Demontáž stropních panelů 23.09. 2 dny	Demontáž stropních panelů 23.09. 2 dny			
219			Stavební proluka	12 dny	25.09.23	06.10.23	218		Stavební proluka 25.09. 12 dny	Stavební proluka 25.09. 12 dny			
220			Náhradní termín demontáže str. panelů	2 dny	07.10.23	08.10.23			Náhradní termín demontáže str. panelů 07.10. 2 dny	Náhradní termín demontáže str. panelů 07.10. 2 dny			
221			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	09.10.23	09.10.23	220		Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 09.10. 1 den	Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 09.10. 1 den			
222			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	10.10.23	12.10.23	221		Sanace uložených prahů, výměna ložisek 10.10. 3 dny	Sanace uložených prahů, výměna ložisek 10.10. 3 dny			
223			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	06.10.23	06.10.23			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 06.10. 1 den	Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 06.10. 1 den			
224			Uložení nových str. panelů	2 dny	07.10.23	08.10.23			Uložení nových str. panelů 07.10. 2 dny	Uložení nových str. panelů 07.10. 2 dny			
225			Stavební proluka	12 dny	09.10.23	20.10.23	224		Stavební proluka 09.10. 12 dny	Stavební proluka 09.10. 12 dny			
226			Náhradní termín uložení stropních panelů	2 dny	21.10.23	22.10.23	225		Náhradní termín uložení stropních panelů 21.10. 2 dny	Náhradní termín uložení stropních panelů 21.10. 2 dny			
227			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	23.10.23	23.10.23	226		Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 23.10. 1 den	Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 23.10. 1 den			
228			Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	74 dny	24.10.23	05.01.24	227		Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce 24.10. 74 dny	Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce 24.10. 74 dny			
229			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	06.01.24	06.01.24	228		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 06.01. 1 den	Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 06.01. 1 den			
230	SO-92		SO-92 Sadové úpravy	10 dny	07.01.24	16.01.24	229		SO-92 Sadové úpravy 07.01. 10 dny	SO-92 Sadové úpravy 07.01. 10 dny			
231			2.ETAPA	764 dny	01.06.22	03.07.24			01.06. 764 dny	01.06. 764 dny			
232			Za.ETAPA	345 dny	01.06.22	11.05.23			01.06. 345 dny	01.06. 345 dny			
233	SO-01		Příprava území včetně etap 2b a 2c	30 dny	01.06.22	30.06.22			Příprava území včetně etap 2b a 2c 01.06. 30 dny	Příprava území včetně etap 2b a 2c 01.06. 30 dny			
234	SO-02		ZS, vjezdy na staveniště	7 dny	09.06.22	15.06.22	233FS-22 dny		ZS, vjezdy na staveniště 09.06. 7 dny	ZS, vjezdy na staveniště 09.06. 7 dny			
235	SO-03		Staveništní přípojka - metro	3 dny	16.06.22	18.06.22	234		Staveništní přípojka - metro 16.06. 3 dny	Staveništní přípojka - metro 16.06. 3 dny			
236	SO-08		Ochrana inženýrských sítí včetně 2b a 2c	6 dny	19.06.22	24.06.22	235		Ochrana inženýrských sítí včetně 2b a 2c 19.06. 6 dny	Ochrana inženýrských sítí včetně 2b a 2c 19.06. 6 dny			
237	SO-10		Demolice na povrchu včetně 2b a 2c	7 dny	01.07.22	07.07.22	233;236		Demolice na povrchu včetně 2b a 2c 01.07. 7 dny	Demolice na povrchu včetně 2b a 2c 01.07. 7 dny			
238	SO-11		Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. Kce č.1	30 dny	25.06.22	04.08.22	236		Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. Kce č.1 25.06. 30 dny	Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. Kce č.1 25.06. 30 dny			
239	SO-27		Výstavba kabelových komor ul. Křížkova	20 dny	07.08.22	26.08.22	238FS+2 dny;242		Výstavba kabelových komor ul. Křížkova 07.08. 20 dny	Výstavba kabelových komor ul. Křížkova 07.08. 20 dny			
240	SO-31		Provizorní SSZ 8.238	5 dny	05.08.22	09.08.22	238		Provizorní SSZ 8.238 05.08. 5 dny	Provizorní SSZ 8.238 05.08. 5 dny			
241	SO-51		Přeložka vodovodu vod. Přípojky muzea	25 dny	08.07.22	01.08.22	237		Přeložka vodovodu vod. Přípojky muzea 08.07. 25 dny	Přeložka vodovodu vod. Přípojky muzea 08.07. 25 dny			
242	SO-52		Přeložka vodovodu DN200	30 dny	08.07.22	06.08.22	237		Přeložka vodovodu DN200 08.07. 30 dny	Přeložka vodovodu DN200 08.07. 30 dny			
243	SO-57/20		Provizorní přeložka vodovodu ČSAD	30 dny	10.08.22	08.09.22	240		Provizorní přeložka vodovodu ČSAD 10.08. 30 dny	Provizorní přeložka vodovodu ČSAD 10.08. 30 dny			
244	SO-54		Zkrácení kanalizace DN300	5 dny	06.09.22	10.09.22	249		Zkrácení kanalizace DN300 06.09. 5 dny	Zkrácení kanalizace DN300 06.09. 5 dny			
245	SO-55/11		Dočasné zrušení odvodnění ČSAD	2 dny	11.09.22	12.09.22	244		Dočasné zrušení odvodnění ČSAD 11.09. 2 dny	Dočasné zrušení odvodnění ČSAD 11.09. 2 dny			
246	SO-56/20		Ochrana výtlačku z metra	2 dny	13.09.22	14.09.22	245		Ochrana výtlačku z metra 13.09. 2 dny	Ochrana výtlačku z metra 13.09. 2 dny			
247	SO-65/20		Ochrana výtlačku z metra	2 dny	13.09.22	14.09.22	245		Ochrana výtlačku z metra 13.09. 2 dny	Ochrana výtlačku z metra 13.09. 2 dny			
248	SO-68/20		Dočasné přeložka ocelového plynovodu DN 50	15 dny	08.07.22	22.07.22	237		Dočasné přeložka ocelového plynovodu DN 50 08.07. 15 dny	Dočasné přeložka ocelového plynovodu DN 50 08.07. 15 dny			

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrnný		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Konečný termín		
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhrn		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	2022												2023												2024												2025												2026											
									p1		p2		p1		p2		p1		p2		p1		p2		p1		p2		p1		p2		p1		p2		p1		p2		p1		p2																									
249			Dočasná přeložka STL plynovodní přípojky PE63 pro ČSAD Florenc	17 dny	20.08. 22	05.09. 22	240FS+10 dny		Dočasná přeložka STL plynovodní přípojky PE63 pro ČSAD Florenc 20.08. 17 dny																																																											
250		SO-74/01	Zrušení osvětlení	2 dny	09.09. 22	10.09. 22	243		Zrušení osvětlení 09.09. 2 dny																																																											
251		SO-76	Úpravy NN rozvodů ČSAD - provizorní stav	8 dny	05.08. 22	12.08. 22	238		Úpravy NN rozvodů ČSAD - provizorní stav 05.08. 8 dny																																																											
252		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 2a. Etapa - 1. fáze	159 dny	11.09. 22	16.02. 23			Úpravy stropní konstrukce - 2a. Etapa - 1. fáze 11.09. 159 dny																																																											
253			Stavební jáma	12 dny	11.09. 22	22.09. 22	244		Stavební jáma 11.09. 12 dny																																																											
254			Provizorní ochranná konstrukce (výstavba)	17 dny	23.09. 22	09.10. 22	253		Provizorní ochranná konstrukce (výstavba) 23.09. 17 dny																																																											
255			Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč. Diagnostiky	11 dny	10.10. 22	20.10. 22	254		Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč. Diagnostiky 10.10. 11 dny																																																											
256			Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	21 dny	21.10. 22	10.11. 22	255		Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu 21.10. 21 dny																																																											
257			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	11.11. 22	11.11. 22	256		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 11.11. 1 den																																																											
258			Demontáž stropních panelů	3 dny	31.10. 22	02.11. 22			Demontáž stropních panelů 31.10. 3 dny																																																											
259			Stavební proluka	12 dny	03.11. 22	14.11. 22	258		Stavební proluka 03.11. 12 dny																																																											
260			Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	15.11. 22	16.11. 22	259		Náhradní termín demotáže str. panelů 15.11. 2 dny																																																											
261			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	17.11. 22	17.11. 22	260		Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 17.11. 1 den																																																											
262			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	18.11. 22	20.11. 22	261		Sanace uložených prahů, výměna ložisek 18.11. 3 dny																																																											
263			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	21.11. 22	21.11. 22	262		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 21.11. 1 den																																																											
264			Uložení nových str. panelů	2 dny	14.01. 23	15.01. 23			Uložení nových str. panelů 14.01. 2 dny																																																											
265			Stavební proluka	12 dny	16.01. 23	27.01. 23	264		Stavební proluka 16.01. 12 dny																																																											
266			Náhradní termín montáže str. panelů	2 dny	28.01. 23	29.01. 23	265		Náhradní termín montáže str. panelů 28.01. 2 dny																																																											
267			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	30.01. 23	30.01. 23	266		Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 30.01. 1 den																																																											
268			Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	16 dny	31.01. 23	15.02. 23	267		Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce 31.01. 16 dny																																																											
269			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	16.02. 23	16.02. 23	268		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 16.02. 1 den																																																											
270			Úpravy stropní konstrukce - 2a. Etapa - 2.fáze (dtto 2a - 1.fáze)	50 dny	17.02. 23	07.04. 23			Úpravy stropní konstrukce - 2a. Etapa - 2.fáze (dtto 2a - 1.fáze) 17.02. 50 dny																																																											
271			Stavební jáma	7 dny	17.02. 23	23.02. 23	269		Stavební jáma 17.02. 7 dny																																																											
272			Provizorní ochranná konstrukce (výstavba)	12 dny	24.02. 23	07.03. 23	271		Provizorní ochranná konstrukce (výstavba) 24.02. 12 dny																																																											
273			Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč. Diagnostiky	9 dny	08.03. 23	16.03. 23	272		Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč. Diagnostiky 08.03. 9 dny																																																											
274			Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	21 dny	17.03. 23	06.04. 23	273		Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu 17.03. 21 dny																																																											
275			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	07.04. 23	07.04. 23	274		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 07.04. 1 den																																																											
276			Demontáž stropních panelů	2 dny	18.02. 23	19.02. 23			Demontáž stropních panelů 18.02. 2 dny																																																											
277			Stavební proluka	12 dny	20.02. 23	03.03. 23	276		Stavební proluka 20.02. 12 dny																																																											
278			Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	04.03. 23	05.03. 23	277		Náhradní termín demotáže str. panelů 04.03. 2 dny																																																											
279			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	06.03. 23	06.03. 23	278		Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 06.03. 1 den																																																											
280			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	07.03. 23	09.03. 23	279		Sanace uložených prahů, výměna ložisek 07.03. 3 dny																																																											
281			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	10.03. 23	10.03. 23	280		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 10.03. 1 den																																																											
282			Uložení nových str. panelů	2 dny	04.03. 23	05.03. 23			Uložení nových str. panelů 04.03. 2 dny																																																											
283			Stavební proluka	12 dny	06.03. 23	17.03. 23	282		Stavební proluka 06.03. 12 dny																																																											
284			Náhradní termín motáže str. panelů	2 dny	18.03. 23	19.03. 23	283		Náhradní termín motáže str. panelů 18.03. 2 dny																																																											
285			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	20.03. 23	20.03. 23	284		Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 20.03. 1 den																																																											
286			nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	16 dny	21.03. 23	05.04. 23	285		nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce 21.03. 16 dny																																																											
287			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	06.04. 23	06.04. 23	286		Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 06.04. 1 den																																																											
288		SO-41	Výstavba provizorní komunikace	16 dny	20.03. 23	04.04. 23	284		Výstavba provizorní komunikace 20.03. 16 dny																																																											
289		SO-57/10	Definitivní část přeložky vod. Přípojky ČSAD	30 dny	07.04. 23	06.05. 23	287		Definitivní část přeložky vod. Přípojky ČSAD 07.04. 30 dny																																																											
290		SO-55/10	Obnovení odvodnění ČSAD	4 dny	06.04. 23	09.04. 23	286		Obnovení odvodnění ČSAD 06.04. 4 dny																																																											

Rekonstr.stropní desky Florenc C


Úkol		Souhrnný		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Souhrm projektu		Neaktivní souhm		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Konečný termín		
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhm		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	2022		2023		2024		2025		2026	
									p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2
291		SO-56/10	Obnova výtahu z metra, nová UŠ	4 dny	10.04. 23	13.04. 23	290				Obnova výtahu z metra, nová UŠ 10.04. 4 dny							
292		SO-11	Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS	5 dny	07.05. 23	11.05. 23	289				Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS 07.05. 5 dny							
293			2b.ETAPA	217 dny	10.05. 23	12.12. 23					2b.ETAPA 10.05. 217 dny							
294		SO-11	Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce . č.2, č.7	30 dny	12.05. 23	10.06. 23	292				Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce . č.2, č.7 12.05. 30 dny							
295		SO-02	ZS, vjezdy na staveniště	2 dny	10.05. 23	11.05. 23	294S5-2 dny				ZS, vjezdy na staveniště 10.05. 2 dny							
296		SO-31	Provizorní SSZ 8.238 - provizorní řadič	5 dny	11.06. 23	15.06. 23	294				Provizorní SSZ 8.238 - provizorní řadič 11.06. 5 dny							
297		SO-32	Provizorní KK	5 dny	11.06. 23	15.06. 23	294				Provizorní KK 11.06. 5 dny							
298		SO-57/20	Provizorní přeložka vodovodu ČSAD	30 dny	20.05. 23	18.06. 23	294FS-22 dny				Provizorní přeložka vodovodu ČSAD 20.05. 30 dny							
299		SO-68/20	Dočasná přeložka ocelového plynovodu DN50	12 dny	12.06. 23	23.06. 23	294FS+1 den				Dočasná přeložka ocelového plynovodu DN50 12.06. 12 dny							
300		SO-67/21	Dočasná přeložka STL ocelového plynovodu DN50	7 dny	12.06. 23	18.06. 23	294FS+1 den				Dočasná přeložka STL ocelového plynovodu DN50 12.06. 7 dny							
301		SO-70	Provizorní přeložka kabelu 22kV	8 dny	11.06. 23	18.06. 23	294				Provizorní přeložka kabelu 22kV 11.06. 8 dny							
302		SO-74/02	Provizorní osvětlení komunikace	5 dny	19.06. 23	23.06. 23	300				Provizorní osvětlení komunikace 19.06. 5 dny							
303		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 2b. Etapa - 1.fáze	69 dny	19.06. 23	26.08. 23					Úpravy stropní konstrukce - 2b. Etapa - 1.fáze 19.06. 69 dny							
304			Stavební jáma	7 dny	19.06. 23	25.06. 23	300				Stavební jáma 19.06. 7 dny							
305			Stavební úpravy - pro přípravu výhlednutí str. panelů, vč podstojkování stropní kce,vč diagnostiky	13 dny	26.06. 23	08.07. 23	304				Stavební úpravy - pro přípravu výhlednutí str. panelů, vč podstojkování stropní kce,vč diagnostiky 26.06. 13 dny							
306			Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	5 dny	09.07. 23	13.07. 23	305				Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu 09.07. 5 dny							
307			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	14.07. 23	14.07. 23	306				Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 14.07. 1 den							
308			Demontáž stropních panelů	2 dny	15.07. 23	16.07. 23					Demontáž stropních panelů 15.07. 2 dny							
309			Stavební proluka	12 dny	17.07. 23	28.07. 23	308				Stavební proluka 17.07. 12 dny							
310			Náhradní termín demontáže str. panelů	2 dny	29.07. 23	30.07. 23	309				Náhradní termín demontáže str. panelů 29.07. 2 dny							
311			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	31.07. 23	31.07. 23	310				Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 31.07. 1 den							
312			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	01.08. 23	03.08. 23	311				Sanace uložených prahů, výměna ložisek 01.08. 3 dny							
313			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	04.08. 23	04.08. 23	312				Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 04.08. 1 den							
314			Uložení nových str. panelů	2 dny	05.08. 23	06.08. 23					Uložení nových str. panelů 05.08. 2 dny							
315			Stavební proluka	12 dny	07.08. 23	18.08. 23	314				Stavební proluka 07.08. 12 dny							
316			Náhradní termín uložení stropních panelů	2 dny	19.08. 23	20.08. 23	315				Náhradní termín uložení stropních panelů 19.08. 2 dny							
317			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	21.08. 23	21.08. 23	316				Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 21.08. 1 den							
318			Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	4 dny	22.08. 23	25.08. 23	317				Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce 22.08. 4 dny							
319			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	26.08. 23	26.08. 23	318				Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 26.08. 1 den							
320		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 2b. Etapa - 2.fáze	75 dny	27.08. 23	09.11. 23					Úpravy stropní konstrukce - 2b. Etapa - 2.fáze 27.08. 75 dny							
337		SO-21	Modernizace vestibulu a podchodu	162 dny	06.06. 23	14.11. 23	336FS-157 dny				Modernizace vestibulu a podchodu 06.06. 162 dny							
338		SO-57/10	Definitivní přeložka vodovodu ČSAD	30 dny	07.11. 23	06.12. 23	336FS-3 dny				Definitivní přeložka vodovodu ČSAD 07.11. 30 dny							
339		SO-56/10	Odvodnění výtahu z metra UŠ	20 dny	10.11. 23	29.11. 23	336				Odvodnění výtahu z metra UŠ 10.11. 20 dny							
340		SO-68/10	Konečná přeložka plynovodu PE63	15 dny	14.11. 23	28.11. 23	337FS-1 den				Konečná přeložka plynovodu PE63 14.11. 15 dny							
341		SO-41	Výstavba provizorního chodníku	10 dny	28.11. 23	07.12. 23	340FS-1 den				Výstavba provizorního chodníku 28.11. 10 dny							
342		SO-74/03	Osvětlení provizorního chodníku a komunikace	4 dny	08.12. 23	11.12. 23	341;338				Osvětlení provizorního chodníku a komunikace 08.12. 4 dny							
343		SO-11	Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS	6 dny	07.12. 23	12.12. 23	341FS-1 den;338				Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS 07.12. 6 dny							
344			2c.ETAPA	204 dny	13.12. 23	03.07. 24					2c.ETAPA 13.12. 204 dny							
345		SO-11	Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. Kce č. 3, č.7	30 dny	15.12. 23	13.01. 24	346				Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. Kce č. 3, č.7 15.12. 30 dny							
346		SO-02	ZS, vjezdy na staveniště	2 dny	13.12. 23	14.12. 23	343				ZS, vjezdy na staveniště 13.12. 2 dny							
347		SO-32	Provizorní KK - přepojení	6 dny	14.01. 24	19.01. 24	345				Provizorní KK - přepojení 14.01. 6 dny							
348		SO-58/20	Provizorní přeložka vodovodu DN300	30 dny	14.01. 24	12.02. 24	345				Provizorní přeložka vodovodu DN300 14.01. 30 dny							

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrnný		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Konečný termín		
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhrn		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	2022		2023		2024		2025		2026		
									p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	
349		SO-59/20	Provizorní přeložka kanalizace DN300	5 dny	24.01. 24	28.01. 24	345FS+10 dny												
350		SO-60	Ochrana kanalizace DN300	2 dny	29.01. 24	30.01. 24	349												
351		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 2c. Etapa	114 dny	13.02. 24	05.06. 24													
368		SO-21	Modernizace vestibulu a podchodu etapy 2c	102 dny	17.02. 24	28.05. 24	352FS-2 dny												
369		SO-22	Doplnění eskalátoru do výstupu k ÚAN Florenc	94 dny	23.02. 24	26.05. 24	352FS+4 dny												
370		SO-23	Obchodní vybavenost etapy 2c	106 dny	13.02. 24	28.05. 24	352SS												
371		SO-29	Informační systém MHD	10 dny	24.05. 24	02.06. 24	368FS-5 dny												
372		SO-33	Definitivní SSZ 8.238	8 dny	31.05. 24	07.06. 24	369FS+4 dny												
373		SO-34	Definitivní KK - jižní část	8 dny	31.05. 24	07.06. 24	369FS+4 dny												
374		SO-58/10	Definitivní přeložka vodovodu DN300	20 dny	06.06. 24	25.06. 24	367												
375		SO-59/10	Definitivní přeložka kanalizace DN300	6 dny	07.06. 24	12.06. 24	372FS-1 den;373FS-1 den												
376		SO-71	Definitivní přeložka kabelů 22 kV	2 dny	07.06. 24	08.06. 24	372FS-1 den;373FS-1 den												
377		SO-74/02	Rušení provizorního osvětlení (def. v SO-75/01)	3 dny	06.06. 24	08.06. 24	367												
378		SO-75/01	Definitivní přeložka VO - jižní strana Křížkovy ulice	5 dny	09.06. 24	13.06. 24	377												
379		SO-76	Úpravy NN rozvodů ČSAD - definitivní stav	1 den	07.06. 24	07.06. 24	376FS-2 dny												
380		SO-24	Drobná architektura po etapě 2a, 2b, 2c	5 dny	07.06. 24	11.06. 24	379FS-1 den												
381		SO-42	Definivní obnova povrchů po stavbě - etapy 2a, 2b, 2c	1 den	26.06. 24	26.06. 24	374												
382		SO-43	Definitivní úpravy chodníků po stavbě - etapy 2a, 2b, 2c	2 dny	26.06. 24	27.06. 24	374												
383		SO-44	Obnova parkoviště po stavbě - etapy 2a, 2b, 2c	6 dny	26.06. 24	01.07. 24	374												
384		SO-91	Sadové úpravy	2 dny	02.07. 24	03.07. 24	383												
385			3.ETAPA	786 dny	04.07. 24	28.08. 26	137												
386			3a.ETAPA	314 dny	04.07. 24	13.05. 25													
387		SO-11	Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce. č.4, č.5, č.7	30 dny	09.07. 24	07.08. 24	388FS-5 dny												
388		SO-02	ZS, vjezdy na staveniště	10 dny	04.07. 24	13.07. 24	384												
389		SO-08	Ochrana inženýrských sítí včetně 3b a 3c	5 dny	14.07. 24	18.07. 24	388												
390		SO-10	Demolice včetně 3b a 3c	10 dny	19.07. 24	28.07. 24	389												
391		SO-31	Provizorní SSZ 8.237	10 dny	08.08. 24	17.08. 24	387												
392		SO-61/20	Provizorní přeložka vodovodu DN200	40 dny	08.08. 24	16.09. 24	387												
393		SO-65/11	Dočasné zrušení odvodnění TSK	4 dny	08.08. 24	11.08. 24	387												
394		SO-69/20	Provizorní přeložka STL plynovodu PE 315	15 dny	08.08. 24	22.08. 24	387												
395		SO-72/01	Provizorní přeložky kabelů 1kV	8 dny	08.08. 24	15.08. 24	387												
396		SO-72/02	Provizorní přeložky kabelů 1kV	8 dny	08.08. 24	15.08. 24	387												
397		SO-74/04	Provizorní propojení VO	4 dny	08.08. 24	11.08. 24	387												
398		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3a. Etapa - 1.fáze	188 dny	17.09. 24	23.03. 25													
399			Stavební jáma	6 dny	17.09. 24	22.09. 24	392												
400			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	6 dny	23.09. 24	28.09. 24	399												
401			Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč ochranné příhradové.Kce,vč. Diagnostiky, demolice předpjaté monolitické stropní desky	36 dny	29.09. 24	03.11. 24	400												
402			Prořiznutí spar + odtrhnutí str. desky	16 dny	04.11. 24	19.11. 24	401												
403			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	20.11. 24	20.11. 24	402												
404			Demontáž stropních betonové monolitické předpjaté desky	2 dny	11.01. 25	12.01. 25													
405			Stavební proluka	5 dny	13.01. 25	17.01. 25	404												
406			Náhradní termín demotáže stropní desky	2 dny	25.01. 25	26.01. 25													

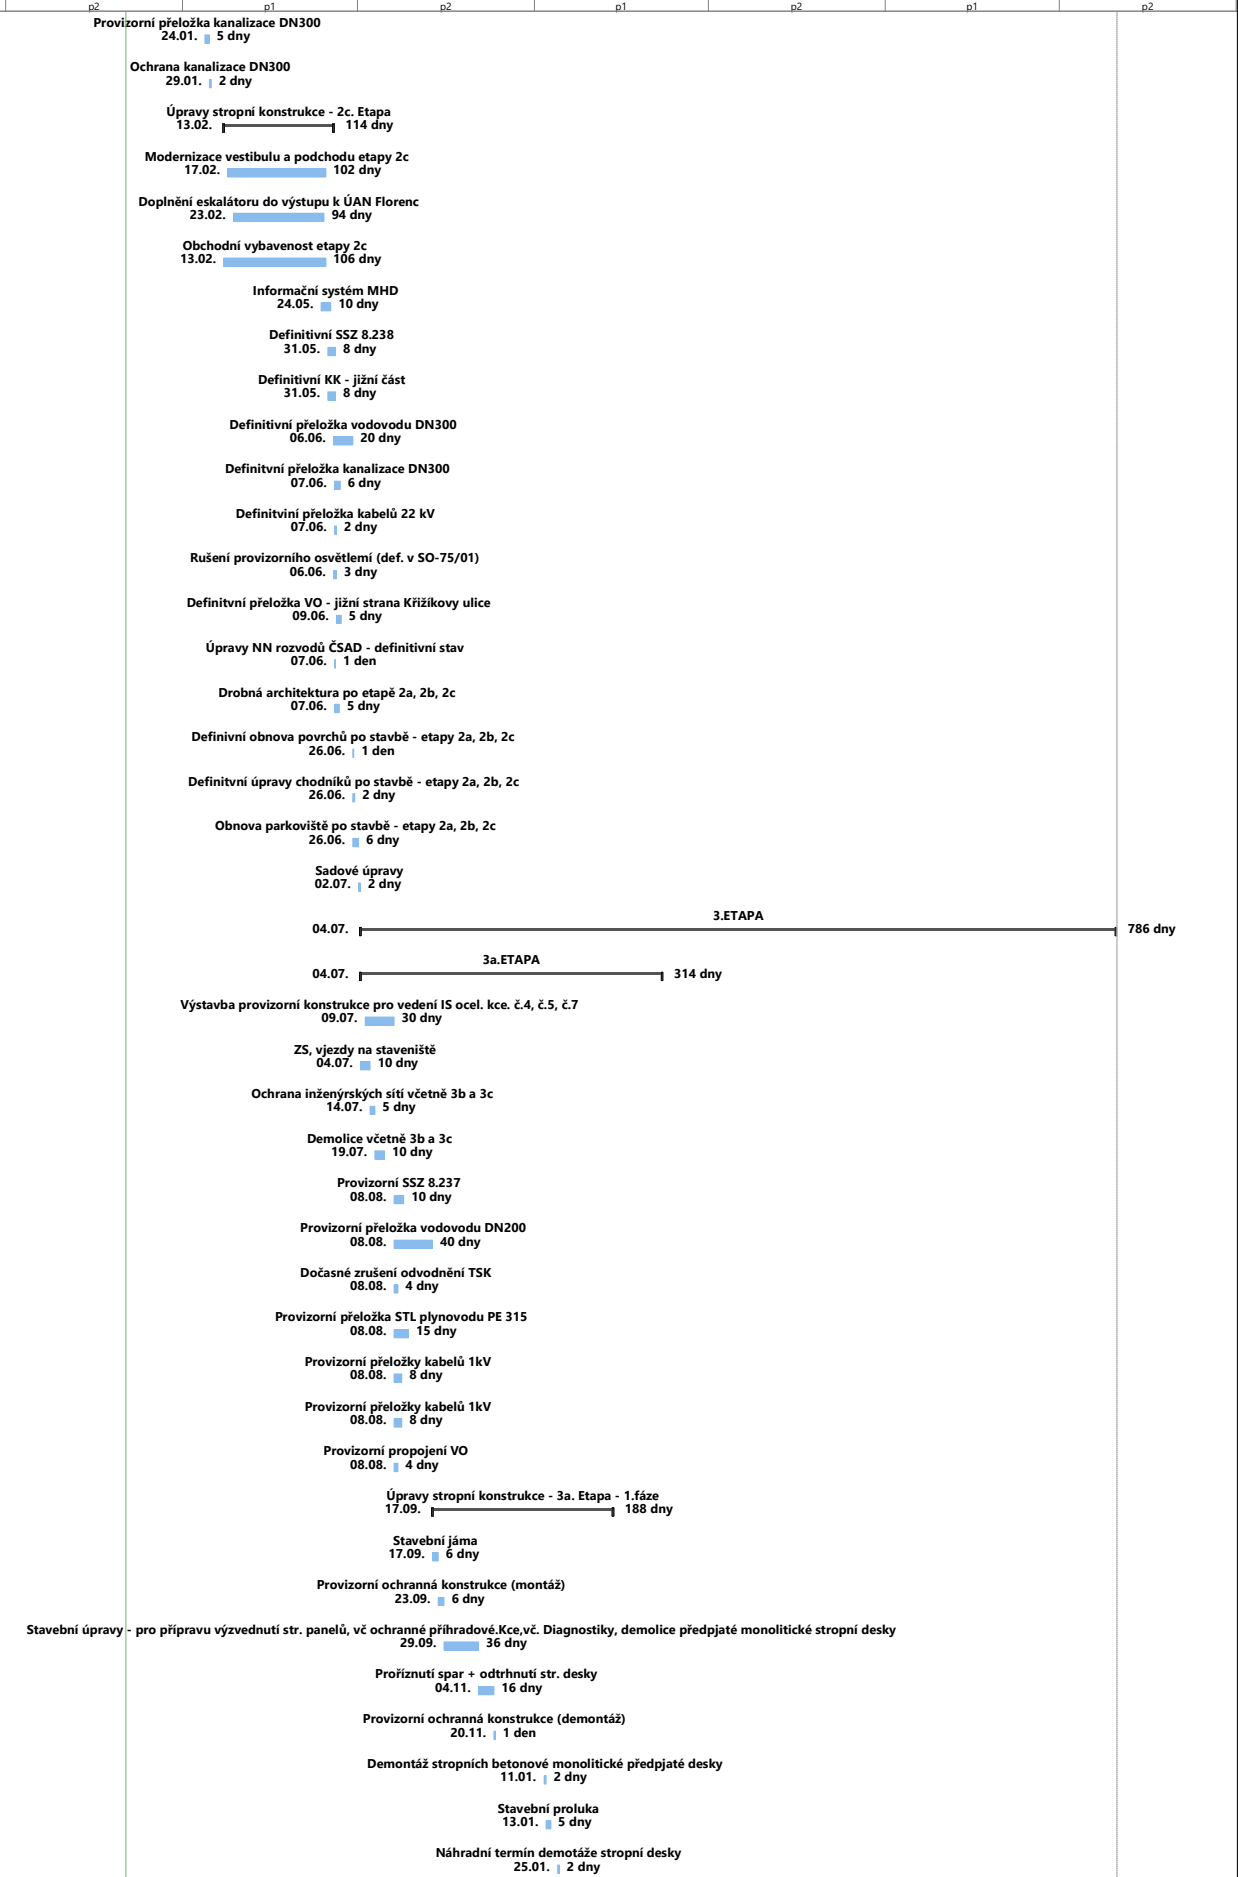

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrnný		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Souhrm projektu		Neaktivní souhm		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Konečný termín		
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhm		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	2022		2023		2024		2025		2026	
									p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2
407			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	27.01.25	27.01.25	406								Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	27.01.	1 den	
408			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	4 dny	28.01.25	31.01.25	407								Sanace uložených prahů, výměna ložisek	28.01.	4 dny	
409			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	01.02.25	01.02.25	408								Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	01.02.	1 den	
410			Montáž ocelových nosníků pro beton.monolitický strop	2 dny	25.01.25	26.01.25									Montáž ocelových nosníků pro beton.monolitický strop	25.01.	2 dny	
411			Stavební proluka	5 dny	27.01.25	31.01.25	410								Stavební proluka	27.01.	5 dny	
412			Náhradní termín montáže uložení ocelový nosníků	2 dny	08.02.25	09.02.25									Náhradní termín montáže uložení ocelový nosníků	08.02.	2 dny	
413			Výstavba nového ocelobetonového spřaženého stropu	30 dny	10.02.25	11.03.25	412								Výstavba nového ocelobetonového spřaženého stropu	10.02.	30 dny	
414			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	12.03.25	12.03.25	413								Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	12.03.	1 den	
415			Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	10 dny	13.03.25	22.03.25	414								Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	13.03.	10 dny	
416			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	23.03.25	23.03.25	415								Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	23.03.	1 den	
417			Úpravy stropní konstrukce - 3a. Etapa - 2.fáze	51 dny	24.03.25	13.05.25									Úpravy stropní konstrukce - 3a. Etapa - 2.fáze	24.03.	51 dny	
435		SO-21	Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3a	210 dny	17.09.24	14.04.25	392								Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3a	17.09.	210 dny	
436		SO-23	Obchodní vybavenost etapy 3a	205 dny	17.09.24	09.04.25	392								Obchodní vybavenost etapy 3a	17.09.	205 dny	
437		SO-27	Úpravy kabelovodu CETIN	7 dny	15.04.25	21.04.25	435								Úpravy kabelovodu CETIN	15.04.	7 dny	
438		SO-28	Úpravy kabelovodu SILNO	6 dny	15.04.25	20.04.25	435								Úpravy kabelovodu SILNO	15.04.	6 dny	
439		SO-69/10	Definitivní přeložka STL plynovodu PE 315	16 dny	31.03.25	15.04.25	438SF+1 den								Definitivní přeložka STL plynovodu PE 315	31.03.	16 dny	
440		SO-73/01	Definitivní přeložka kabelu 1 kV	9 dny	22.04.25	30.04.25	437								Definitivní přeložka kabelu 1 kV	22.04.	9 dny	
441		SO-75/02	Obnova severní strany Křížkovy ulice	5 dny	22.04.25	26.04.25	437								Obnova severní strany Křížkovy ulice	22.04.	5 dny	
442		SO-92	Konstrukce pro definitivní vedení IS, ocelové chráničky pro CETIN a SILNO	25 dny	31.03.25	24.04.25	437SF+10 dny;438SF+10 dny								Konstrukce pro definitivní vedení IS, ocelové chráničky pro CETIN a SILNO	31.03.	25 dny	
443			3b.ETAPA	315 dny	27.04.25	07.03.26									3b.ETAPA	27.04.	315 dny	
444		SO-02	ZS, vjezdy na staveniště	5 dny	27.04.25	01.05.25	442FS+2 dny								ZS, vjezdy na staveniště	27.04.	5 dny	
445		SO-08	Ochrana inženýrských sítí včetně 3b a 3c	5 dny	02.05.25	06.05.25	444								Ochrana inženýrských sítí včetně 3b a 3c	02.05.	5 dny	
446		SO-11	Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce č.6	15 dny	02.05.25	16.05.25	444								Výstavba provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce č.6	02.05.	15 dny	
447		SO-62	Ochrana kanalizace DN300	5 dny	10.05.25	14.05.25	446FS-7 dny								Ochrana kanalizace DN300	10.05.	5 dny	
448		SO-65/11	Dočasné zrušení odvodnění TSK	5 dny	10.05.25	14.05.25	446FS-7 dny								Dočasné zrušení odvodnění TSK	10.05.	5 dny	
449		SO-74/05	Provizorní propojení VO	7 dny	14.05.25	20.05.25	447FS-1 den								Provizorní propojení VO	14.05.	7 dny	
450		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3b. Etapa - část vestibul - 1.fáze	112 dny	21.05.25	09.09.25									Úpravy stropní konstrukce - 3b. Etapa - část vestibul - 1.fáze	21.05.	112 dny	
451			Stavební jáma	5 dny	21.05.25	25.05.25	449								Stavební jáma	21.05.	5 dny	
452			Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč podstojkování stropní kce, vč diagnostiky	12 dny	26.05.25	06.06.25	451								Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč podstojkování stropní kce, vč diagnostiky	26.05.	12 dny	
453			Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	11 dny	07.06.25	17.06.25	452								Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	07.06.	11 dny	
454			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	18.06.25	18.06.25	453								Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	18.06.	1 den	
455			Demontáž stropní betonové monolitické předpjaté desky	2 dny	19.06.25	20.06.25	454								Demontáž stropní betonové monolitické předpjaté desky	19.06.	2 dny	
456			Stavební proluka	5 dny	21.06.25	25.06.25	455								Stavební proluka	21.06.	5 dny	
457			Náhradní termín demontáže stropní desky	2 dny	09.08.25	10.08.25									Náhradní termín demontáže stropní desky	09.08.	2 dny	
458			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	11.08.25	11.08.25	457								Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	11.08.	1 den	
459			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	12.08.25	14.08.25	458								Sanace uložených prahů, výměna ložisek	12.08.	3 dny	
460			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	15.08.25	15.08.25	459								Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	15.08.	1 den	
461			Uložení nových str. panelů	2 dny	09.08.25	10.08.25									Uložení nových str. panelů	09.08.	2 dny	
462			Stavební proluka	5 dny	11.08.25	15.08.25	461								Stavební proluka	11.08.	5 dny	
463			Náhradní termín montáže uložení ocelových nosníků	2 dny	23.08.25	24.08.25									Náhradní termín montáže uložení ocelových nosníků	23.08.	2 dny	
464			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	25.08.25	25.08.25	463								Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	25.08.	1 den	
465			Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	14 dny	26.08.25	08.09.25	464								Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	26.08.	14 dny	

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrnný		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Souhrm projektu		Neaktivní souhm		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Konečný termín		
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhm		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	2022	2023	2024	2025	2026
466			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	09.09.25	09.09.25	465						
467		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3b. Etapa - část vestibul - 2.fáze	84 dny	10.09.25	02.12.25							
468			Stavební jáma	5 dny	10.09.25	14.09.25	466						
469			Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč podstojkování stropní kce, vč.diagnostiky	14 dny	15.09.25	28.09.25	468						
470			Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	11 dny	29.09.25	09.10.25	469						
471			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	10.10.25	10.10.25	470						
472			Demontáž stropních panelů	2 dny	18.10.25	19.10.25							
473			Stavební proluka	5 dny	20.10.25	24.10.25	472						
474			Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	01.11.25	02.11.25							
475			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	03.11.25	03.11.25	474						
476			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	04.11.25	06.11.25	475						
477			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	07.11.25	07.11.25	476						
478			Uložení nových str. panelů	2 dny	01.11.25	02.11.25							
479			Stavební proluka	5 dny	03.11.25	07.11.25	478						
480			Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	15.11.25	16.11.25							
481			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	17.11.25	17.11.25	480						
482			Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	12 dny	18.11.25	29.11.25	481						
483			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	3 dny	30.11.25	02.12.25	482						
484		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3b. Etapa - část větrací objekt	65 dny	03.12.25	05.02.26	483						
485		SO-21	Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3b	85 dny	03.12.25	25.02.26	483						
486		SO-23	Obchodní vybavenost etapy 3b	95 dny	03.12.25	07.03.26	483						
487		SO-65/10	Obnova odvodnění TSK	5 dny	06.02.26	10.02.26	484						
488		SO-73/02	Definitivní přeložka kabelů 1 kV	8 dny	06.02.26	13.02.26	484						
489		SO-11	Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS ocel. kce č.6	8 dny	14.02.26	21.02.26	488						
490			3c.ETAPA	188 dny	22.02.26	28.08.26							
491		SO-63	Provizorní přeložka vodovodu DN200 - po částech	15 dny	22.02.26	08.03.26	489						
492		SO-64	Zkrácení kanalizace VP 600/1100	5 dny	04.03.26	08.03.26	491FS-5 dny						
493		SO-74/06	Provizorní propojení VO	7 dny	04.03.26	10.03.26	491FS-5 dny						
494		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3c. Etapa - 1.fáze	50 dny	11.03.26	29.04.26							
495			Stavební jáma	9 dny	11.03.26	19.03.26	493						
496			Stavební úpravy - výzvednutí vč.podstojkování a diagnostiky	8 dny	20.03.26	27.03.26	495						
497			Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	14 dny	28.03.26	10.04.26	496						
498			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	11.04.26	11.04.26	497						
499			Demontáž stropních panelů	2 dny	21.03.26	22.03.26							
500			Stavební proluka	5 dny	23.03.26	27.03.26	499						
501			Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	04.04.26	05.04.26							
502			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	06.04.26	06.04.26	501						
503			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	07.04.26	09.04.26	502						
504			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	10.04.26	10.04.26	503						
505			Uložení nových str. panelů	2 dny	04.04.26	05.04.26							
506			Stavební proluka	5 dny	06.04.26	10.04.26	505						
507			Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	18.04.26	19.04.26							

Rekonstr.stropní desky Florenc C

Úkol		Souhrnný		Neaktivní milník		Pouze s dobou trvání		Pouze zahájení		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení		Konečný termín		
Milník		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhrn		Vnější úkoly		Průběh		

Stránka 9

ID	Režim úkolu	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	2022	2023	2024	2025	2026
508			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	20.04.26	20.04.26	507						Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 20.04. 1 den
509			Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	8 dny	21.04.26	28.04.26	508						Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce 21.04. 8 dny
510			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	29.04.26	29.04.26	509						Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 29.04. 1 den
511		SO-20	Úpravy stropní konstrukce - 3c. Etapa - 2.fáze	70 dny	30.04.26	08.07.26							Úpravy stropní konstrukce - 3c. Etapa - 2.fáze 30.04. 70 dny
512			Stavební jáma	9 dny	30.04.26	08.05.26	510						Stavební jáma 30.04. 9 dny
513			Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč podstojkování stropní kce, vč.diagnostiky	13 dny	09.05.26	21.05.26	512						Stavební úpravy - pro přípravu výzvednutí str. panelů, vč podstojkování stropní kce, vč 09.05. 13 dny
514			Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu	14 dny	22.05.26	04.06.26	513						Prořiznutí spar + odtrhnutí panelu 22.05. 14 dny
515			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	05.06.26	05.06.26	514						Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 05.06. 1 den
516			Demontáž stropních panelů	2 dny	30.05.26	31.05.26							Demontáž stropních panelů 30.05. 2 dny
517			Stavební proluka	5 dny	01.06.26	05.06.26	516						Stavební proluka 01.06. 5 dny
518			Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	13.06.26	14.06.26							Náhradní termín demotáže str. panelů 13.06. 2 dny
519			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	15.06.26	15.06.26	518						Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 15.06. 1 den
520			Sanace uložených prahů, výměna ložisek	3 dny	16.06.26	18.06.26	519						Sanace uložených prahů, výměna ložisek 16.06. 3 dny
521			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	1 den	19.06.26	19.06.26	520						Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 19.06. 1 den
522			Uložení nových str. panelů	2 dny	13.06.26	14.06.26							Uložení nových str. panelů 13.06. 2 dny
523			Stavební proluka	5 dny	15.06.26	19.06.26	522						Stavební proluka 15.06. 5 dny
524			Náhradní termín demotáže str. panelů	2 dny	27.06.26	28.06.26							Náhradní termín demotáže str. panelů 27.06. 2 dny
525			Provizorní ochranná konstrukce (montáž)	1 den	29.06.26	29.06.26	524						Provizorní ochranná konstrukce (montáž) 29.06. 1 den
526			Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce	7 dny	30.06.26	06.07.26	525						Nová kce, hydr. Izolační systém, zásyp kce 30.06. 7 dny
527			Provizorní ochranná konstrukce (demontáž)	2 dny	07.07.26	08.07.26	526						Provizorní ochranná konstrukce (demontáž) 07.07. 2 dny
528		SO-07	Rušení staveništní přípojky - PRE	3 dny	01.08.26	03.08.26	543						Rušení staveništní přípojky - PRE 01.08. 3 dny
529		SO-06	Rušení staveništní přípojky - metro	3 dny	13.07.26	15.07.26	530FS+4 dny						Rušení staveništní přípojky - metro 13.07. 3 dny
530		SO-21	Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3c	120 dny	11.03.26	08.07.26	493						Modernizace vestibulu a podchodu etapy 3c 11.03. 120 dny
531		SO-23	Obchodní vybavenost etapy 3c	100 dny	11.03.26	18.06.26	493						Obchodní vybavenost etapy 3c 11.03. 100 dny
532		SO-29	Informační systém MHD	10 dny	03.08.26	12.08.26	528FS-1 den						Informační systém MHD 03.08. 10 dny
533		SO-24	Drobná architektura po etapě 3a, 3b, 3c	7 dny	09.07.26	15.07.26	530						Drobná architektura po etapě 3a, 3b, 3c 09.07. 7 dny
534		SO-33	Definitivní SSZ 8.237	8 dny	09.07.26	16.07.26	527						Definitivní SSZ 8.237 09.07. 8 dny
535		SO-34	Definitivní KK - severní část	10 dny	09.07.26	18.07.26	527						Definitivní KK - severní část 09.07. 10 dny
536		SO-42	Definivní obnova povrchů po stavbě - etapy 3a, 3b, 3c	10 dny	13.08.26	22.08.26	544						Definivní obnova povrchů po stavbě - etapy 3a, 3b, 3c 13.08. 10 dny
537		SO-43	Definitivní úpravy chodníků po stavbě - etapy 3a, 3b, 3c	10 dny	13.08.26	22.08.26	544						Definitivní úpravy chodníků po stavbě - etapy 3a, 3b, 3c 13.08. 10 dny
538		SO-61/10	Definitivní přeložka vodovodu DN200	30 dny	09.07.26	07.08.26	527						Definitivní přeložka vodovodu DN200 09.07. 30 dny
539		SO-61/10	Definitivní přeložka vodovodu DN 200	30 dny	09.07.26	07.08.26	527						Definitivní přeložka vodovodu DN 200 09.07. 30 dny
540		SO-64	Zkrácení kanalizace VP600/1100	7 dny	23.07.26	29.07.26	528FS-12 dny						Zkrácení kanalizace VP600/1100 23.07. 7 dny
541		SO-65	Obnova odvodnění povrchů TSK a ČSAD	4 dny	13.07.26	16.07.26	530FS+4 dny						Obnova odvodnění povrchů TSK a ČSAD 13.07. 4 dny
542		SO-74/03	Rušení provizorního osvětlení	6 dny	19.07.26	24.07.26	535						Rušení provizorního osvětlení 19.07. 6 dny
543		SO-75/03	Obnova osvětlení ulice Ke Štvanici	10 dny	22.07.26	31.07.26	542FS-3 dny						Obnova osvětlení ulice Ke Štvanici 22.07. 10 dny
544		SO-11	Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS	5 dny	08.08.26	12.08.26	538;539						Rušení provizorní konstrukce pro vedení IS 08.08. 5 dny
545		SO-91	Sadové úpravy	7 dny	22.08.26	28.08.26	537FS-1 den						Sadové úpravy 22.08. 7 dny
546			Provozní soubory	1537 dny	01.03.22	15.05.26				01.03.	Provozní soubory		1537 dny
567			Ukončení stavby - Deska Florenc	1 den	29.08.26	29.08.26	545						Ukončení stavby - Deska Florenc 29.08. 1 den

Rekonstr.stropní desky Florenc C

- Úkol
- Rozdělení
- Milník
- Souhrnný
- Souhrn projektu
- Neaktivní úkol
- Neaktivní milník
- Neaktivní souhrn
- Ruční úkol
- Pouze s dobou trvání
- Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
- Ruční souhrn
- Pouze zahájení
- Pouze s datem dokončení
- Vnější úkoly
- Vnější milník
- Konečný termín
- Průběh
- Průběh ručně zadaného úkolu
