

ID	Režim úkolů	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	Gantt chart (2022-2030)	
1		Metro I.D. - Pankrác - Olbrachtova	2672 dny	28.03.22	29.09.29	0 dny	0 dny	Metro I.D. - Pankrác - Olbrachtova	
2		Předání staveniště	2 dny	28.03.22	30.03.22	0 dny	0 dny	Předání staveniště 28.03. 30.03.	
3		Předání podkladů dle bodu 18.4. SOD	0 dny	30.03.22	30.03.22	0 dny	0 dny	Předání podkladů dle bodu 18.4. SOD 30.03.	
4		Dokončení IGP (PAD 4 + VO-OL)	0 dny	31.03.22	31.03.22	0 dny	0 dny	Dokončení IGP (PAD 4 + VO-OL) 31.03.	
5		Sjízdnost 1.TK včetně spojky CD	0 dny	30.09.27	30.09.27	0 dny	0 dny	Sjízdnost 1.TK včetně spojky CD 30.09.	
6		Dokončení kolejových betonů	0 dny	08.10.27	08.10.27	0 dny	0 dny	Dokončení kolejových betonů 08.10.	
7		Dokončení kolejového svršku	0 dny	22.12.27	22.12.27	0 dny	0 dny	Dokončení kolejového svršku 22.12.	
8		Energetická páteř trasy	0 dny	15.11.28	15.11.28	0 dny	0 dny	Energetická páteř trasy 15.11.	
9		Milníky stavby	2668 dny	01.04.22	29.09.29	0 dny	0 dny	Milníky stavby	
10		Trasa I.D. - Pankrác - Olbrachtova	2668 dny	01.04.22	29.09.29	0 dny	0 dny	Trasa I.D. - Pankrác - Olbrachtova	
11		Zahájení stavby	0 dny	01.04.22	01.04.22	0 dny	0 dny	Zahájení stavby 01.04.	
12		Zahájení TT Pankrác	0 dny	01.02.24	01.02.24	18 dny	18 dny	Zahájení TT Pankrác 01.02.	
13		Dokončení ražeb stanice Pankrác	0 dny	30.03.26	30.03.26	1249 dny	1249 dny	Dokončení ražeb stanice Pankrác 30.03.	
14		Dokončení ražeb stanice Olbrachtova	0 dny	26.11.25	26.11.25	1363 dny	1363 dny	Dokončení ražeb stanice Olbrachtova 26.11.	
15		Dokončení sekundárního ostění stanice Pankrác včetně VNK	0 dny	12.07.27	12.07.27	790 dny	790 dny	Dokončení sekundárního ostění stanice Pankrác včetně VNK 12.07.	
16		Dokončení sekundárního ostění stanice Olbrachtova včetně VNK	0 dny	30.06.27	30.06.27	802 dny	802 dny	Dokončení sekundárního ostění stanice Olbrachtova včetně VNK 30.06.	
17		STP pro technologii	0 dny	22.12.27	22.12.27	627 dny	627 dny	STP pro technologii 22.12.	
18		Uzavření závazného otvoru VO-OL	0 dny	30.06.28	30.06.28	0 dny	0 dny	Uzavření závazného otvoru VO-OL 30.06.	
19		Zahájení komplexní zkoušek a přejímek	0 dny	01.04.29	01.04.29	0 dny	0 dny	Zahájení komplexní zkoušek a přejímek 01.04.	
20		Dokončení stavební části LD1a (mimo terénních a sadových úprav a likvidace ZS)	0 dny	31.07.29	31.07.29	0 dny	0 dny	Dokončení stavební části LD1a (mimo terénních a sadových úprav a likvidace ZS) 31.07.	
21		Dokončení díla LD1a	0 dny	29.09.29	29.09.29	0 dny	0 dny	Dokončení díla LD1a 29.09.	
22		Harmonogram komplexních funkčních zkoušek a přejímek metra D	90 dny	01.04.29	30.06.29	0 dny	0 dny	Harmonogram komplexních funkčních zkoušek a přejímek metra D 90 dny	
23		Komplexní zkoušky technologie - část napájení, osvětlení, větrání - 19 zkoušek	30 dny	01.04.29	01.05.29	0 dny	0 dny	Komplexní zkoušky technologie - část napájení, osvětlení, větrání - 19 zkoušek 01.04. 01.05.	
24		Komplexní zkoušky technologie - část komunikace, požární systémy - 34 zkoušek	30 dny	01.05.29	31.05.29	0 dny	0 dny	Komplexní zkoušky technologie - část komunikace, požární systémy - 34 zkoušek 01.05. 31.05.	
25		Komplexní zkoušky - výtahy, eskalátory - 4 zkoušky	60 dny	01.04.29	31.05.29	0 dny	0 dny	Komplexní zkoušky - výtahy, eskalátory - 4 zkoušky 01.04. 31.05.	
26		Komplexní zkoušky - čerpací stanice, tunelový vodovod - 4 zkoušky	60 dny	01.04.29	31.05.29	0 dny	0 dny	Komplexní zkoušky - čerpací stanice, tunelový vodovod - 4 zkoušky 01.04. 31.05.	
27		Komplexní zkoušky - část řízení a vazby - 4 zkoušky	60 dny	01.04.29	31.05.29	0 dny	0 dny	Komplexní zkoušky - část řízení a vazby - 4 zkoušky 01.04. 31.05.	
28		Vyhodnocení KZ, úpravy zařízení	15 dny	01.06.29	16.06.29	0 dny	0 dny	Vyhodnocení KZ, úpravy zařízení 01.06. 16.06.	
29		Technické prohlídky jednotlivých SO	60 dny	01.04.29	31.05.29	0 dny	0 dny	Technické prohlídky jednotlivých SO 01.04. 31.05.	
30		Zpracování DSPS, včetně dopadu z KZ	30 dny	17.05.29	16.06.29	0 dny	0 dny	Zpracování DSPS, včetně dopadu z KZ 17.05. 16.06.	
31		Přejímka technologie metra I.D	14 dny	16.06.29	30.06.29	0 dny	0 dny	Přejímka technologie metra I.D 16.06. 30.06.	
32		Zahájení ověřovacího provozu metra D	0 dny	01.07.29	01.07.29	0 dny	0 dny	Zahájení ověřovacího provozu metra D 01.07.	
33		Ověřovací provoz metra D	60 dny	01.07.29	30.08.29	0 dny	0 dny	Ověřovací provoz metra D 01.07. 30.08.	
34		Provoz s cestujícími	0 dny	29.09.29	29.09.29	0 dny	0 dny	Provoz s cestujícími 29.09.	
35		Rekonstrukce stanice metra C - Pankrác C	2667 dny	01.04.22	28.09.29	0 dny	1 den	Rekonstrukce stanice metra C - Pankrác C	
36		Stanice Pankrác C v "běžném provozu"	980 dny	01.04.22	05.01.25	1 den	1 den	Stanice Pankrác C v "běžném provozu" 01.04. 05.01.	
37		Ukončení provozu stanice Pankrác C k ukončení provozu dne 5.1.2025	0 dny	05.01.25	05.01.25	1 den	1 den	Ukončení provozu stanice Pankrác C k ukončení provozu dne 5.1.2025 05.01.	
38		Uzavření stanice Pankrác C pro cestující - vlaky pouze projíždí	349 dny	06.01.25	21.12.25	12 dny	12 dny	Uzavření stanice Pankrác C pro cestující - vlaky pouze projíždí 06.01. 21.12.	
39		Výluka provozu metra na lince C (realizace výhybky - spojka CD)	7 dny	29.06.24	06.07.24	0 dny	1861 dny	Výluka provozu metra na lince C (realizace výhybky - spojka CD) 29.06. 06.07.	
40		Harmonogram komplexních funkčních zkoušek a přejímek stanice Pankrác C	35 dny	16.11.25	21.12.25	1 den	1 den	Harmonogram komplexních funkčních zkoušek a přejímek stanice Pankrác C 35 dny	
41		Komplexní zkoušky technologie - část napájení, osvětlení, větrání - 1 zkouška	10 dny	16.11.25	26.11.25	1 den	1 den	Komplexní zkoušky technologie - část napájení, osvětlení, větrání - 1 zkouška 16.11. 26.11.	
42		Komplexní zkoušky technologie - část komunikace, požární systémy - 10 zkoušek	10 dny	26.11.25	06.12.25	1 den	1 den	Komplexní zkoušky technologie - část komunikace, požární systémy - 10 zkoušek 26.11. 06.12.	
43		Komplexní zkoušky - část řízení a vazby - 1 zkouška	20 dny	16.11.25	06.12.25	1 den	1 den	Komplexní zkoušky - část řízení a vazby - 1 zkouška 16.11. 06.12.	
44		Vyhodnocení KZ, úpravy zařízení	5 dny	06.12.25	11.12.25	1 den	1 den	Vyhodnocení KZ, úpravy zařízení 06.12. 11.12.	
45		Technické prohlídky jednotlivých SO	20 dny	16.11.25	06.12.25	1 den	1 den	Technické prohlídky jednotlivých SO 16.11. 06.12.	

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag

Úkol Rozdělení Milník Souhrnný Souhrn projektu Neaktivní úkol Neaktivní milník Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější úkoly Vnější milník Konečný termín Kritický Kritické rozdělení Průběh Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Režim úkol	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	Gantt chart timeline (2022-2030)											
46		Zpracování DSPS, včetně dopadu z KZ	10 dny	01.12.25	11.12.25	1 den	1 den	Zpracování DSPS, včetně dopadu z KZ 01.12. - 11.12.											
47		Přejímka technologie PNC	7 dny	11.12.25	18.12.25	1 den	1 den	Přejímka technologie PNC 11.12. - 18.12.											
48		Závěrečný úklid před zahájením provozu	2 dny	19.12.25	21.12.25	1 den	1 den	Závěrečný úklid před zahájením provozu 19.12. - 21.12.											
49		Obnovení provozu stanice Pankrác C od začátku provozu dne 22.12.2025	0 dny	22.12.25	22.12.25	1 den	1 den	Obnovení provozu stanice Pankrác C od začátku provozu dne 22.12.2025 22.12.											
50		Komplexní funkční zkoušky - hlavní větrání stanice Pankrác C - 1 zkouška	35 dny	09.06.26	14.07.26	2 dny	2 dny	Komplexní funkční zkoušky - hlavní větrání stanice Pankrác C - 1 zkouška 09.06. - 14.07.											
51		Stanice Pankrác C v "běžném provozu"	1336 dny	22.12.25	28.09.29	1 den	1 den	22.12. - 28.09. Stanice Pankrác C v "běžném provozu"											
52		Uzavírka ulice na Strži	2667 dny	01.04.22	28.09.29	1 den	1 den	01.04. - 28.09. Uzavírka ulice na Strži											
53		Ulice na Strži v provozu (lokální omezení dle jednotlivých DIO a DIR)	354 dny	01.04.22	31.03.23	1 den	1 den	01.04. - 31.03. Ulice na Strži v provozu (lokální omezení dle jednotlivých DIO a DIR)											
54		Přerušení provozu v ulici Na Strži / Zahájení úplné uzavírky	0 dny	01.04.23	01.04.23	1 den	1 den	01.04. Přerušení provozu v ulici Na Strži / Zahájení úplné uzavírky											
55		Úplná uzavírka ulice Na Strži	965 dny	01.04.23	11.12.25	1 den	1 den	01.04. - 11.12. Úplná uzavírka ulice Na Strži											
56		Obnovení provozu v ulici Na Strži	0 dny	11.12.25	11.12.25	1 den	1 den	11.12. Obnovení provozu v ulici Na Strži											
57		Ulice na Strži v provozu (lokální omezení dle jednotlivých DIO a DIR)	1346 dny	12.12.25	28.09.29	1 den	1 den	12.12. - 28.09. Ulice na Strži v provozu (lokální omezení dle jednotlivých DIO a DIR)											
58	SOD 11	STANICE PANKRÁC D	2667 dny	01.04.22	28.09.29	0 dny	1 den	01.04. - 28.09. STANICE PANKRÁC D											
59	SO 11-01	Příprava území	60 dny	01.04.22	31.05.22	17 dny	17 dny	01.04. - 31.05. Příprava území											
60	SO 11-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	20 dny	14.04.22	04.05.22	1 den	1 den	14.04. - 04.05. Vjezdy a výjezdy na staveniště											
61		Přípojky ZS	2604 dny	04.05.22	29.08.29	0 dny	31 dny	04.05. - 29.08. Přípojky ZS											
62	SO 11-03/10	Vodovodní přípojka staveniště PAD1-sever-rušení	30 dny	30.07.29	29.08.29	31 dny	31 dny	30.07. - 29.08. Vodovodní přípojka staveniště PAD1-sever-rušení											
63	SO 11-03/20	Vodovodní přípojka staveniště PAD2	30 dny	29.08.22	28.09.22	50 dny	50 dny	29.08. - 28.09. Vodovodní přípojka staveniště PAD2											
64	SO 11-03/30	Vodovodní přípojka staveniště PAD4-rušení	30 dny	30.07.29	29.08.29	31 dny	31 dny	30.07. - 29.08. Vodovodní přípojka staveniště PAD4-rušení											
65	SO 11-04/10	Kanalizační přípojka staveniště PAD1-sever-rušení	30 dny	30.07.29	29.08.29	31 dny	31 dny	30.07. - 29.08. Kanalizační přípojka staveniště PAD1-sever-rušení											
66	SO 11-04/20	Kanalizační přípojka staveniště PAD2	30 dny	29.08.22	28.09.22	50 dny	50 dny	29.08. - 28.09. Kanalizační přípojka staveniště PAD2											
67	SO 11-04/30	Kanalizační přípojka staveniště PAD4-rušení	30 dny	30.07.29	29.08.29	31 dny	31 dny	30.07. - 29.08. Kanalizační přípojka staveniště PAD4-rušení											
68	SO 11-06/10	El. přípojka VN staveniště PAD1 - 1.et.	2 dny	29.08.22	31.08.22	131 dny	131 dny	29.08. - 31.08. El. přípojka VN staveniště PAD1 - 1.et.											
69	SO 11-06/20	El. přípojka VN staveniště PAD2	93 dny	29.08.22	30.11.22	17 dny	17 dny	29.08. - 30.11. El. přípojka VN staveniště PAD2											
70	SO 11-06/20D	El. přípojka VN staveniště PAD2 - rušení	30 dny	30.07.29	29.08.29	31 dny	31 dny	30.07. - 29.08. El. přípojka VN staveniště PAD2 - rušení											
71	SO 11-06/30	El. přípojka NN staveniště PAD3	30 dny	04.05.22	03.06.22	2486 dny	2486 dny	04.05. - 03.06. El. přípojka NN staveniště PAD3											
72	SO 11-06/40	El. Přípojka VN staveniště PAD4 - rušení	30 dny	30.07.29	29.08.29	31 dny	31 dny	30.07. - 29.08. El. Přípojka VN staveniště PAD4 - rušení											
73	SO 11-08	Ochrana pěših provozu	2575 dny	04.05.22	31.07.29	60 dny	60 dny	04.05. - 31.07. Ochrana pěših provozu											
74	SO 11-09	Ochrana inž. sítí	2575 dny	04.05.22	31.07.29	60 dny	60 dny	04.05. - 31.07. Ochrana inž. sítí											
75	SO 11-10	Demolice	1742 dny	04.05.22	31.03.27	795 dny	795 dny	04.05. - 31.03. Demolice											
76	SO 11-12	Drobná architektura	120 dny	01.04.29	30.07.29	61 dny	61 dny	01.04. - 30.07. Drobná architektura											
77	SO 11-13	Demontážní komora	1843 dny	24.01.24	31.03.29	1 den	182 dny	24.01. - 31.03. Demontážní komora											
78		Ražba a primární ostění	27 dny	24.01.24	20.02.24	1 den	1 den	24.01. - 20.02. Ražba a primární ostění											
79		Sekundární ostění - dno	30 dny	15.05.24	14.06.24	1883 dny	1883 dny	15.05. - 14.06. Sekundární ostění - dno											
80		Sekundární ostění - klenba	90 dny	10.11.25	18.02.26	1 den	1 den	10.11. - 18.02. Sekundární ostění - klenba											
81		Dopravní cesta pro zásobování stanice	379 dny	18.02.26	14.03.27	1 den	1 den	18.02. - 14.03. Dopravní cesta pro zásobování stanice											
82		Vnitřní nosné konstrukce	90 dny	29.07.27	27.10.27	1 den	1 den	29.07. - 27.10. Vnitřní nosné konstrukce											
83		HSV + PSV práce pro montáž TG	91 dny	22.09.27	22.12.27	1 den	1 den	22.09. - 22.12. HSV + PSV práce pro montáž TG											
84		Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	62 dny	62 dny	02.01. - 22.12. Ostatní HSV + PSV práce											
85		Kabelové konstrukce	60 dny	23.10.27	22.12.27	1 den	1 den	23.10. - 22.12. Kabelové konstrukce											
86		Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	62 dny	62 dny	02.01. - 31.03. Dokončovací práce po TG											
87	SO 11-14	Přístupová a VZT štol	2432 dny	25.05.22	31.03.29	0 dny	62 dny	25.05. - 31.03. Přístupová a VZT štol											
88		Mobilizace ražeb NRTM	18 dny	25.05.22	12.06.22	1 den	1 den	25.05. - 12.06. Mobilizace ražeb NRTM											
89		MP deštník	7 dny	13.06.22	20.06.22	1 den	1 den	13.06. - 20.06. MP deštník											
90		Ražba a primární ostění	202 dny	20.06.22	18.01.23	1 den	1 den	20.06. - 18.01. Ražba a primární ostění											

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag

Úkol	Sochmý	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník	Kritické rozdělení
Rozdělení	Sochm projekt	Neaktivní sochm	Ruční úkoly zahrnuté v sochmém úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín	Průběh
Milník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční sochm	Vnější úkoly	Kritický	Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Režim úkol	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	
91		Prorážka do demontážní komory	10 dny	21.02.24	02.03.24	1 den	1 den	Prorážka do demontážní komory 21.02. 02.03.
92		Sekundární ostění - Přístupová štola	180 dny	13.04.27	10.10.27	1 den	1 den	Sekundární ostění - Přístupová štola 13.04. 10.10.
93		Vnitřní nosné konstrukce	89 dny	11.08.27	08.11.27	1 den	1 den	Vnitřní nosné konstrukce 11.08. 08.11.
94		HSV + PSV práce pro montáž TG	91 dny	21.09.27	21.12.27	1 den	1 den	HSV + PSV práce pro montáž TG 21.09. 21.12.
95		Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	62 dny	62 dny	Ostatní HSV + PSV práce 02.01. 22.12.
96		Kabelové konstrukce	60 dny	23.10.27	22.12.27	1 den	1 den	Kabelové konstrukce 23.10. 22.12.
97		Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	62 dny	62 dny	Dokončovací práce po TG 02.01. 31.03.
98	SO 11-15	Technologický tunel - sever	2204 dny	18.01.23	31.03.29	1 den	62 dny	Technologický tunel - sever 2204 dny
99		Ražba a primární ostění	135 dny	18.01.23	02.06.23	1 den	1 den	Ražba a primární ostění 18.01. 02.06.
100		Ražba a primární ostění - blok Sever - dno + propojka	45 dny	14.10.24	28.11.24	1 den	1 den	Ražba a primární ostění - blok Sever - dno + propojka 14.10. 28.11.
101		Sekundární ostění	200 dny	28.11.24	26.06.25	21 dny	21 dny	Sekundární ostění 28.11. 26.06.
102		Sekundární ostění VZT propojek	170 dny	07.01.25	26.06.25	21 dny	21 dny	Sekundární ostění VZT propojek 07.01. 26.06.
103		Vnitřní nosné konstrukce - mezistrop	120 dny	18.03.25	16.07.25	1 den	1 den	Vnitřní nosné konstrukce - mezistrop 18.03. 16.07.
104		Dopravní cesta pro zásobování stanice	479 dny	16.07.25	17.11.26	1 den	1 den	Dopravní cesta pro zásobování stanice 16.07. 17.11.
105		Vnitřní nosné konstrukce - dokončení	100 dny	17.11.26	07.03.27	1 den	1 den	Vnitřní nosné konstrukce - dokončení 17.11. 07.03.
106		HSV + PSV práce pro montáž TG	290 dny	07.03.27	22.12.27	1 den	1 den	HSV + PSV práce pro montáž TG 07.03. 22.12.
107		Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	62 dny	62 dny	Ostatní HSV + PSV práce 02.01. 22.12.
108		Kabelové konstrukce	110 dny	03.09.27	22.12.27	1 den	1 den	Kabelové konstrukce 03.09. 22.12.
109		Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	62 dny	62 dny	Dokončovací práce po TG 02.01. 31.03.
110	SO 11-17	Sdružená šachta hlavního větrání a vstupu 22 kV	728 dny	14.03.27	31.03.29	1 den	62 dny	Sdružená šachta hlavního větrání a vstupu 22 kV 728 dny
111		Nosné konstrukce - dno šachty	60 dny	14.03.27	13.05.27	1 den	1 den	Nosné konstrukce - dno šachty 14.03. 13.05.
112		Nosné konstrukce - stěny	120 dny	01.05.27	29.08.27	1 den	1 den	Nosné konstrukce - stěny 01.05. 29.08.
113		Vnitřní nosné konstrukce	120 dny	10.06.27	08.10.27	1 den	1 den	Vnitřní nosné konstrukce 10.06. 08.10.
114		HSV + PSV práce pro montáž TG	120 dny	24.08.27	22.12.27	1 den	1 den	HSV + PSV práce pro montáž TG 24.08. 22.12.
115		Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	62 dny	62 dny	Ostatní HSV + PSV práce 02.01. 22.12.
116		Kabelové konstrukce	90 dny	23.09.27	22.12.27	1 den	1 den	Kabelové konstrukce 23.09. 22.12.
117		Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	62 dny	62 dny	Dokončovací práce po TG 02.01. 31.03.
118		Zásobovací otvor	310 dny	08.10.27	23.08.28	62 dny	62 dny	Zásobovací otvor 08.10. 23.08.
119	SO 11-18	Povrchový kiosek hlavního větrání	120 dny	24.08.28	22.12.28	62 dny	62 dny	Povrchový kiosek hlavního větrání 24.08. 22.12.
120	SO 11-19	VZT vrty	60 dny	30.03.26	29.05.26	130 dny	130 dny	VZT vrty 30.03. 29.05.
121	SO 11-20	Stanice Pankrác D	2560 dny	18.04.22	30.06.29	0 dny	91 dny	Stanice Pankrác D 2560 dny
122		Ražba a primární ostění z VO-OL	929 dny	18.04.22	22.11.24	0 dny	0 dny	Ražba a primární ostění z VO-OL 929 dny
123		Patní štola ražená z VO-OL	231 dny	23.06.22	19.02.23	0 dny	0 dny	Patní štola ražená z VO-OL 23.06. 19.02.
124		Injektáže stanice Pankrác	372 dny	18.04.22	05.05.23	0 dny	0 dny	Injektáže stanice Pankrác 372 dny
125		Injektáž stanice Pankrác z přestupní chodby (PAD 63 4)	18.04.22	20.06.22	0 dny	0 dny	0 dny	Injektáž stanice Pankrác z přestupní chodby (PAD 4) 18.04. 20.06.
126		Injektáž stanice Pankrác z patní štoly (VO-OL)	68 dny	26.02.23	05.05.23	0 dny	0 dny	Injektáž stanice Pankrác z patní štoly (VO-OL) 26.02. 05.05.
127		Ražba a primární ostění z PAD 4	547 dny	15.05.23	22.11.24	0 dny	0 dny	Ražba a primární ostění z PAD 4 547 dny
128		Pravý dílčí výrub - kalota	205 dny	15.05.23	06.12.23	0 dny	0 dny	Pravý dílčí výrub - kalota 15.05. 06.12.
129		Levý dílčí výrub - zarážka kaloty	33 dny	07.12.23	19.01.24	0 dny	0 dny	Levý dílčí výrub - zarážka kaloty 07.12. 19.01.
130		Pravý dílčí výrub - opěť u ET Gemini	50 dny	20.01.24	10.03.24	0 dny	0 dny	Pravý dílčí výrub - opěť u ET Gemini 20.01. 10.03.
131		Levý dílčí výrub - kalota	235 dny	11.03.24	01.11.24	0 dny	0 dny	Levý dílčí výrub - kalota 11.03. 01.11.
132		Ražba propojky mezi LDV a PDV	20 dny	02.11.24	22.11.24	0 dny	0 dny	Ražba propojky mezi LDV a PDV 02.11. 22.11.
133		Ražba a primární ostění z PAD 1b	448 dny	17.12.24	30.03.26	0 dny	0 dny	Ražba a primární ostění z PAD 1b 448 dny
134		Pravý dílčí výrub	317 dny	18.01.25	01.12.25	0 dny	0 dny	Pravý dílčí výrub 18.01. 01.12.
135		Doražba kaloty PDV z Pad1b	22 dny	18.01.25	09.02.25	0 dny	0 dny	Doražba kaloty PDV z Pad1b 18.01. 09.02.

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag


Úkol	Sochmý	Neaktivní mílník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější mílník	Kritické rozdělení
Rozdělení	Sochm projekt	Neaktivní sochm	Ruční úkoly zahrnuté v sochmém úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín	Průběh
Mílník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční sochm	Vnější úkoly	Kritický	Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 3

Sjízdnosti kolejeového svršku - termín bude upřesněn po koordinaci se stavbou LD1b
Tento HMG platí za předpokladu dodržení předpokládaného postupu prací ze ZD stavby LD1b (Olbrachtova) mimo - Nové Dvory aktualizace z 03/2022

ID	Režim úkol	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	
136		Ražba opěří a dna PDV z Pad1b - 85 bm	110 dny	11.03.25	29.06.25	0 dny	0 dny	Ražba opěří a dna PDV z Pad1b - 85 bm 11.03. 29.06.
137		Doražba opěří a dna PDV z PADb1b - 45bm	60 dny	02.10.25	01.12.25	0 dny	0 dny	Doražba opěří a dna PDV z PADb1b - 45bm 02.10. 01.12.
138		Levý dílčí výrub stanice	324 dny	17.12.24	16.11.25	0 dny	0 dny	Levý dílčí výrub stanice 324 dny
139		Doražba kaloty LDV z Pad1b	22 dny	17.12.24	18.01.25	0 dny	0 dny	Doražba kaloty LDV z Pad1b 17.12. 18.01.
140		Ražba opěří a dna LDV z Pad1b - 85 bm	110 dny	09.02.25	30.05.25	0 dny	0 dny	Ražba opěří a dna LDV z Pad1b - 85 bm 09.02. 30.05.
141		Doražba opěří a dna LDV z PADb1b - 45bm	60 dny	17.09.25	16.11.25	0 dny	0 dny	Doražba opěří a dna LDV z PADb1b - 45bm 17.09. 16.11.
142		Ražba SDV směr OL - 80 bm	80 dny	29.06.25	17.09.25	0 dny	0 dny	Ražba SDV směr OL - 80 bm 29.06. 17.09.
143		Ražba SDV směr NBS - 50 bm	60 dny	01.12.25	09.02.26	0 dny	0 dny	Ražba SDV směr NBS - 50 bm 01.12. 09.02.
144		Prohloubená spodní klenba stanice	14 dny	16.03.26	30.03.26	0 dny	0 dny	Prohloubená spodní klenba stanice 16.03. 30.03.
145		Sekundární ostění stanice	260 dny	17.06.26	14.03.27	0 dny	0 dny	17.06. Sekundární ostění stanice 14.03.
146		Vnitřní nosné konstrukce	210 dny	04.12.26	12.07.27	0 dny	0 dny	04.12. Vnitřní nosné konstrukce 12.07.
147		HSV + PSV práce pro montáž TG	270 dny	27.03.27	22.12.27	0 dny	0 dny	27.03. HSV + PSV práce pro montáž TG 22.12.
148		Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	0 dny	0 dny	02.01. Ostatní HSV + PSV práce 22.12.
149		Kabelové konstrukce	120 dny	24.08.27	22.12.27	0 dny	0 dny	24.08. Kabelové konstrukce 22.12.
150		Architektura	355 dny	02.01.28	22.12.28	0 dny	0 dny	02.01. Architektura 22.12.
151		Dokončovací práce po TG	89 dny	02.01.29	01.04.29	0 dny	0 dny	Dokončovací práce po TG 02.01. 01.04.
152		Dokončovací práce Architektura	179 dny	02.01.29	30.06.29	91 dny	91 dny	Dokončovací práce Architektura 02.01. 30.06.
153	SO 11-21	Vestibul Arkády	2084 dny	17.08.23	30.06.29	1 den	91 dny	Vestibul Arkády 2084 dny
154		Zajištění stavební jámy - zakládání + Zemní práce	201 dny	17.08.23	15.03.24	1 den	1 den	Zajištění stavební jámy - zakládání + Zemní práce 17.08. 15.03.
155		Nosné konstrukce vestibulu - mimo prostor pro práce v ET	240 dny	16.03.24	11.11.24	1 den	1 den	Nosné konstrukce vestibulu - mimo prostor pro práce v ET 16.03. 11.11.
156		Zásyp I.etapy	60 dny	11.11.24	20.01.25	1 den	1 den	Zásyp I.etapy 11.11. 20.01.
157		Zásobovací otvor	395 dny	20.01.25	01.03.26	1 den	1 den	20.01. Zásobovací otvor 01.03.
158		Nosné konstrukce vestibulu - dokončení u ET	190 dny	01.03.26	07.09.26	1 den	1 den	Nosné konstrukce vestibulu - dokončení u ET 01.03. 07.09.
159		Zásypy II.etapy	90 dny	07.09.26	06.12.26	1 den	1 den	Zásypy II.etapy 07.09. 06.12.
160		HSV + PSV práce pro montáž TG	243 dny	07.12.26	17.08.27	1 den	1 den	07.12. HSV + PSV práce pro montáž TG 17.08.
161		Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny	02.01. Ostatní HSV + PSV práce 22.12.
162		Kabelové konstrukce	90 dny	18.08.27	16.11.27	91 dny	91 dny	18.08. Kabelové konstrukce 16.11.
163		Architektura	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny	02.01. Architektura 22.12.
164		Dokončovací práce po TG	89 dny	02.01.29	01.04.29	181 dny	181 dny	Dokončovací práce po TG 02.01. 01.04.
165		Dokončovací práce Architektura	179 dny	02.01.29	30.06.29	91 dny	91 dny	Dokončovací práce Architektura 02.01. 30.06.
166	SO 11-22	Vestibul Gemini	1215 dny	01.02.26	30.06.29	91 dny	91 dny	Vestibul Gemini 1215 dny
167		Vnitřní nosné konstrukce	210 dny	01.02.26	30.08.26	91 dny	91 dny	01.02. Vnitřní nosné konstrukce 30.08.
168		HSV + PSV práce pro montáž TG	95 dny	17.08.27	20.11.27	1 den	1 den	17.08. HSV + PSV práce pro montáž TG 20.11.
169		Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny	02.01. Ostatní HSV + PSV práce 22.12.
170		Kabelové konstrukce	65 dny	18.10.27	22.12.27	1 den	1 den	18.10. Kabelové konstrukce 22.12.
171		Architektura	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny	02.01. Architektura 22.12.
172		Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	91 dny	91 dny	Dokončovací práce po TG 02.01. 31.03.
173		Dokončovací práce Architektura	90 dny	01.04.29	30.06.29	91 dny	91 dny	Dokončovací práce Architektura 01.04. 30.06.
174	SO 11-23	Eska. tunel a přestupní chodba - Arkády	1882 dny	16.03.24	30.06.29	230 dny	91 dny	Eska. tunel a přestupní chodba - Arkády 1882 dny
175		Výplňový beton přestupní chodby (vně ostění LST a PST)	45 dny	01.11.24	16.12.24	0 dny	0 dny	Výplňový beton přestupní chodby (vně ostění LST a PST) 01.11. 16.12.
176		Ražba a primární ostění ET Arkády	180 dny	16.03.24	12.09.24	251 dny	251 dny	Ražba a primární ostění ET Arkády 16.03. 12.09.
177		Sekundární ostění ET Arkády	265 dny	12.09.24	14.06.25	251 dny	251 dny	12.09. Sekundární ostění ET Arkády 14.06.
178		Doražba přestupní chodby (směr Pošta + Arkády)	75 dny	01.12.25	24.02.26	0 dny	0 dny	Doražba přestupní chodby (směr Pošta + Arkády) 01.12. 24.02.
179		Sekundární ostění přestupní chodby	205 dny	05.10.26	08.05.27	1 den	1 den	05.10. Sekundární ostění přestupní chodby 08.05.
180		Vnitřní nosné konstrukce	209 dny	21.02.27	18.09.27	1 den	1 den	21.02. Vnitřní nosné konstrukce 18.09.

ID	Režim	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení		
181			HSV + PSV práce pro montáž TG	155 dny	20.07.27	22.12.27	1 den	1 den		
182			Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny		
183			Kabelové konstrukce	65 dny	18.10.27	22.12.27	1 den	1 den		
184			Architektura	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny		
185			Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	91 dny	91 dny		
186			Dokončovací práce Architektura	90 dny	01.04.29	30.06.29	91 dny	91 dny		
187	SO 11-24		Eska. tunel a přestupní chodba - Gemini	1895 dny	03.03.24	30.06.29	1 den	91 dny		
188			Ražba a primární ostění	285 dny	03.03.24	13.12.24	1 den	1 den		
189			Přístupová chodba vč.montáže plošiny	75 dny	03.03.24	17.05.24	1 den	1 den		
190			Ražba ET	210 dny	17.05.24	13.12.24	1 den	1 den		
191			Sekundární ostění	235 dny	13.12.24	15.08.25	8 dny	8 dny		
192			Vnitřní nosné konstrukce	120 dny	01.02.26	01.06.26	241 dny	241 dny		
193			HSV + PSV práce pro montáž TG	170 dny	29.10.26	27.04.27	91 dny	91 dny		
194			Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny		
195			Kabelové konstrukce	80 dny	27.04.27	16.07.27	91 dny	91 dny		
196			Architektura	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny		
197			Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	91 dny	91 dny		
198			Dokončovací práce Architektura	90 dny	01.04.29	30.06.29	91 dny	91 dny		
199	SO 11-25		Eska. tunel a přestupní chodba - PN	1820 dny	17.05.24	30.06.29	68 dny	91 dny		
200			Ražba a primární ostění	1820 dny	17.05.24	30.06.29	68 dny	91 dny		
201			Ražba a primární ostění - chodba C	60 dny	17.05.24	16.07.24	68 dny	68 dny		
202			Zajištění stability čelby ET C (sepnutí s SO 11-26)	10 dny	16.07.24	26.07.24	68 dny	68 dny		
203			Ražba a primární ostění - ET C	30 dny	30.09.24	30.10.24	2 dny	2 dny		
204			Sekundární ostění - chodba ET C	100 dny	30.10.24	17.02.25	2 dny	2 dny		
205			Sekundární ostění - ET C	100 dny	18.01.25	28.04.25	2 dny	2 dny		
206			Vnitřní nosné konstrukce	121 dny	21.02.27	22.06.27	1 den	1 den		
207			HSV + PSV práce pro montáž TG	224 dny	12.05.27	22.12.27	1 den	1 den		
208			Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny		
209			Kabelové konstrukce	104 dny	09.09.27	22.12.27	1 den	1 den		
210			Architektura	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny		
211			Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	91 dny	91 dny		
212			Dokončovací práce Architektura	90 dny	01.04.29	30.06.29	91 dny	91 dny		
213	SO 11-26		Úpravy stanice PN pro napojení eska. tunelu	2523 dny	25.05.22	30.06.29	1 den	91 dny		
214			Zakládání - jáma C - I.etapa	15 dny	25.05.22	09.06.22	1 den	1 den		
215			Zakládání - jáma C - II.etapa (dokončení) + Zemní práce	266 dny	08.01.24	30.09.24	2 dny	2 dny		
216			Nosné konstrukce přestupu C-D	225 dny	01.04.25	12.11.25	2 dny	2 dny		
217			Zásypy - jáma C - I.etapa	225 dny	15.07.25	07.03.26	227 dny	227 dny		
218			Zásobovací otvor	420 dny	12.11.25	26.01.27	122 dny	122 dny		
219			Zásypy - jáma C - II.etapa	90 dny	05.07.26	03.10.26	227 dny	227 dny		
220			Dokončení nosných konstrukcí	65 dny	26.01.27	01.04.27	122 dny	122 dny		
221			Zásypy - jáma C - III.etapa	150 dny	01.04.27	29.08.27	122 dny	122 dny		
222			HSV + PSV práce pro montáž TG	224 dny	12.05.27	22.12.27	91 dny	91 dny		
223			Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny		
224			Kabelové konstrukce	104 dny	09.09.27	22.12.27	91 dny	91 dny		
225			Architektura	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny		

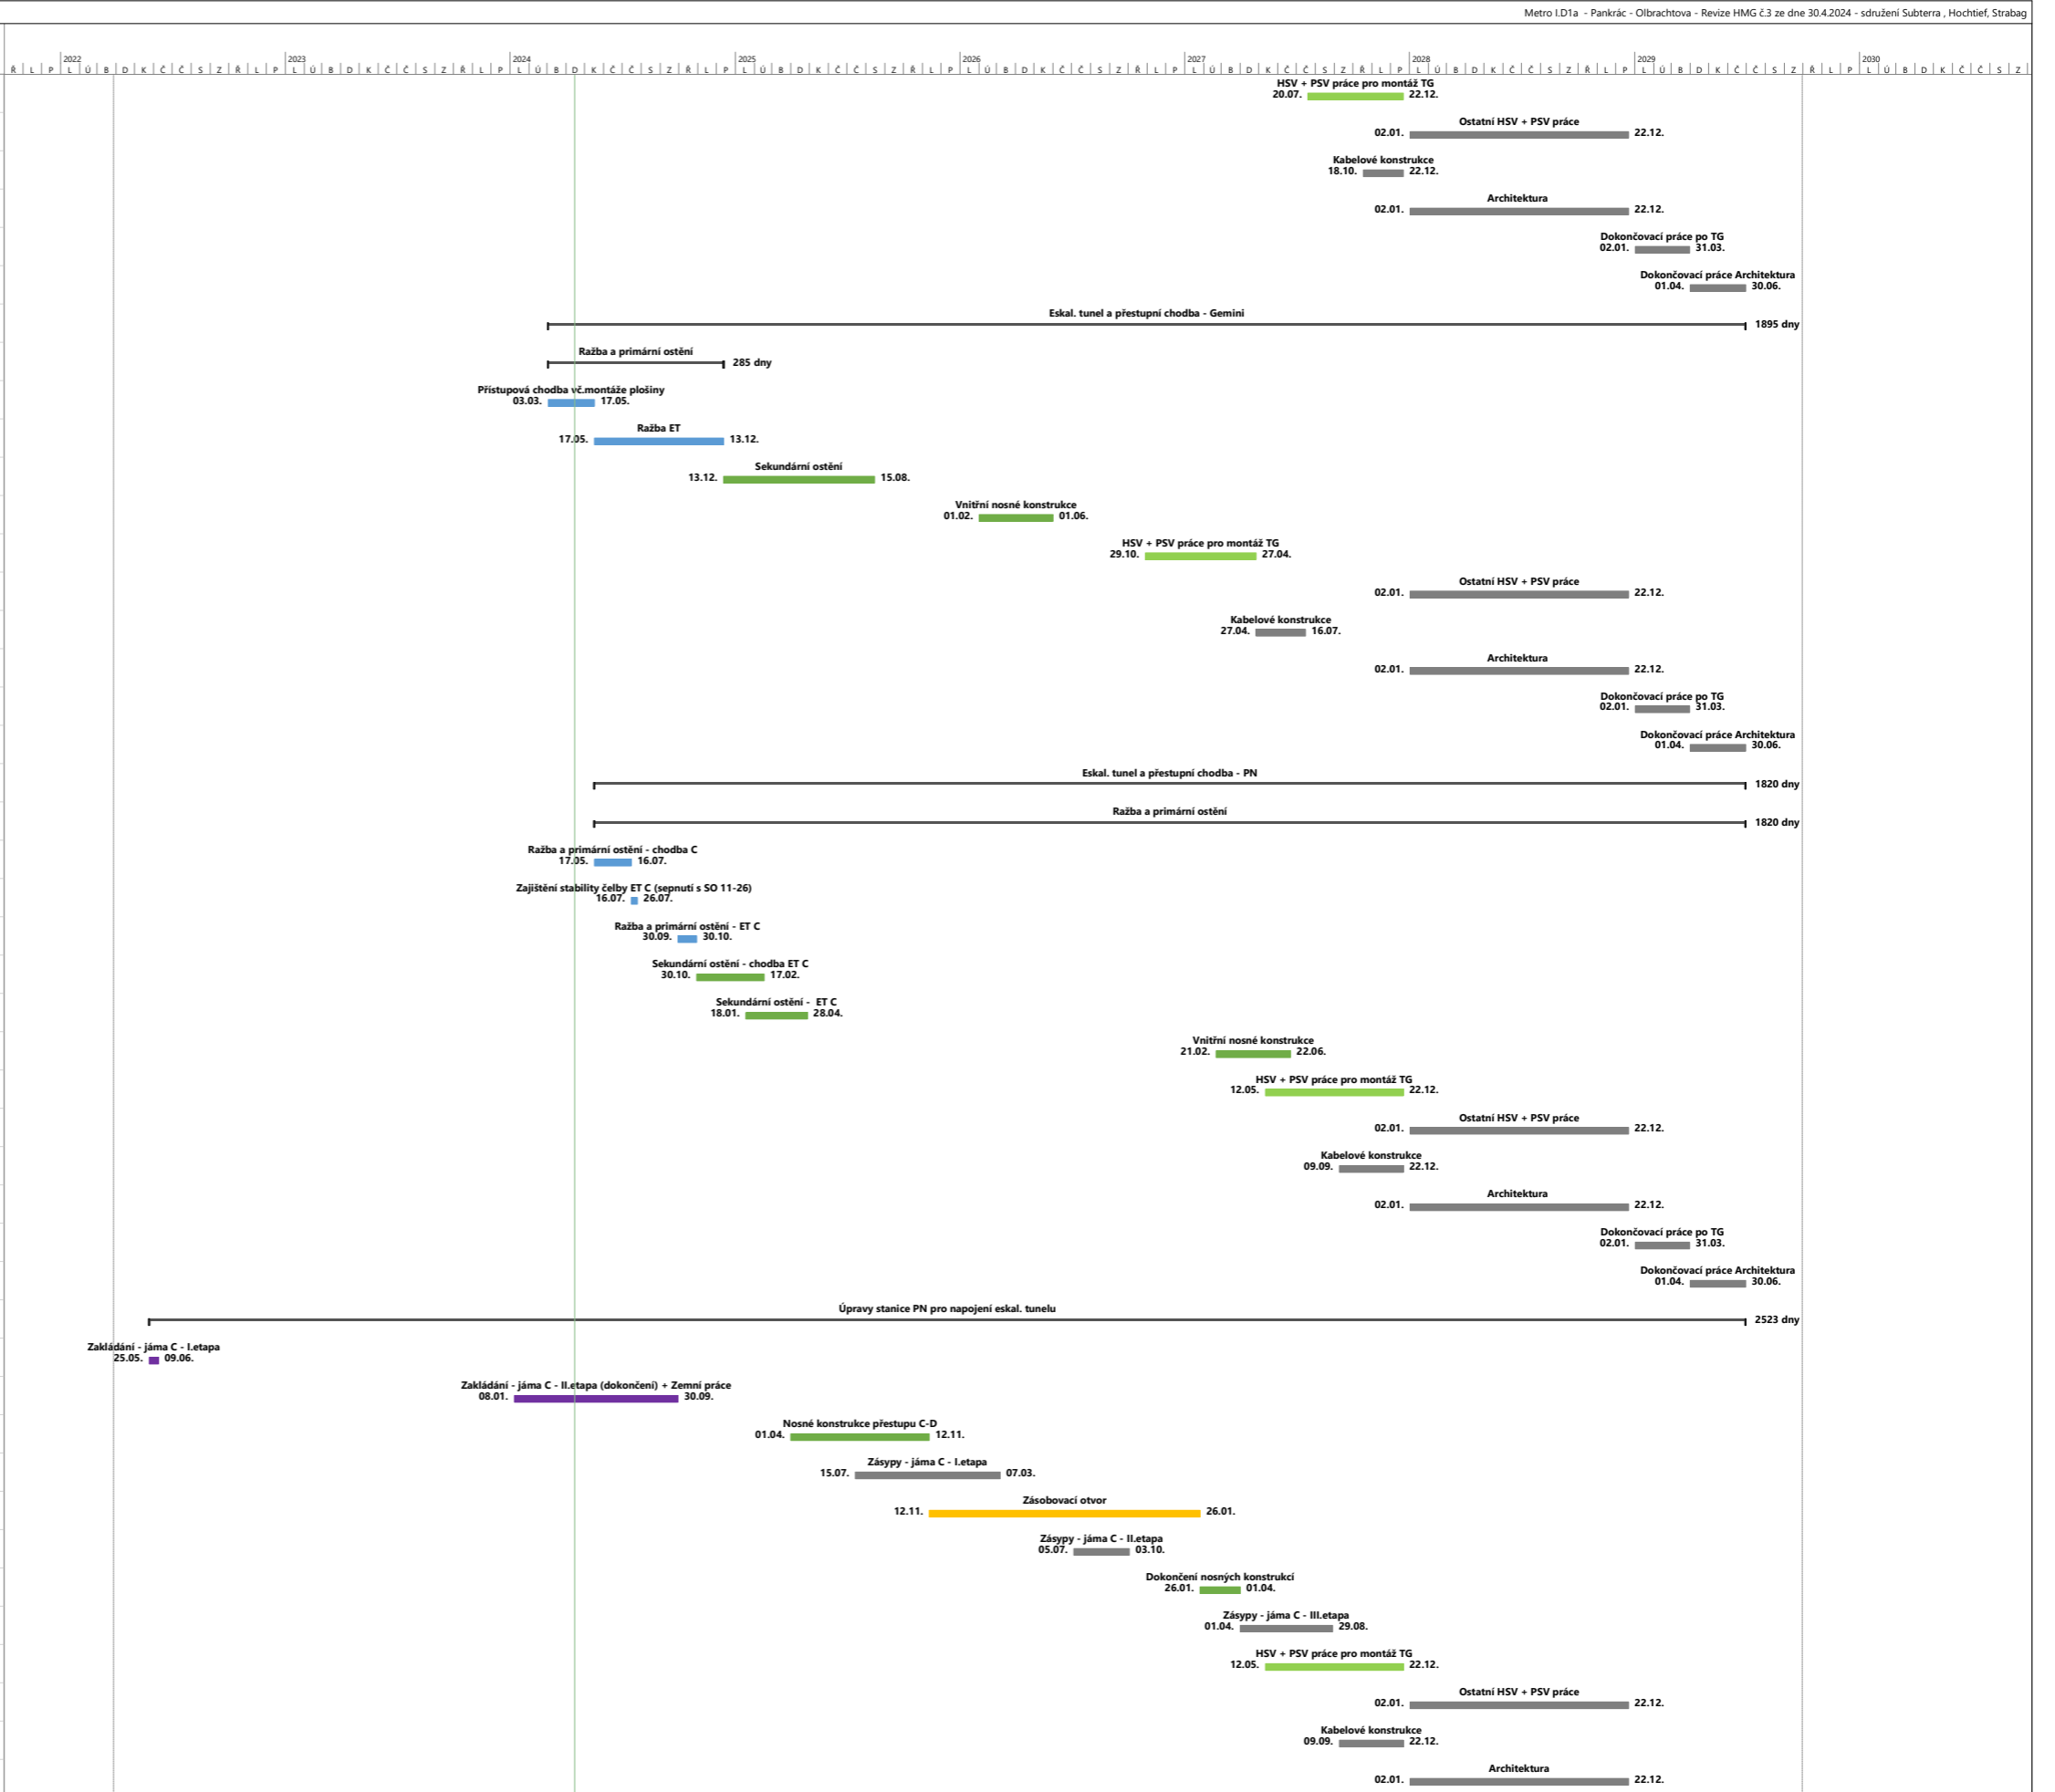

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag

Úkol
Rozdělení
Mílník

Sochmý
Souhřm projektu
Neaktivní úkol

Neaktivní mílník
Neaktivní souhřm
Ruční úkol

Pouze s dobou trvání
Ruční úkol zahrnuté v souhřmém úkolu
Ruční souhřm

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Vnější úkoly


Vnější mílník
Konečný termín
Kritický

Kritické rozdělení
Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 5

Sjzdnosti kolejeového svřřku - termín bude upřesněn po koordinaci se stavbou LD1b
Tento HMG platí za předpokladu dodoržení předpokladaného postupu prací ze ZD stavby LD1b (Olbrachtova) mimo - Nové Dvory aktualizace z 03/2022

ID	Režim úkolů	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení
226		Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	91 dny	91 dny
227		Dokončovací práce Architektura	90 dny	01.04.29	30.06.29	91 dny	91 dny
228	SO 11-27	Úpravy stanice a vestibulu PN	529 dny	06.06.24	27.11.25	13 dny	1362 dny
229		Demolice žlb.konstrukcí trojtraktu v jámě SO 11-26	75 dny	06.06.24	20.08.24	13 dny	13 dny
230		Demontážní a demolice kce ve stanici Pankrác C	120 dny	06.01.25	06.05.25	1 den	1 den
231		HSV + PSV práce, architektura	205 dny	07.03.25	28.09.25	1 den	1 den
232		Dokončovací práce	90 dny	29.08.25	27.11.25	1362 dny	1362 dny
233	SO 11-28	Obrátové koleje - směr NS	1416 dny	02.06.23	28.05.27	1 den	58 dny
234		Ražba a primární ostění	825 dny	02.06.23	24.09.25	1 den	8 dny
235		Ražba DKT směr Pankrác	72 dny	02.06.23	13.08.23	1 den	1 den
236		Ražba LDV - zvětšený profil na hranu stanice	36 dny	14.08.23	19.09.23	1 den	1 den
237		Ražba provizorní přístupové štoly pro ražbu ET Geminy	22 dny	19.09.23	11.10.23	1 den	1 den
238		Zaplavení provizorní přístupové štoly	25 dny	31.07.25	25.08.25	8 dny	8 dny
239		Ražba PDV - zvětšený profil na hranu stanice	30 dny	25.08.25	24.09.25	8 dny	8 dny
240		Ražba DKT směr Demontážní komora	153 dny	14.08.23	24.01.24	1 den	1 den
241		Sekundární ostění	930 dny	01.12.23	18.07.26	1 den	0 dny
242		Sekundární ostění - dno	156 dny	01.12.23	15.05.24	1 den	1 den
243		Sekundární ostění - klenba	220 dny	01.10.24	19.05.25	1 den	1 den
244		Sekundární ostění - dokončení u stanice	110 dny	30.03.26	18.07.26	0 dny	0 dny
245		Vnitřní nosné konstrukce	120 dny	18.07.26	15.11.26	182 dny	182 dny
246		Kabelové konstrukce	60 dny	29.03.27	28.05.27	58 dny	58 dny
247	SO 11-29	Staniční tunel OL	708 dny	29.06.25	27.06.27	230 dny	805 dny
248		Výplňový beton úpadnice pod tunely "C"	90 dny	29.06.25	27.09.25	1423 dny	1423 dny
249		Ražba a primární ostění ze stanice - podchod trasy C	35 dny	24.02.26	31.03.26	0 dny	0 dny
250		Sekundární ostění	140 dny	30.10.26	29.03.27	58 dny	58 dny
251		Kabelové konstrukce	30 dny	28.05.27	27.06.27	58 dny	58 dny
252	SO 11-30	Zajištění mostu ulicí S.května	149 dny	04.05.22	30.09.22	2486 dny	2486 dny
253							
254		SSZ	2595 dny	14.04.22	31.07.29	60 dny	60 dny
255	SO 11-31/20	Provizorní SSZ 4.415 Budějovická - Na Strži a SSZ na objízdných trasách	2595 dny	14.04.22	31.07.29	60 dny	60 dny
256	SO 11-31/60	Provizorní koordinační kabel SSZ 4.415 Budějovická - Na Strži	2595 dny	14.04.22	31.07.29	60 dny	60 dny
257	SO 11-32/20	Provizorní SSZ Na Pankráci - přechod	2588 dny	21.04.22	31.07.29	60 dny	60 dny
258	SO 11-32/60	Provizorní koordinační kabel SSZ Na Pankráci - přechod	2588 dny	21.04.22	31.07.29	60 dny	60 dny
259	SO 11-33/20	Provizorní SSZ 4.430 Na Pankráci - Hvězdova	55 dny	27.06.22	21.08.22	2526 dny	2526 dny
260	SO 11-33/60	Provizorní koordinační kabel SSZ 4.430 Na Pankráci - Hvězdova	55 dny	27.06.22	21.08.22	2526 dny	2526 dny
261		Komunikace	2595 dny	14.04.22	31.07.29	0 dny	60 dny
262	SO 11-40	Provizorní dopravní značení	2555 dny	14.04.22	21.06.29	100 dny	100 dny
263	SO 11-41	Provizorní komunikace	553 dny	16.05.22	30.11.23	0 dny	2070 dny
264		1.etapa	70 dny	16.05.22	25.07.22	24 dny	24 dny
265		2.etapa	60 dny	01.10.23	30.11.23	2070 dny	2070 dny
266	SO 11-43	Definitivní obnova povrchů po stavbě - ZS-PAD3	58 dny	30.05.29	27.07.29	64 dny	64 dny
267	SO 11-44	Definitivní obnova povrchů po stavbě - ZS-PAD4	62 dny	30.05.29	31.07.29	60 dny	60 dny
268	SO 11-45	Definitivní úpravy chodníků po stavbě	69 dny	22.03.29	30.05.29	60 dny	60 dny
269	SO 11-48	Příjezdová komunikace k větrací šachtě	20 dny	30.05.29	19.06.29	102 dny	102 dny
270	SO 11-49	Informační systém	1181 dny	29.08.25	22.12.28	1097 dny	271 dny

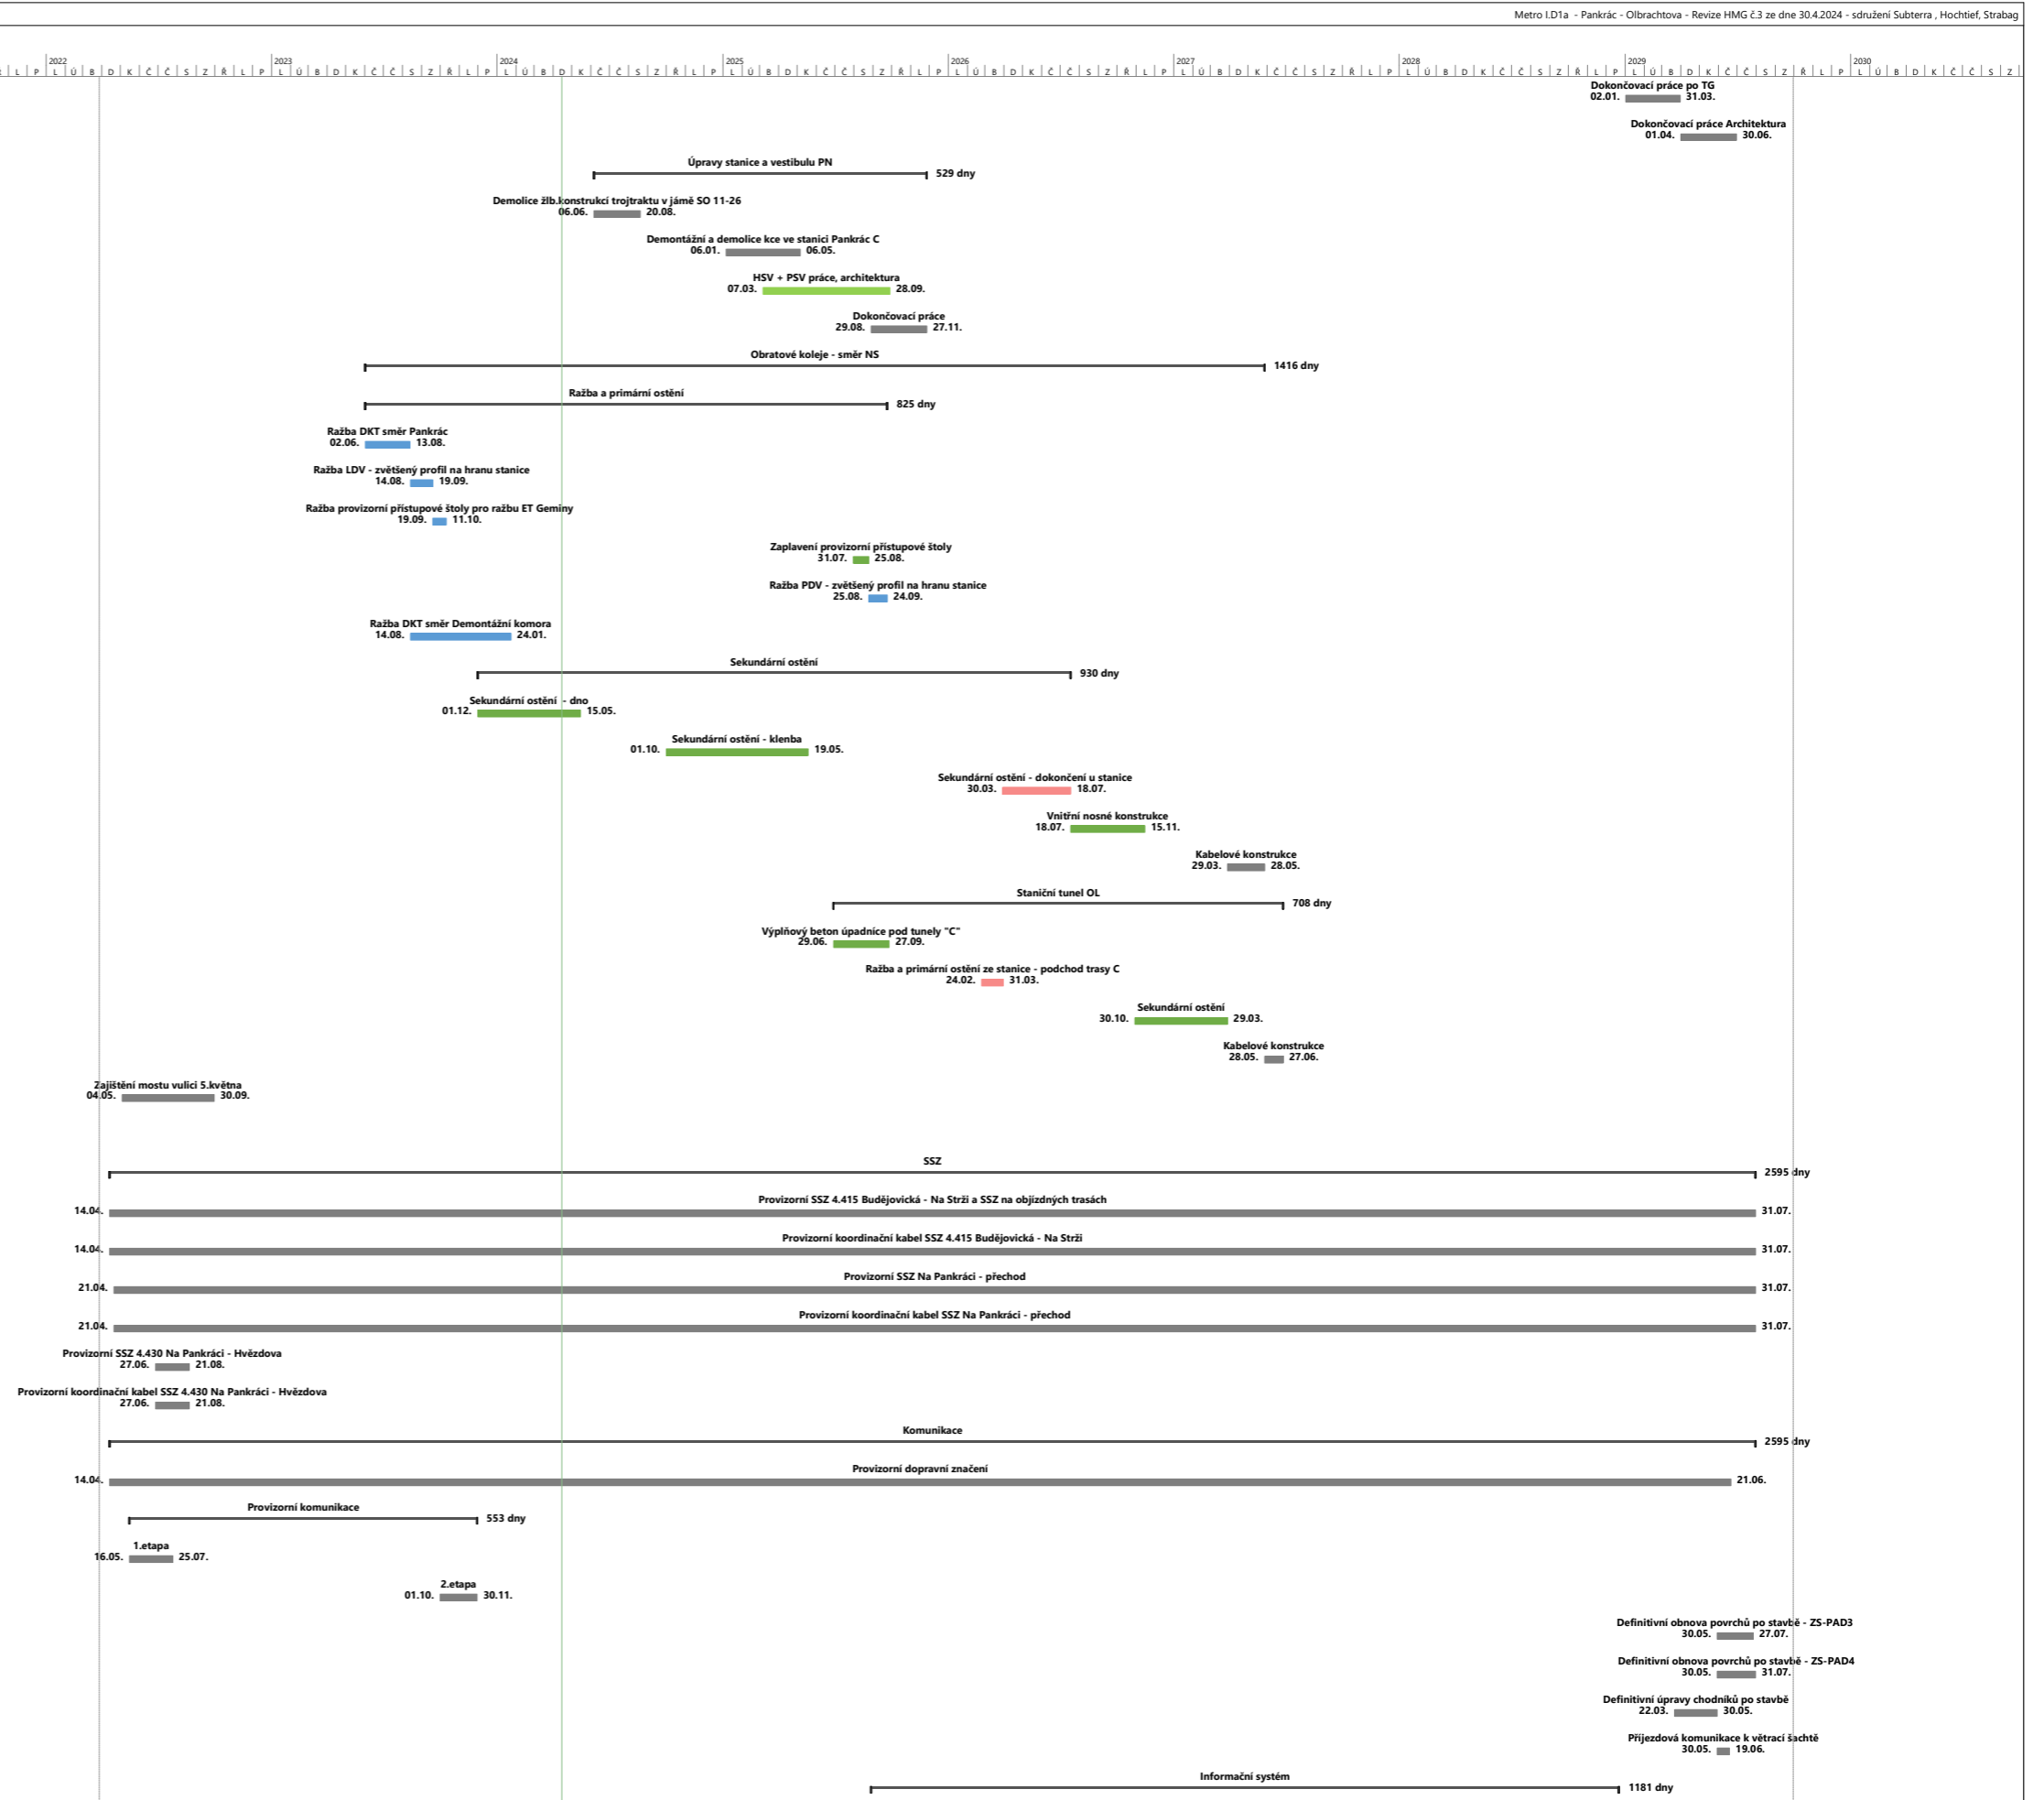

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag	Úkol	Rozdělení	Milník
█	Souhonný	Souhonný projekt
◆	Neaktivní úkol	◆	Neaktivní milník
▬	Neaktivní souhonný	▬	Ruční úkol

◇	Pouze s dobou trvání	▬	Pouze zahájení	▬	Vnější milník	◆	Kritické rozdělení	Konečný termín
▬	Ruční úkoly zahrnuté v souhonném úkolu	▬	Pouze s datem dokončení	▬	Kritický	◆	Průběh	▬	Průběh ručně zadaného úkolu
▬	Ruční souhonný	▬	Vnější úkoly	▬	Kritický	◆	Průběh ručně zadaného úkolu	▬	

ID	Režim	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
271			Informační systém - stanice Pankrác C	60 dny	29.08.25	28.10.25	1392 dny	1392 dny									
272			Informační systém - stanice Pankrác D	355 dny	02.01.28	22.12.28	271 dny	271 dny									
273		SO 11-50	Definitivní dopravní značení	62 dny	30.05.29	31.07.29	60 dny	60 dny									
274			Přeložky IS	1973 dny	14.04.22	28.10.27	0 dny	682 dny									
275		SO 11-51/10	Přeložka vodovodu DN300 - definitivní	60 dny	30.07.27	28.09.27	551 dny	551 dny									
276		SO 11-51/11	Rušení vodovodu DN300	60 dny	01.02.24	01.04.24	1957 dny	1957 dny									
277		SO 11-51/20	Přeložka vodovodu DN300(200) - provizorní	77 dny	14.04.22	30.06.22	1 den	1 den									
278		SO 11-52/10	Přeložka vodovodu DN150 - definitivní	60 dny	30.07.27	28.09.27	581 dny	581 dny									
279		SO 11-52/11	Rušení vodovodu DN150	30 dny	31.01.24	01.03.24	1988 dny	1988 dny									
280		SO 11-54/10	Přeložka kanalizace DN800 - definitivní	1503 dny	14.04.22	05.07.26	0 dny	227 dny									
281			1.etapa	230 dny	14.04.22	30.11.22	1 den	1 den									
282			2.etapa	120 dny	07.03.26	05.07.26	227 dny	227 dny									
283		SO 11-54/11	Rušení kanalizace DN800	106 dny	06.11.23	01.03.24	312 dny	1988 dny									
284			Rušení DN 800 v jámě C	30 dny	31.01.24	01.03.24	1988 dny	1988 dny									
285			Rušení DN 800 v jámě Arkády	60 dny	06.11.23	15.01.24	312 dny	312 dny									
286		SO 11-54/20	Přeložka kanalizace DN800 - provizorní	230 dny	14.04.22	30.11.22	1 den	1 den									
287		SO 11-55/10	Přeložka kanalizace DN400 - definitivní	165 dny	18.06.22	30.11.22	1 den	1 den									
288		SO 11-55/11	Rušení kanalizace DN400	50 dny	14.12.22	12.02.23	1 den	1 den									
289		SO 11-60/01	Přeložka horkovodu DN500 - definitivní	90 dny	31.05.27	29.08.27	521 dny	521 dny									
290		SO 11-60/02	Přeložka horkovodu DN500 - provizorní	313 dny	12.02.23	22.12.23	1 den	1 den									
291		SO 11-67/10	Kanalizační přípojky odvodnění	30 dny	29.08.27	28.09.27	561 dny	561 dny									
292		SO 11-67/11	Provizorní kanalizační přípojky odvodnění	30 dny	15.08.23	14.09.23	108 dny	108 dny									
293		SO 11-68/20	Vodovodní přípojka stanice D - sladit s PAD5	30 dny	28.09.27	28.10.27	551 dny	551 dny									
294		SO 11-69/10	Kanalizační přípojka stanice C	30 dny	03.10.26	02.11.26	901 dny	901 dny									
295		SO 11-69/11	Provizorní kanalizační přípojka stanice C	28 dny	16.11.22	14.12.22	1 den	1 den									
296		SO 11-69/20	Kanalizační přípojka stanice D - sladit s PAD5	20 dny	28.09.27	18.10.27	561 dny	561 dny									
297			Přeložky Elektro	2575 dny	04.05.22	31.07.29	60 dny	60 dny									
298		SO 11-75/10	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby - ZS PAD2	2575 dny	04.05.22	31.07.29	60 dny	60 dny									
299		SO 11-75/20	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby - ZS PAD4	2575 dny	04.05.22	31.07.29	60 dny	60 dny									
300		SO 11-75/30	Provizorní úpravy rozvodů NN a VO - OC Arkády	60 dny	15.08.23	14.10.23	78 dny	78 dny									
301		SO 11-75/40	Provizorní úpravy rozvodů NN a VO - City Empíria	60 dny	13.06.22	12.08.22	36 dny	36 dny									
302		SO 11-76/10	Definitivní přeložka a ochrana VO - 2. jáma	60 dny	29.08.27	28.10.27	551 dny	551 dny									
303		SO 11-76/20	Definitivní přeložka a ochrana VO	90 dny	29.08.27	27.11.27	521 dny	521 dny									
304		SO 11-76/30	Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - OC Arkády	90 dny	29.08.27	27.11.27	521 dny	521 dny									
305		SO 11-76/40	Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - City Empíria	90 dny	29.08.27	27.11.27	521 dny	521 dny									
306			Přeložky SLP	1983 dny	04.05.22	27.11.27	0 dny	521 dny									
307		SO 11-81/11	Přeložka kabelů T-Systems - Provizorní - 1. jáma	280 dny	15.08.23	31.05.24	19 dny	19 dny									
308		SO 11-81/12	Přeložka kabelů T-Systems - Definitivní - 1. jáma	90 dny	29.08.27	27.11.27	521 dny	521 dny									
309		SO 11-81/21	Přeložka kabelů T-Systems - Provizorní - 2. jáma	70 dny	16.05.22	25.07.22	2 dny	2 dny									
310		SO 11-81/22	Přeložka kabelů T-Systems - Definitivní - 2. jáma	90 dny	29.08.27	27.11.27	521 dny	521 dny									
311		SO 11-82/11	Přeložka kabelů GTS - Provizorní - 1. jáma	280 dny	15.08.23	31.05.24	19 dny	19 dny									
312		SO 11-82/12	Přeložka kabelů GTS - Definitivní - 1. jáma	90 dny	29.08.27	27.11.27	521 dny	521 dny									
313		SO 11-82/21	Přeložka kabelů GTS - Provizorní - 2. jáma	70 dny	16.05.22	25.07.22	2 dny	2 dny									
314		SO 11-82/22	Přeložka kabelů GTS - Definitivní - 2. jáma	90 dny	29.08.27	27.11.27	521 dny	521 dny									
315		SO 11-83/21	Přeložka kabelů UPC - Provizorní - 2. jáma	70 dny	16.05.22	25.07.22	2 dny	2 dny									

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag


Úkol	Souhrnný	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník	Kritické rozdělení
Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín	Průběh
Milník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Kritický	Průběh ručně zadaného úkolu

Table with columns: ID, Režim úkolů, Text1, Název úkolu, Doba trvání, Zahájení, Dokončení, Časová rezerva zahájení, Časová rezerva dokončení. Contains project schedule data for Metro LD1a, including tasks like 'Přeložka kabelů UPC', 'Konstrukce pro provizorní vedení inženýrských sítí', and 'TT Pankrác vč. podchodu pod ulicí Na Pankráci'.

Legend and footer information. Legend includes: Úkol, Rozdělení, Mílník, Souhrnný, Souhrn projektu, Neaktivní úkol, Neaktivní mílník, Neaktivní souhrn, Ruční úkol, Pouze s dobou trvání, Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu, Ruční souhrn, Pouze zahájení, Vnější úkoly, Vnější mílník, Konečný termín, Kritický, Kritické rozdělení, Průběh, Průběh ručně zadaného úkolu. Footer includes 'Stránka 8' and 'Sjízdnosti kolejového svršku - termín bude upřesněn po koordinaci se stavbou LD1b'.

ID	Režim úkol	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	
361			II. fáze realizace (dilatační díly - DD3 + DD4)	321 dny	01.02.26	19.12.26	232 dny	232 dny	<p>II. fáze realizace (dilatační díly - DD3 + DD4) 01.02. 12.12. 19.12. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 321 dny</p>
362			Výstavba podhodu DD3 + DD4 včetně propojení do Gemini	314 dny	01.02.26	12.12.26	232 dny	232 dny	Výstavba podhodu DD3 + DD4 včetně propojení do Gemini 01.02. 12.12.
363			Technické prohlídky, přeřizky	7 dny	12.12.26	19.12.26	232 dny	232 dny	Technické prohlídky, přeřizky 12.12. 19.12.
364			Dokončení díla	0 dny	19.12.26	19.12.26	232 dny	232 dny	Dokončení díla 19.12.
365	MO	SO 11 - MO	Modernizace osvětlení stanice metra Pankrác	349 dny	06.01.25	21.12.25	12 dny	12 dny	Modernizace osvětlení stanice metra Pankrác 06.01. 21.12.
366	WC	SO 11 - WC	Rekonstrukce WC stanice metra Pankrác	349 dny	06.01.25	21.12.25	12 dny	12 dny	Rekonstrukce WC stanice metra Pankrác 06.01. 21.12.
367			STP pro technologii SOD 11	0 dny	22.12.27	22.12.27	1 den	1 den	STP pro technologii SOD 11 22.12.
368			Technologie	1390 dny	01.05.25	31.03.29	1 den	0 dny	Technologie 1390 dny
369			Stavební objekty	1302 dny	01.05.25	02.01.29	1 den	0 dny	Stavební objekty 1302 dny
370		SO 11-91/21.1	Silové rozvody ve stanici Pankrác D	356 dny	02.01.28	02.01.29	0 dny	0 dny	02.01. Silové rozvody ve stanici Pankrác D 02.01.
371		SO 11-91/21.2	Silové rozvody ve stanici Pankrác C	174 dny	01.05.25	22.10.25	1 den	1 den	01.05. Silové rozvody ve stanici Pankrác C 22.10.
372		SO 11-91/61.1	Osvětlení stanice Pankrác D	356 dny	02.01.28	02.01.29	0 dny	0 dny	02.01. Osvětlení stanice Pankrác D 02.01.
373		SO 11-91/61.2	Osvětlení stanice Pankrác D - ASDR-O	356 dny	02.01.28	02.01.29	0 dny	0 dny	02.01. Osvětlení stanice Pankrác D - ASDR-O 02.01.
374		SO 11-91/61.3	Osvětlení stanice Pankrác C	174 dny	01.05.25	22.10.25	1 den	1 den	01.05. Osvětlení stanice Pankrác C 22.10.
375		SO 11-91/92	Požární těsnění	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	30.06. Požární těsnění 02.01.
376		SO 11-93/01.1	Sdělovací kabely v tr. úseku PN-D - OL, spojka C-D	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	30.06. Sdělovací kabely v tr. úseku PN-D - OL, spojka C-D 02.01.
377		SO 11-93/01.2	Sdělovací kabely ve stanici Pankrác C	120 dny	24.06.25	22.10.25	7 dny	7 dny	24.06. Sdělovací kabely ve stanici Pankrác C 22.10.
378		SO 11-93/11.1	Služební rádiová síť DPP ve stanici Pankrác D	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	30.06. Služební rádiová síť DPP ve stanici Pankrác D 02.01.
379		SO 11-93/11.2	Služební rádiová síť DPP ve stanici Pankrác C	120 dny	24.06.25	22.10.25	7 dny	7 dny	24.06. Služební rádiová síť DPP ve stanici Pankrác C 22.10.
380		SO 11-93/12	Rádiová síť TSM 400 ve stanici Pankrác D	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	30.06. Rádiová síť TSM 400 ve stanici Pankrác D 02.01.
381		SO 11-93/13	Rádiová síť MRS TETRA ve stanici Pankrác D	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	30.06. Rádiová síť MRS TETRA ve stanici Pankrác D 02.01.
382		SO 11-93/14	Rádiová síť - vyzářovací kabel v tr. úseku PND-OL, spojka C-D	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	30.06. Rádiová síť - vyzářovací kabel v tr. úseku PND-OL, spojka C-D 02.01.
383		SO 11-93/21.1	Elektronický informační systém ve stanici Pankrác D	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	30.06. Elektronický informační systém ve stanici Pankrác D 02.01.
384		SO 11-93/21.2	Elektronický informační systém ve stanici Pankrác C	120 dny	24.06.25	22.10.25	7 dny	7 dny	24.06. Elektronický informační systém ve stanici Pankrác C 22.10.
385		SO 11-93/31.1	Zařízení průmyslové televize ve stanici Pankrác D	296 dny	02.03.28	02.01.29	0 dny	0 dny	02.03. Zařízení průmyslové televize ve stanici Pankrác D 02.01.
386		SO 11-93/31.2	Zařízení průmyslové televize ve stanici Pankrác C	174 dny	01.05.25	22.10.25	7 dny	7 dny	01.05. Zařízení průmyslové televize ve stanici Pankrác C 22.10.
387		SO 11-93/41.1	Automatizace odbavování cestujících ve stanici Pankrác D	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	30.06. Automatizace odbavování cestujících ve stanici Pankrác D 02.01.
388		SO 11-93/41.2	Automatizace odbavování cestujících ve stanici Pankrác C	120 dny	24.06.25	22.10.25	7 dny	7 dny	24.06. Automatizace odbavování cestujících ve stanici Pankrác C 22.10.
389		SO 11-93/51.1	Telefonní zařízení ve stanici Pankrác D	296 dny	02.03.28	02.01.29	0 dny	0 dny	02.03. Telefonní zařízení ve stanici Pankrác D 02.01.
390		SO 11-93/51.2	Telefonní zařízení ve stanici Pankrác C	174 dny	01.05.25	22.10.25	7 dny	7 dny	01.05. Telefonní zařízení ve stanici Pankrác C 22.10.
391		SO 11-93/52.1	Datová síť ve stanici Pankrác D	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	30.06. Datová síť ve stanici Pankrác D 02.01.
392		SO 11-93/52.2	Datová síť ve stanici Pankrác C	120 dny	24.06.25	22.10.25	7 dny	7 dny	24.06. Datová síť ve stanici Pankrác C 22.10.
393		SO 11-93/53.1	Technologická síť ve stanici Pankrác D	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	30.06. Technologická síť ve stanici Pankrác D 02.01.
394		SO 11-93/53.2	Technologická síť ve stanici Pankrác C	120 dny	24.06.25	22.10.25	7 dny	7 dny	24.06. Technologická síť ve stanici Pankrác C 22.10.
395		SO 11-93/54	Strukturovaná kabeláž ve stanici Pankrác D	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	30.06. Strukturovaná kabeláž ve stanici Pankrác D 02.01.
396		SO 11-93/61	Rozhlasové zařízení ve stanici Pankrác D	296 dny	02.03.28	02.01.29	0 dny	0 dny	02.03. Rozhlasové zařízení ve stanici Pankrác D 02.01.
397		SO 11-93/71.1	Hodinové zařízení ve stanici Pankrác D	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	30.06. Hodinové zařízení ve stanici Pankrác D 02.01.
398		SO 11-93/71.2	Hodinové zařízení ve stanici Pankrác C	120 dny	24.06.25	22.10.25	7 dny	7 dny	24.06. Hodinové zařízení ve stanici Pankrác C 22.10.
399		SO 11-93/81	Elektrická požární signalizace ve stanici Pankrác	296 dny	02.03.28	02.01.29	0 dny	0 dny	02.03. Elektrická požární signalizace ve stanici Pankrác 02.01.
400		SO 11-93/91	Elektrická zabezpečovací signalizace ve stanici Pankrác D	296 dny	02.03.28	02.01.29	0 dny	0 dny	02.03. Elektrická zabezpečovací signalizace ve stanici Pankrác D 02.01.
401		SO 11-93/92.1	Přístupový systém ve stanici Pankrác D	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	30.06. Přístupový systém ve stanici Pankrác D 02.01.
402		SO 11-93/92.2	Přístupový systém ve stanici Pankrác C	120 dny	24.06.25	22.10.25	7 dny	7 dny	24.06. Přístupový systém ve stanici Pankrác C 22.10.
403			Harmonogram funkčních zkoušek a revizí zhotovitele 25 dny - stanice Pankrác C	22.10.25	16.11.25	1 den	1 den	1 den	Harmonogram funkčních zkoušek a revizí zhotovitele - stanice Pankrác C 25 dny
404			Individuální zkoušky slaboproudých systémů (telefonní, datové, technologické sítě, EPS, EZS) PNC	10 dny	22.10.25	01.11.25	7 dny	7 dny	Individuální zkoušky slaboproudých systémů (telefonní, datové, technologické sítě, EPS, EZS) PNC 22.10. 01.11.
405			Individuální zkoušky silnoproudých systémů (silové rozvody, osvětlení) PNC	10 dny	22.10.25	01.11.25	1 den	1 den	Individuální zkoušky silnoproudých systémů (silové rozvody, osvětlení) PNC 22.10. 01.11.

ID	Režim úkol	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
406		Individuální zkoušky technologií (VZT, větrání, eskalátory, výťahy) PNC	7 dny	25.10.25	01.11.25	2 dny	2 dny									
407		Individuální zkoušky technologií (čerpací stanice, tunelovod) PNC	7 dny	25.10.25	01.11.25	2 dny	2 dny									
408		Individuální zkoušky ASDR T PNC	8 dny	01.11.25	09.11.25	1 den	1 den									
409		Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 12 měření / revizí	14 dny	01.11.25	15.11.25	2 dny	2 dny									
410		Úpravy, opravy zařízení po individuálních zkouškách, podklady pro DSPS	7 dny	09.11.25	16.11.25	1 den	1 den									
411		Funkční zkouška a revize zhotovitele - stanice Pankrác C - Hlavní větrání - Pankrác C	25 dny	15.05.26	09.06.26	2 dny	2 dny									
412		Energetická páteř trasy	0 dny	15.11.28	15.11.28	0 dny	0 dny									
413		Harmonogram funkčních zkoušek a revizí zhotovitele - stanice Pankrác D	87 dny	03.01.29	31.03.29	0 dny	0 dny									
414		Individuální zkoušky slaboproudých systémů (telefonní, datové, technologické sítě, EPS, EZS) PND	31 dny	12.01.29	12.02.29	0 dny	0 dny									
415		Individuální zkoušky silnoproudých systémů (silové rozvody, osvětlení) PND	40 dny	03.01.29	12.02.29	0 dny	0 dny									
416		Individuální zkoušky technologií (VZT, větrání, eskalátory, výťahy) PND	20 dny	10.01.29	30.01.29	13 dny	13 dny									
417		Individuální zkoušky technologií (čerpací stanice, tunelovod) PND	20 dny	10.01.29	30.01.29	13 dny	13 dny									
418		Individuální zkoušky ASDR T, O, E PND	20 dny	12.02.29	04.03.29	0 dny	0 dny									
419		Zkoušky komunikace mezi jednotlivými technologiemi, prověření vazeb PND, PNC, CD	26 dny	04.03.29	30.03.29	0 dny	0 dny									
420		Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 26 revizí / měření	26 dny	04.03.29	30.03.29	0 dny	0 dny									
421		Úpravy, opravy zařízení po individuálních zkouškách, podklady pro DSPS	26 dny	04.03.29	30.03.29	0 dny	0 dny									
422		Dokončení stavební části TG / připravenost na komplexní zkoušky	0 dny	31.03.29	31.03.29	0 dny	0 dny									
423	SO 11-94/1	Pohyblivé schody - Pankrác C	174 dny	01.05.25	22.10.25	5 dny	5 dny									
424	SO 11-94/1	Pohyblivé schody - Pankrác D	354 dny	01.04.28	31.03.29	39 dny	0 dny									
425		Montáž eskalátorů	150 dny	01.04.28	29.08.28	39 dny	39 dny									
426		Opláštění eskalátorů	60 dny	29.08.28	28.10.28	39 dny	39 dny									
427		Oživení eskalátorů	60 dny	16.11.28	25.01.29	0 dny	0 dny									
428		Dokončovací práce	60 dny	25.01.29	26.03.29	0 dny	0 dny									
429		Zahájení zkoušek	0 dny	31.03.29	31.03.29	0 dny	0 dny									
430	SO 11-94/2	Výtahy - Pankrác C	174 dny	01.05.25	22.10.25	5 dny	5 dny									
431	SO 11-94/2	Výtahy - Pankrác D	354 dny	01.04.28	31.03.29	39 dny	0 dny									
432		Montáž výtahů	150 dny	01.04.28	29.08.28	39 dny	39 dny									
433		Opláštění výtahů	60 dny	29.08.28	28.10.28	39 dny	39 dny									
434		Oživení výtahů	60 dny	16.11.28	25.01.29	0 dny	0 dny									
435		Dokončovací práce	60 dny	25.01.29	26.03.29	0 dny	0 dny									
436		Zahájení zkoušek	0 dny	31.03.29	31.03.29	0 dny	0 dny									
437	SO 11-94/3	Čerpací stanice - Pankrác C	174 dny	01.05.25	22.10.25	5 dny	5 dny									
438	SO 11-94/3	Čerpací stanice - Pankrác D	378 dny	02.01.28	24.01.29	152 dny	14 dny									
439		Hrubá montáž	180 dny	02.01.28	30.06.28	152 dny	152 dny									
440		Zprovoznění čerpání	60 dny	15.11.28	24.01.29	14 dny	14 dny									
441	SO 11-95/1	Hlavní větrání - Pankrác C	174 dny	12.11.25	15.05.26	2 dny	2 dny									
442	SO 11-95/1	Hlavní větrání - Pankrác D	378 dny	02.01.28	24.01.29	92 dny	14 dny									
443		Hrubá montáž	240 dny	02.01.28	29.08.28	92 dny	92 dny									
444		Zprovoznění větrání	60 dny	15.11.28	24.01.29	14 dny	14 dny									
445	SO 11-95/2	Staniční VZT ve st.Pankrác C	174 dny	01.05.25	22.10.25	5 dny	5 dny									
446	SO 11-95/2	Staniční VZT ve st.Pankrác D	356 dny	02.01.28	02.01.29	16 dny	16 dny									
447	SO 11-95/3	Větrání EGB ve st.Pankrác	356 dny	02.01.28	02.01.29	16 dny	16 dny									
448	SO 11-96.1	ASDR - Technologický systém ve stanici Pankrác D	356 dny	02.01.28	02.01.29	0 dny	0 dny									
449	SO 11-96.2	ASDR - Technologický systém ve stanici Pankrác C	174 dny	01.05.25	22.10.25	7 dny	7 dny									
450		Dokončení stavebních prací na SOD 11 mimo terénních a 0 dny sady úprav a likvidace ZS	60 dny	31.07.29	31.07.29	60 dny	60 dny									

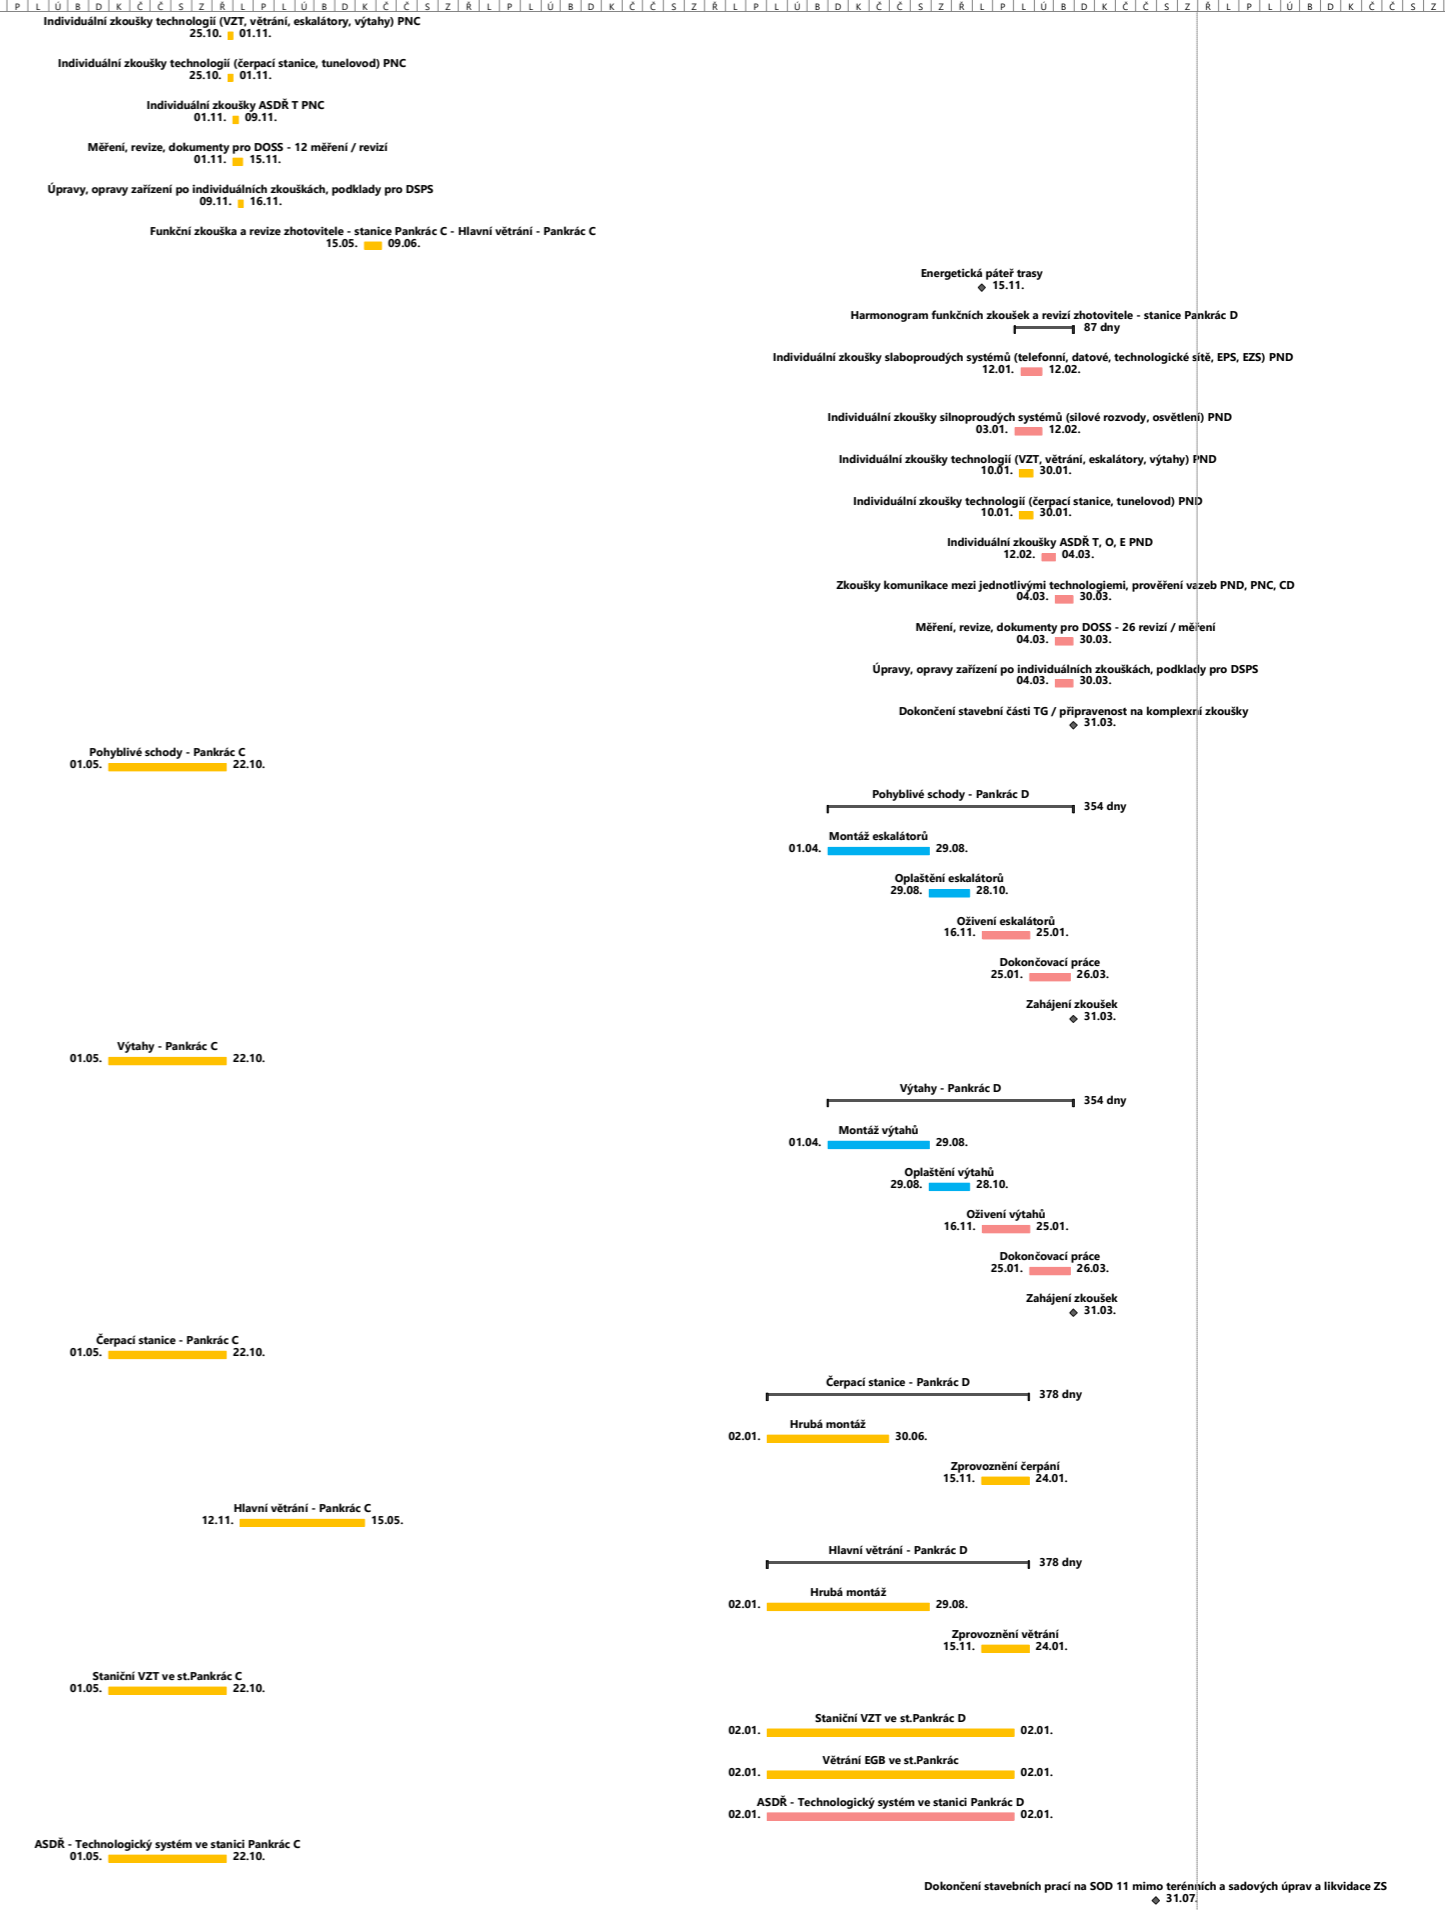

ID	Režim úkolů	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	
451								
452	SOD 12	Traťový úsek PA - OL	2654 dny	08.04.22	22.09.29	0 dny	7 dny	Traťový úsek PA - OL
453	SO 12-01	Příprava území	47 dny	14.04.22	31.05.22	60 dny	60 dny	Příprava území 14.04. 31.05.
454	SO 12-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	47 dny	14.04.22	31.05.22	60 dny	60 dny	Vjezdy a výjezdy na staveniště 14.04. 31.05.
455	SO 12-03	Vodovodní přípojka staveniště VO-OL - zrušení	30 dny	31.07.29	30.08.29	30 dny	30 dny	Vodovodní přípojka staveniště VO-OL - zrušení 31.07. 30.08.
456	SO 12-04	Kanalizační přípojka staveniště VO-OL - zrušení	30 dny	31.07.29	30.08.29	30 dny	30 dny	Kanalizační přípojka staveniště VO-OL - zrušení 31.07. 30.08.
457	SO 12-06	El. Přípojka VN staveniště VO-OL - zrušení	30 dny	31.07.29	30.08.29	30 dny	30 dny	El. Přípojka VN staveniště VO-OL - zrušení 31.07. 30.08.
458	SO 12-08	Ochrana péšního provozu	2394 dny	01.11.22	31.07.29	60 dny	60 dny	Ochrana péšního provozu 01.11. 31.07.
459	SO 12-09	Ochrana inž. Sítí	2548 dny	31.05.22	31.07.29	60 dny	60 dny	Ochrana inž. Sítí 31.05. 31.07.
460	SO 12-11	Šachta pro výstavbu traťových tunelů	2368 dny	08.04.22	30.11.28	0 dny	30 dny	Šachta pro výstavbu traťových tunelů 08.04. 30.11. 2368 dny
461		Vystrojení šachty pro stabu Metra I.D.	5 dny	08.04.22	13.04.22	0 dny	0 dny	Vystrojení šachty pro stabu Metra I.D. 08.04. 13.04.
462		Zásypy šachty	90 dny	01.09.28	30.11.28	30 dny	30 dny	Zásypy šachty 01.09. 30.11.
463	SO 12-20	Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu	2271 dny	14.04.22	31.08.28	0 dny	30 dny	Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu 14.04. 31.08. 2271 dny
464		Ražba a primární ostění	742 dny	14.04.22	15.05.24	0 dny	816 dny	Ražba a primární ostění 14.04. 15.05. 742 dny
465		Ražba a primární ostění směr Olbrachtova	214 dny	14.04.22	14.11.22	0 dny	0 dny	Ražba a primární ostění směr Olbrachtova 14.04. 14.11.
466		Ražba a primární ostění směr Pankrác	68 dny	14.04.22	21.06.22	2 dny	2 dny	Ražba a primární ostění směr Pankrác 14.04. 21.06.
467		Zajištění a vyhloubení šachet Š1, Š2, Š3	186 dny	22.09.22	06.04.23	828 dny	828 dny	Zajištění a vyhloubení šachet Š1, Š2, Š3 22.09. 06.04.
468		Zřízení systému kompenzačních injektáží	120 dny	21.12.22	30.04.23	828 dny	828 dny	Zřízení systému kompenzačních injektáží 21.12. 30.04.
469		Injektáž rozpletové komory	82 dny	12.05.23	02.08.23	816 dny	816 dny	Injektáž rozpletové komory 12.05. 02.08.
470		Ražba a primární ostění směr Pankrác	277 dny	02.08.23	15.05.24	816 dny	816 dny	Ražba a primární ostění směr Pankrác 02.08. 15.05.
471		Sekundární ostění včetně izolace	1256 dny	22.02.25	31.08.28	128 dny	30 dny	Sekundární ostění včetně izolace 22.02. 31.08. 1256 dny
472		Sekundární ostění směr Pankrác včetně rozpletu - dno	90 dny	22.02.25	23.05.25	128 dny	128 dny	Sekundární ostění směr Pankrác včetně rozpletu - dno 22.02. 23.05.
473		Sekundární ostění směr Pankrác včetně rozpletu - klenba	290 dny	23.05.25	19.03.26	128 dny	128 dny	Sekundární ostění směr Pankrác včetně rozpletu - klenba 23.05. 19.03.
474		Sekundární ostění směr Olbrachtova včetně rozpletu - dno	75 dny	25.06.26	08.09.26	30 dny	30 dny	Sekundární ostění směr Olbrachtova včetně rozpletu - dno 25.06. 08.09.
475		Sekundární ostění směr Olbrachtova včetně rozpletu - klenba	170 dny	08.09.26	07.03.27	30 dny	30 dny	Sekundární ostění směr Olbrachtova včetně rozpletu - klenba 08.09. 07.03.
476		Hloubený tunel - Betonové dno + stěny	60 dny	07.03.27	06.05.27	30 dny	30 dny	Hloubený tunel - Betonové dno + stěny 07.03. 06.05.
477		Zásobovací a zavážení otvor VO-OL	411 dny	06.05.27	30.06.28	30 dny	30 dny	Zásobovací a zavážení otvor VO-OL 06.05. 30.06.
478		Betonáž stropu zavážecího otvoru	61 dny	01.07.28	31.08.28	30 dny	30 dny	Betonáž stropu zavážecího otvoru 01.07. 31.08.
479		Kabelové konstrukce	90 dny	07.03.27	05.06.27	210 dny	210 dny	Kabelové konstrukce 07.03. 05.06.
480	SO 12-21	Levý ražený jednokolejný tunel	1398 dny	15.11.22	23.10.26	0 dny	290 dny	Levý ražený jednokolejný tunel 15.11. 23.10. 1398 dny
481		Ražba a primární ostění	175 dny	15.11.22	19.05.23	32 dny	32 dny	Ražba a primární ostění 15.11. 19.05.
482		Sekundární ostění - dno	30 dny	08.02.24	09.03.24	128 dny	128 dny	Sekundární ostění - dno 08.02. 09.03.
483		Sekundární ostění - klenba	240 dny	09.03.24	04.11.24	128 dny	128 dny	Sekundární ostění - klenba 09.03. 04.11.
484		Kabelové konstrukce	60 dny	24.08.26	23.10.26	290 dny	290 dny	Kabelové konstrukce 24.08. 23.10.
485	SO 12-22	Pravý ražený jednokolejný tunel a rozplet do spojky	1279 dny	23.01.23	24.08.26	0 dny	1102 dny	Pravý ražený jednokolejný tunel a rozplet do spojky 23.01. 24.08. 1279 dny
486		Ražba a primární ostění - Vidlice	68 dny	23.01.23	01.04.23	0 dny	0 dny	Ražba a primární ostění - Vidlice 23.01. 01.04.
487		Ražba a primární ostění - JKT - P	165 dny	06.03.23	18.08.23	1 den	1 den	Ražba a primární ostění - JKT - P 06.03. 18.08.
488		Sekundární ostění - Vidlice - dno	40 dny	16.01.26	25.02.26	0 dny	0 dny	Sekundární ostění - Vidlice - dno 16.01. 25.02.
489		Sekundární ostění - Vidlice - klenba	120 dny	25.02.26	25.06.26	0 dny	0 dny	Sekundární ostění - Vidlice - klenba 25.02. 25.06.
490		Sekundární ostění - JKT - P - dno	45 dny	29.06.24	13.08.24	1688 dny	1688 dny	Sekundární ostění - JKT - P - dno 29.06. 13.08.
491		Sekundární ostění - JKT - P - klenba	135 dny	22.02.25	07.07.25	1505 dny	1505 dny	Sekundární ostění - JKT - P - klenba 22.02. 07.07.
492		Kabelové konstrukce	60 dny	25.06.26	24.08.26	290 dny	290 dny	Kabelové konstrukce 25.06. 24.08.
493	SO 12-23	Odstavný ražený jednokolejný tunel	916 dny	15.05.24	07.12.26	301 dny	290 dny	Odstavný ražený jednokolejný tunel 15.05. 07.12. 916 dny
494		Ražba a primární ostění	125 dny	15.05.24	17.09.24	816 dny	816 dny	Ražba a primární ostění 15.05. 17.09.
495		Sekundární ostění - dno	40 dny	17.09.24	27.10.24	816 dny	816 dny	Sekundární ostění - dno 17.09. 27.10.

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag

Úkol	Sochmý	Neaktivní mílník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější mílník	Kritické rozdělení
Rozdělení	Sochm projektů	Neaktivní sochm	Ruční úkoly zahrnuté v sochmém úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín	Průběh
Mílník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční sochm	Vnější úkoly	Kritický	Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 11

Sjízdnosti kolejeového svršku - termín bude upřesněn po koordinaci se stavbou LD1b
Tento HMG platí za předpokladu dodržení předpokládaného postupu prací ze ZD stavby LD1b (Olbrachtova) mimo - Nové Dvory aktualizace z 03/2022

ID	Režim úkol	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	Gantt chart timeline (2022-2030)											
496			Sekundární ostění - klenba	100 dny	04.11.24	22.02.25	128 dny	128 dny	Sekundární ostění - klenba 04.11. - 22.02.											
497			Vnitřní nosné konstrukce	180 dny	27.10.24	05.05.25	816 dny	816 dny	Vnitřní nosné konstrukce 27.10. - 05.05.											
498			Kabelové konstrukce	45 dny	23.10.26	07.12.26	290 dny	290 dny	Kabelové konstrukce 23.10. - 07.12.											
499	SO 12-25		Vzduchotechnická propojka mezi jednokolej. tunely	1013 dny	18.06.23	26.04.26	32 dny	1222 dny	Vzduchotechnická propojka mezi jednokolej. tunely 18.06.23 - 26.04.26 (1013 dny)											
500			Ražba a primární ostění	30 dny	18.06.23	18.07.23	32 dny	32 dny	Ražba a primární ostění 18.06. - 18.07.											
501			Sekundární ostění VZT propojky	65 dny	04.11.24	18.01.25	1615 dny	1615 dny	Sekundární ostění VZT propojky 04.11. - 18.01.											
502			HSV + PSV práce	60 dny	25.02.26	26.04.26	1222 dny	1222 dny	HSV + PSV práce 25.02. - 26.04.											
503	SO 12-27		Šachta VZT	1201 dny	19.05.22	01.10.25	0 dny	219 dny	Šachta VZT 19.05.22 - 01.10.25 (1201 dny)											
504			Hloubení šachty	120 dny	19.05.22	16.09.22	219 dny	219 dny	Hloubení šachty 19.05. - 16.09.											
505			Sekundární ostění - napojení na strojovnu	30 dny	20.03.24	19.04.24	219 dny	219 dny	Sekundární ostění - napojení na strojovnu 20.03. - 19.04.											
506			Sekundární ostění - šachta	100 dny	23.06.25	01.10.25	219 dny	219 dny	Sekundární ostění - šachta 23.06. - 01.10.											
507	SO 12-28		Strojovna VZT	2318 dny	16.09.22	31.03.29	0 dny	7 dny	Strojovna VZT 16.09.22 - 31.03.29 (2318 dny)											
508			Ražba a primární ostění	192 dny	16.09.22	06.04.23	219 dny	219 dny	Ražba a primární ostění 16.09.22 - 06.04.											
509			Sekundární ostění	130 dny	01.11.23	20.03.24	219 dny	219 dny	Sekundární ostění 01.11. - 20.03.											
510			Vnitřní nosné konstrukce	90 dny	11.05.26	09.08.26	7 dny	7 dny	Vnitřní nosné konstrukce 11.05. - 09.08.											
511			HSV + PSV práce pro montáž TG	218 dny	18.05.27	22.12.27	7 dny	7 dny	HSV + PSV práce pro montáž TG 18.05. - 22.12.											
512			Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	7 dny	7 dny	Ostatní HSV + PSV práce 02.01. - 22.12.											
513			Kabelové konstrukce	60 dny	23.10.27	22.12.27	8 dny	8 dny	Kabelové konstrukce 23.10. - 22.12.											
514			Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	7 dny	7 dny	Dokončovací práce po TG 02.01. - 31.03.											
515	SO 12-29		Větrací objekt	355 dny	02.01.28	22.12.28	8 dny	8 dny	Větrací objekt 02.01. - 22.12.											
516	SO 12-45		Definitivní úpravy chodníků po stavbě	45 dny	15.05.29	29.06.29	92 dny	92 dny	Definitivní úpravy chodníků po stavbě 15.05. - 29.06.											
517	SO 12-48		Přijezdová komunikace k větrací šachtě	45 dny	31.03.29	15.05.29	7 dny	7 dny	Přijezdová komunikace k větrací šachtě 31.03. - 15.05.											
518	SO 12-51		Nový hydrant na řadu DN 300	15 dny	16.03.29	31.03.29	7 dny	7 dny	Nový hydrant na řadu DN 300 16.03. - 31.03.											
519	SO 12-90/21		Terénní úpravy	90 dny	15.05.29	13.08.29	7 dny	7 dny	Terénní úpravy 15.05. - 13.08.											
520	SO 12-90/31		Sadové úpravy	60 dny	24.07.29	22.09.29	7 dny	7 dny	Sadové úpravy 24.07. - 22.09.											
521	SO 12-90/51		Protihluková opatření	365 dny	01.11.22	11.11.23	992 dny	992 dny	Protihluková opatření 01.11. - 11.11.											
522			STP pro technologii	0 dny	22.12.27	22.12.27	627 dny	627 dny	STP pro technologii 22.12.											
523			Technologie	206 dny	29.06.28	31.01.29	62 dny	59 dny	Technologie 29.06.28 - 31.01.29 (206 dny)											
524			Stavební objekty	138 dny	29.06.28	14.11.28	67 dny	92 dny	Stavební objekty 29.06.28 - 14.11.28 (138 dny)											
525	SO 12-91/41		Kabelové vedení 22 kV v tr. úseku Pankrác - Olbrachtova	138 dny	29.06.28	14.11.28	67 dny	67 dny	Kabelové vedení 22 kV v tr. úseku Pankrác - Olbrachtova 29.06. - 14.11.											
526	SO 12-91/61.1		Osvětlení traťového úseku	138 dny	29.06.28	14.11.28	67 dny	67 dny	Osvětlení traťového úseku 29.06. - 14.11.											
527	SO 12-91/61.2		Osvětlení traťového úseku - ASDŘ-O	138 dny	29.06.28	14.11.28	92 dny	92 dny	Osvětlení traťového úseku - ASDŘ-O 29.06. - 14.11.											
528	SO 12-94/3		Čerpací stanice	169 dny	29.06.28	15.12.28	62 dny	61 dny	Čerpací stanice 29.06.28 - 15.12.28 (169 dny)											
529			Hrubá montáž	138 dny	29.06.28	14.11.28	62 dny	62 dny	Hrubá montáž 29.06. - 14.11.											
530			Energetická páteř trasy	0 dny	15.11.28	15.11.28	59 dny	59 dny	Energetická páteř trasy 15.11.											
531			Zprovoznění čerpání	30 dny	15.11.28	15.12.28	61 dny	61 dny	Zprovoznění čerpání 15.11. - 15.12.											
532			Harmonogram funkčních zkoušek a revizí zhotovitele - SOD 12,51,71	60 dny	22.11.28	31.01.29	59 dny	59 dny	Harmonogram funkčních zkoušek a revizí zhotovitele - SOD 12,51,71 22.11. - 31.01. (60 dny)											
533			Individuální zkoušky silnoproudých systémů (silové rozvody, osvětlení) SOD 12,51,71	25 dny	22.11.28	17.12.28	59 dny	59 dny	Individuální zkoušky silnoproudých systémů (silové rozvody, osvětlení) SOD 12,51,71 22.11. - 17.12.											
534			Individuální zkoušky technologií (čerpací stanice, tunelový vodovod) SOD 12,51,71	25 dny	05.12.28	09.01.29	61 dny	61 dny	Individuální zkoušky technologií (čerpací stanice, tunelový vodovod) SOD 12,51,71 05.12. - 09.01.											
535			Individuální zkoušky ASDŘ O - SOD 12,51,71	15 dny	17.12.28	11.01.29	59 dny	59 dny	Individuální zkoušky ASDŘ O - SOD 12,51,71 17.12. - 11.01.											
536			Zkoušky komunikace mezi jednotlivými technologiemi, prověření vazeb PND, OL, CD	20 dny	11.01.29	31.01.29	59 dny	59 dny	Zkoušky komunikace mezi jednotlivými technologiemi, prověření vazeb PND, OL, CD 11.01. - 31.01.											
537			Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 12 měření / revizí	20 dny	11.01.29	31.01.29	59 dny	59 dny	Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 12 měření / revizí 11.01. - 31.01.											
538			Úpravy, opravy zařízení po individuálních zkouškách, podklady pro DSPS	20 dny	11.01.29	31.01.29	59 dny	59 dny	Úpravy, opravy zařízení po individuálních zkouškách, podklady pro DSPS 11.01. - 31.01.											
539			Dokončení stavební části TG / připravenost na komplexní zkoušky	0 dny	31.01.29	31.01.29	59 dny	59 dny	Dokončení stavební části TG / připravenost na komplexní zkoušky 31.01.											

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag

Úkol Rozdělení Milník Souhrnný Souhrn projektu Neaktivní úkol Neaktivní milník Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější úkoly Vnější milník Konečný termín Kritický Kritické rozdělení Průběh Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Režim úkolů	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	Gantt chart timeline (2022-2030)											
540		Dokončení stavebních prací na SOD 12,51,71 mimo terénních a sadových úprav a likvidace ZS	0 dny	31.07.29	31.07.29	60 dny	60 dny	Dokončení stavebních prací na SOD 12,51,71 mimo terénních a sadových úprav a likvidace ZS 31.07.											
541																			
542	SOD 13	STANICE OLBRACHTOVA (OL)	2654 dny	14.04.22	28.09.29	0 dny	1 den	STANICE OLBRACHTOVA (OL) 2654 dny											
543	SO 13-01	Příprava území	68 dny	14.04.22	21.06.22	1 den	1 den	Příprava území 14.04. 21.06.											
544	SO 13-02	Vjezdy a výjezdy na staveništi	43 dny	19.04.22	01.06.22	60 dny	60 dny	Vjezdy a výjezdy na staveništi 19.04. 01.06.											
545		Připojky ZS	2588 dny	20.05.22	29.08.29	2506 dny	31 dny	Připojky ZS 2588 dny											
546	SO 13-03/10	Vodovodní přípojka staveništi OL1 - rušení	30 dny	30.07.29	29.08.29	31 dny	31 dny	Vodovodní přípojka staveništi OL1 - rušení 30.07. 29.08.											
547	SO 13-03/20	Vodovodní přípojka staveništi OL2	26 dny	26.06.22	22.07.22	2556 dny	2556 dny	Vodovodní přípojka staveništi OL2 26.06. 22.07.											
548	SO 13-03/30	Vodovodní přípojka staveništi OL3	31 dny	31.03.29	01.05.29	151 dny	151 dny	Vodovodní přípojka staveništi OL3 31.03. 01.05.											
549	SO 13-04/10	Kanalizační přípojka staveništi OL1	32 dny	20.05.22	21.06.22	2564 dny	2564 dny	Kanalizační přípojka staveništi OL1 20.05. 21.06.											
550	SO 13-04/20	Kanalizační přípojka staveništi OL2	32 dny	20.05.22	21.06.22	2506 dny	2506 dny	Kanalizační přípojka staveništi OL2 20.05. 21.06.											
551	SO 13-04/30	Kanalizační přípojka staveništi OL3	31 dny	31.03.29	01.05.29	151 dny	151 dny	Kanalizační přípojka staveništi OL3 31.03. 01.05.											
552	SO 13-06/10	El. Přípojka VN staveništi OL1 - přesun trafostanice	7 dny	07.07.22	14.07.22	2564 dny	2564 dny	El. Přípojka VN staveništi OL1 - přesun trafostanice 07.07. 14.07.											
553	SO 13-06/10D	El. přípojka VN staveništi OL1 - rušení	30 dny	30.07.29	29.08.29	31 dny	31 dny	El. přípojka VN staveništi OL1 - rušení 30.07. 29.08.											
554	SO 13-06/20	El. přípojka VN staveništi OL2	66 dny	21.06.22	26.08.22	2506 dny	2506 dny	El. přípojka VN staveništi OL2 21.06. 26.08.											
555	SO 13-06/20D	El. přípojka VN staveništi OL2 - rušení	30 dny	30.07.29	29.08.29	31 dny	31 dny	El. přípojka VN staveništi OL2 - rušení 30.07. 29.08.											
556	SO 13-06/30	El. přípojka NN staveništi OL3	15 dny	26.08.22	10.09.22	2506 dny	2506 dny	El. přípojka NN staveništi OL3 26.08. 10.09.											
557	SO 13-08	Ochrana pěšího provozu	2547 dny	01.06.22	31.07.29	60 dny	60 dny	Ochrana pěšího provozu 01.06. 31.07.											
558	SO 13-09	Ochrana inž. sítí	2509 dny	09.07.22	31.07.29	60 dny	60 dny	Ochrana inž. sítí 09.07. 31.07.											
559	SO 13-10	Demolice	322 dny	03.05.22	31.03.23	2314 dny	2314 dny	Demolice 03.05. 31.03.											
560	SO 13-11	Přístřešky MHD	12 dny	29.11.25	11.12.25	1 den	1 den	Přístřešky MHD 29.11. 11.12.											
561	SO 13-12	Úpravy horkovodní šachty	30 dny	04.06.23	04.07.23	21 dny	21 dny	Úpravy horkovodní šachty 04.06. 04.07.											
562	SO 13-13	Šachta pro výstavbu stanice	1617 dny	09.07.22	31.01.27	0 dny	267 dny	Šachta pro výstavbu stanice 1617 dny											
563		Hloubení	314 dny	09.07.22	29.05.23	0 dny	73 dny	Hloubení 314 dny											
564		Přípravné práce, vodící zidky	14 dny	09.07.22	23.07.22	73 dny	73 dny	Přípravné práce, vodící zidky 09.07. 23.07.											
565		Pilotové zajištění	40 dny	23.07.22	01.09.22	73 dny	73 dny	Pilotové zajištění 23.07. 01.09.											
566		Výstavba haly nad šachtou	85 dny	01.09.22	25.11.22	73 dny	73 dny	Výstavba haly nad šachtou 01.09. 25.11.											
567		Hloubení šachty po úroveň MP deštníku rozrážky	170 dny	25.11.22	24.05.23	73 dny	73 dny	Hloubení šachty po úroveň MP deštníku rozrážky 25.11. 24.05.											
568		Zpětný zásyp šachty po úroveň dna rozrážky kapliček	5 dny	24.05.23	29.05.23	73 dny	73 dny	Zpětný zásyp šachty po úroveň dna rozrážky kapliček 24.05. 29.05.											
569		Zásypy	90 dny	23.10.26	31.01.27	267 dny	267 dny	Zásypy 23.10. 31.01.											
570	SO 13-14	Zajištění povrchové zástavby	1237 dny	23.07.22	20.01.26	1318 dny	1318 dny	Zajištění povrchové zástavby 23.07. 20.01.											
571	SO 13-20	Stanice Olbrachtova	2174 dny	19.05.23	30.06.29	83 dny	91 dny	Stanice Olbrachtova 2174 dny											
572		Ražba a primární ostění	902 dny	19.05.23	26.11.25	83 dny	1 den	Ražba a primární ostění 902 dny											
573		Propojka Jih	30 dny	10.10.24	09.11.24	73 dny	73 dny	Propojka Jih 10.10. 09.11.											
574		Propojka Střed	45 dny	16.05.24	30.06.24	175 dny	175 dny	Propojka Střed 16.05. 30.06.											
575		Propojka Sever	240 dny	29.05.23	03.02.24	73 dny	91 dny	Propojka Sever 240 dny											
576		Ražba kapličky + MP deštník	42 dny	29.05.23	10.07.23	73 dny	73 dny	Ražba kapličky + MP deštník 29.05. 10.07.											
577		Ražba a primární ostění	100 dny	10.07.23	18.10.23	73 dny	73 dny	Ražba a primární ostění 10.07. 18.10.											
578		Odtěžba zásypu (kalota -> dno)	5 dny	29.01.24	03.02.24	91 dny	91 dny	Odtěžba zásypu (kalota -> dno) 29.01. 03.02.											
579		Technologický tunel - TGT - směr Krč	230 dny	05.01.25	23.08.25	1 den	1 den	Technologický tunel - TGT - směr Krč 05.01. 23.08.											
580		Technologický tunel - TGT - směr Pankrác	95 dny	23.08.25	26.11.25	1 den	1 den	Technologický tunel - TGT - směr Pankrác 23.08. 26.11.											
581		Pravý staniční tunel - PST	409 dny	18.08.23	10.10.24	1 den	73 dny	Pravý staniční tunel - PST 409 dny											
582		Zarážka směr Pankrác - kalota	12 dny	30.10.23	11.11.23	73 dny	73 dny	Zarážka směr Pankrác - kalota 30.10. 11.11.											
583		Zarážka směr Pankrác - opěří a dno	9 dny	14.04.24	23.04.24	8 dny	8 dny	Zarážka směr Pankrác - opěří a dno 14.04. 23.04.											
584		Zarážka směr Krč - kalota	8 dny	11.11.23	19.11.23	73 dny	73 dny	Zarážka směr Krč - kalota 11.11. 19.11.											

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag	Úkol Rozdělení Mílník	Souhrnný Souhrn projektu Neaktivní úkol	Neaktivní mílník Neaktivní souhrn Ruční úkol	Pouze s dobou trvání Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn	Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější úkoly	Vnější mílník Konečný termín Kritický	Kritické rozdělení Průběh Průběh ručně zadaného úkolu	Kritický
--	-----------------------------	---	--	--	---	---	---	----------

ID	Režim úlohu	Název úlohu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	
585		Ražba kaloty směr Krč	61 dny	19.11.23	29.01.24	73 dny	73 dny	Ražba kaloty směr Krč 19.11. 29.01.
586		Ražba opěří + dno směr Krč	18 dny	29.01.24	16.02.24	73 dny	73 dny	Ražba opěří + dno směr Krč 29.01. 16.02.
587		Ražba ze šachty OL2 směr Krč	237 dny	16.02.24	10.10.24	73 dny	73 dny	Ražba ze šachty OL2 směr Krč 16.02. 10.10.
588		Ražba od Pankráce z VO-OL k šachtě OL2	230 dny	18.08.23	14.04.24	1 den	1 den	Ražba od Pankráce z VO-OL k šachtě OL2 18.08. 14.04.
589		Zarážka krčků TGT z PST	16 dny	14.04.24	30.04.24	1 den	1 den	Zarážka krčků TGT z PST 14.04. 30.04.
590		Levý staniční tunel - LST	463 dny	19.05.23	03.09.24	128 dny	91 dny	Levý staniční tunel - LST 463 dny
591		Zarážka směr Pankrác	10 dny	10.10.23	20.10.23	73 dny	73 dny	Zarážka směr Pankrác 10.10. 20.10.
592		Zpětný zášyp pro ražbu kaloty	2 dny	20.10.23	22.10.23	73 dny	73 dny	Zpětný zášyp pro ražbu kaloty 20.10. 22.10.
593		Zarážka směr Krč - kalota	8 dny	22.10.23	30.10.23	73 dny	73 dny	Zarážka směr Krč - kalota 22.10. 30.10.
594		Ražba kaloty směr Krč	61 dny	19.11.23	29.01.24	91 dny	91 dny	Ražba kaloty směr Krč 19.11. 29.01.
595		Ražba opěří + dno směr Krč	42 dny	03.02.24	16.03.24	91 dny	91 dny	Ražba opěří + dno směr Krč 03.02. 16.03.
596		Ražba ze šachty OL2 směr Krč	171 dny	16.03.24	03.09.24	91 dny	91 dny	Ražba ze šachty OL2 směr Krč 16.03. 03.09.
597		Ražba od Pankráce z VO-OL k šachtě OL2	195 dny	19.05.23	30.11.23	128 dny	128 dny	Ražba od Pankráce z VO-OL k šachtě OL2 19.05. 30.11.
598		Zarážka krčků TGT z LST	30 dny	30.11.23	09.01.24	128 dny	128 dny	Zarážka krčků TGT z LST 30.11. 09.01.
599		Sekundární ostění včetně izolace	998 dny	09.01.24	23.10.26	113 dny	11 dny	Sekundární ostění včetně izolace 998 dny
600		Propojka Jih	75 dny	23.08.25	06.11.25	73 dny	73 dny	Propojka Jih 23.08. 06.11.
601		Propojka Střed	75 dny	06.10.25	20.12.25	73 dny	73 dny	Propojka Střed 06.10. 20.12.
602		Propojka Sever - spodní klenby, stěny, klenba	150 dny	08.02.26	08.07.26	73 dny	73 dny	Propojka Sever - spodní klenby, stěny, klenba 08.02. 08.07.
603		Propojka Sever - dokončení horní klenby	45 dny	08.09.26	23.10.26	11 dny	11 dny	Propojka Sever - dokončení horní klenby 08.09. 23.10.
604		Technologický tunel - dno	90 dny	12.12.25	22.03.26	1 den	1 den	Technologický tunel - dno 12.12. 22.03.
605		Technologický tunel - klenba	200 dny	20.02.26	08.09.26	1 den	1 den	Technologický tunel - klenba 20.02. 08.09.
606		Pravý staniční tunel - PST	501 dny	30.04.24	23.09.25	1 den	73 dny	Pravý staniční tunel - PST 501 dny
607		Ostění směr Krč - dno	90 dny	27.02.25	28.05.25	73 dny	73 dny	Ostění směr Krč - dno 27.02. 28.05.
608		Ostění směr Krč - klenba	148 dny	28.04.25	23.09.25	73 dny	73 dny	Ostění směr Krč - klenba 28.04. 23.09.
609		Ostění směr Pankrác - dno	60 dny	30.04.24	29.06.24	1 den	1 den	Ostění směr Pankrác - dno 30.04. 29.06.
610		Ostění směr Pankrác - klenba	180 dny	29.06.24	05.01.25	1 den	1 den	Ostění směr Pankrác - klenba 29.06. 05.01.
611		Levý staniční tunel - LST	505 dny	09.01.24	07.06.25	128 dny	73 dny	Levý staniční tunel - LST 505 dny
612		Ostění směr Krč - dno	90 dny	09.11.24	17.02.25	73 dny	73 dny	Ostění směr Krč - dno 09.11. 17.02.
613		Ostění směr Krč - klenba	140 dny	18.01.25	07.06.25	73 dny	73 dny	Ostění směr Krč - klenba 18.01. 07.06.
614		Ostění směr Pankrác - dno	30 dny	09.01.24	08.02.24	128 dny	128 dny	Ostění směr Pankrác - dno 09.01. 08.02.
615		Ostění směr Pankrác - klenba	180 dny	08.02.24	06.08.24	143 dny	143 dny	Ostění směr Pankrác - klenba 08.02. 06.08.
616		Vnitřní nosné konstrukce - stanice	240 dny	23.10.26	30.06.27	11 dny	11 dny	Vnitřní nosné konstrukce - stanice 23.10. 30.06.
617		Vnitřní nosné konstrukce - TGT	200 dny	08.09.26	06.04.27	1 den	1 den	Vnitřní nosné konstrukce - TGT 08.09. 06.04.
618		HSV + PSV práce pro montáž TG	285 dny	12.03.27	22.12.27	1 den	1 den	HSV + PSV práce pro montáž TG 12.03. 22.12.
619		Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	1 den	1 den	Ostatní HSV + PSV práce 02.01. 22.12.
620		Kabelové konstrukce	121 dny	23.08.27	22.12.27	1 den	1 den	Kabelové konstrukce 23.08. 22.12.
621		Architektura	355 dny	02.01.28	22.12.28	1 den	1 den	Architektura 02.01. 22.12.
622		Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	1 den	1 den	Dokončovací práce po TG 02.01. 31.03.
623		Dokončovací práce Architektura	90 dny	01.04.29	30.06.29	91 dny	91 dny	Dokončovací práce Architektura 01.04. 30.06.
624	SO 13-21	Vestibul jih	2158 dny	04.06.23	30.06.29	1 den	91 dny	Vestibul jih 2158 dny
625		Zakládání + Zemní práce	332 dny	04.06.23	11.05.24	1 den	1 den	Zakládání + Zemní práce 332 dny
626		Zakládání - východní část	50 dny	04.06.23	24.07.23	1 den	1 den	Zakládání - východní část 04.06. 24.07.
627		Protihluková stěna na východní stěně jámy	50 dny	04.07.23	23.08.23	31 dny	31 dny	Protihluková stěna na východní stěně jámy 04.07. 23.08.
628		Zakládání - západní část	50 dny	24.07.23	12.09.23	1 den	1 den	Zakládání - západní část 24.07. 12.09.
629		Protihluková stěna na západní stěně jámy	50 dny	23.08.23	12.10.23	31 dny	31 dny	Protihluková stěna na západní stěně jámy 23.08. 12.10.

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag

Úkol Rozdělení Mílník Neaktivní mílník Neaktivní souhm Ruční úkol Pouze s dobou trvání Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhm Vnější úkoly Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější mílník Konečný termín Critický Critické rozdělení Průběh Průběh ručně zadaného úkolu

■ Souhrnný Souhrn projektu ◆ Neaktivní úkol — Neaktivní mílník — Neaktivní souhm □ Ruční úkol ◇ Pouze s dobou trvání ▬ Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu ▬ Ruční souhm ▬ Vnější úkoly ▬ Pouze zahájení ▬ Pouze s datem dokončení ▬ Vnější mílník ▬ Konečný termín ▬ Critický ◆ Critické rozdělení ▬ Průběh ▬ Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 14

ID	Režim úkol	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	Gantt chart showing project progress from 2022 to 2030 across various tasks and milestones.											
630		Zakládání - dovtřetí čelních stěn	15 dny	12.09.23	27.09.23	16 dny	16 dny	Zakládání - dovtřetí čelních stěn 12.09. 27.09.											
631		Zemní práce - I. etapa + piloty pro kanalizaci	70 dny	12.10.23	21.12.23	1 den	1 den	Zemní práce - I. etapa + piloty pro kanalizaci 12.10. 21.12.											
632		Zemní práce II. etapa - dokončení	132 dny	21.12.23	11.05.24	1 den	1 den	Zemní práce II. etapa - dokončení 21.12. 11.05.											
633		Nosné konstrukce - I. etapa - mimo prostor pro práce v 275 dny ET	10.07.24	21.04.25	1 den	1 den		Nosné konstrukce - I. etapa - mimo prostor pro práce v ET 10.07. 21.04.											
634		Nosné konstrukce - II. etapa - dokončení u ET	150 dny	06.04.25	03.09.25	1 den	1 den	Nosné konstrukce - II. etapa - dokončení u ET 06.04. 03.09.											
635		Vnitřní nosné konstrukce	150 dny	06.04.25	03.09.25	91 dny	91 dny	Vnitřní nosné konstrukce 06.04. 03.09.											
636		Zásypy	60 dny	20.07.25	18.09.25	1 den	1 den	Zásypy 20.07. 18.09.											
637		HSV + PSV práce pro montáž TG	328 dny	28.01.27	22.12.27	91 dny	91 dny	HSV + PSV práce pro montáž TG 28.01. 22.12.											
638		Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny	Ostatní HSV + PSV práce 02.01. 22.12.											
639		Kabelové konstrukce	128 dny	16.08.27	22.12.27	91 dny	91 dny	Kabelové konstrukce 16.08. 22.12.											
640		Architektura	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny	Architektura 02.01. 22.12.											
641		Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	91 dny	91 dny	Dokončovací práce po TG 02.01. 31.03.											
642		Dokončovací práce Architektura	90 dny	01.04.29	30.06.29	91 dny	91 dny	Dokončovací práce Architektura 01.04. 30.06.											
643	SO 13-22	Vestibul sever	2408 dny	17.09.22	30.06.29	638 dny	91 dny	Vestibul sever 2408 dny											
644		Zakládání	28 dny	17.09.22	15.10.22	640 dny	640 dny	Zakládání 17.09. 15.10.											
645		Příprava pro hloubení jámy sever	30 dny	31.03.24	30.04.24	97 dny	97 dny	Příprava pro hloubení jámy sever 31.03. 30.04.											
646		Zemní práce pro ražbu ET sever	60 dny	06.05.24	05.07.24	91 dny	91 dny	Zemní práce pro ražbu ET sever 06.05. 05.07.											
647		Dohloubení jámy	60 dny	05.07.24	03.09.24	91 dny	91 dny	Dohloubení jámy 05.07. 03.09.											
648		Nosné konstrukce - 1. část - podkladní betony	20 dny	03.09.24	23.09.24	91 dny	91 dny	Nosné konstrukce - 1. část - podkladní betony 03.09. 23.09.											
649		Nosné konstrukce - 2. část	90 dny	10.12.25	20.03.26	91 dny	91 dny	Nosné konstrukce - 2. část 10.12. 20.03.											
650		Zásypy	60 dny	21.03.26	20.05.26	91 dny	91 dny	Zásypy 21.03. 20.05.											
651		HSV + PSV práce pro montáž TG	192 dny	13.06.27	22.12.27	91 dny	91 dny	HSV + PSV práce pro montáž TG 13.06. 22.12.											
652		Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny	Ostatní HSV + PSV práce 02.01. 22.12.											
653		Kabelové konstrukce	72 dny	11.10.27	22.12.27	91 dny	91 dny	Kabelové konstrukce 11.10. 22.12.											
654		Architektura	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny	Architektura 02.01. 22.12.											
655		Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	91 dny	91 dny	Dokončovací práce po TG 02.01. 31.03.											
656		Dokončovací práce Architektura	90 dny	01.04.29	30.06.29	91 dny	91 dny	Dokončovací práce Architektura 01.04. 30.06.											
657	SO 13-23	Eskaletorový tunel jižní	1826 dny	11.05.24	30.06.29	1 den	91 dny	Eskaletorový tunel jižní 1826 dny											
658		Ražba a primární ostění	230 dny	11.05.24	06.01.25	1 den	1 den	Ražba a primární ostění 11.05. 06.01.											
659		Sekundární ostění	150 dny	06.01.25	05.06.25	1 den	1 den	Sekundární ostění 06.01. 05.06.											
660		Vnitřní nosné konstrukce	100 dny	05.06.25	13.09.25	91 dny	91 dny	Vnitřní nosné konstrukce 05.06. 13.09.											
661		HSV + PSV práce pro montáž TG	304 dny	21.02.27	22.12.27	91 dny	91 dny	HSV + PSV práce pro montáž TG 21.02. 22.12.											
662		Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny	Ostatní HSV + PSV práce 02.01. 22.12.											
663		Kabelové konstrukce	104 dny	09.09.27	22.12.27	91 dny	91 dny	Kabelové konstrukce 09.09. 22.12.											
664		Architektura	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny	Architektura 02.01. 22.12.											
665		Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	91 dny	91 dny	Dokončovací práce po TG 02.01. 31.03.											
666		Dokončovací práce Architektura	90 dny	01.04.29	30.06.29	91 dny	91 dny	Dokončovací práce Architektura 01.04. 30.06.											
667	SO 13-24	Eskaletorový tunel severní	1691 dny	23.09.24	30.06.29	91 dny	91 dny	Eskaletorový tunel severní 1691 dny											
668		Ražba a primární ostění po TGT	120 dny	23.09.24	31.01.25	91 dny	91 dny	Ražba a primární ostění po TGT 23.09. 31.01.											
669		Ražba a primární ostění za TGT - I. část	81 dny	31.01.25	22.04.25	91 dny	91 dny	Ražba a primární ostění za TGT - I. část 31.01. 22.04.											
670		Injektáže do prostoru TGT	21 dny	22.04.25	13.05.25	91 dny	91 dny	Injektáže do prostoru TGT 22.04. 13.05.											
671		Ražba a primární ostění za TGT - II. část	81 dny	13.05.25	02.08.25	91 dny	91 dny	Ražba a primární ostění za TGT - II. část 13.05. 02.08.											
672		Sekundární ostění	130 dny	02.08.25	10.12.25	91 dny	91 dny	Sekundární ostění 02.08. 10.12.											
673		Vnitřní nosné konstrukce	104 dny	10.12.25	03.04.26	91 dny	91 dny	Vnitřní nosné konstrukce 10.12. 03.04.											
674		HSV + PSV práce pro montáž TG	188 dny	17.06.27	22.12.27	91 dny	91 dny	HSV + PSV práce pro montáž TG 17.06. 22.12.											

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag

Úkol Sochmny Neaktivní milník Pouze s dobou trvání Pouze zahájení Vnější milník Kritické rozdělení
Rozdělení Souhnm projekt Neaktivní souhnm Ruční úkoly zahrnuté v souhnmém úkolu Pouze s datem dokončení Konečný termin Průběh
Milník Neaktivní úkol Ruční úkol Ruční souhnm Vnější úkoly Kritický Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 15

Sjízdosti kolejeového svršku - termin bude upřesněn po koordinaci se stavbou LD1b
Tento HMG platí za předpokladu dodržení předpokládaného postupu prací ze ZD stavby LD1b (Olbrachtova) mimo - Nové Dvory aktualizace z 03/2022

ID	Režim úkolů	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	Gantt chart (2022-2030)											
675		Ostatní HSV + PSV práce	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny	Ostatní HSV + PSV práce 02.01.28 - 22.12.28											
676		Kabelové konstrukce	72 dny	11.10.27	22.12.27	91 dny	91 dny	Kabelové konstrukce 11.10.27 - 22.12.27											
677		Architektura	355 dny	02.01.28	22.12.28	91 dny	91 dny	Architektura 02.01.28 - 22.12.28											
678		Dokončovací práce po TG	88 dny	02.01.29	31.03.29	91 dny	91 dny	Dokončovací práce po TG 02.01.29 - 31.03.29											
679		Dokončovací práce Architektura	90 dny	01.04.29	30.06.29	91 dny	91 dny	Dokončovací práce Architektura 01.04.29 - 30.06.29											
680	SO 13-28	Drobná architektura	120 dny	01.04.29	30.07.29	61 dny	61 dny	Drobná architektura 01.04.29 - 30.07.29											
681		SSZ	1239 dny	21.06.22	11.12.25	0 dny	1 den	SSZ 21.06.22 - 11.12.25											
682	SO 13-31/10	Definitivní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška	72 dny	30.09.25	11.12.25	1 den	1 den	Definitivní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška 30.09.25 - 11.12.25											
683	SO 13-31/20	Provizorní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška a SSZ na objíždných trasách	1239 dny	21.06.22	11.12.25	1 den	1 den	Provizorní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška a SSZ na objíždných trasách 21.06.22 - 11.12.25											
684	SO 13-32/20	Provizorní SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži	1239 dny	21.06.22	11.12.25	1 den	1 den	Provizorní SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži 21.06.22 - 11.12.25											
685	SO 13-32/50	Definitivní koordinační kabel SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži	60 dny	31.08.25	30.10.25	1 den	1 den	Definitivní koordinační kabel SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži 31.08.25 - 30.10.25											
686	SO 13-32/60	Provizorní koordinační kabel SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži	1239 dny	21.06.22	11.12.25	1 den	1 den	Provizorní koordinační kabel SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži 21.06.22 - 11.12.25											
687		Komunikace	2534 dny	14.04.22	31.05.29	0 dny	121 dny	Komunikace 14.04.22 - 31.05.29											
688	SO 13-40	Provizorní dopravní značení	2534 dny	14.04.22	31.05.29	121 dny	121 dny	Provizorní dopravní značení 14.04.22 - 31.05.29											
689	SO 13-42	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - severní vestibul	60 dny	01.04.29	31.05.29	121 dny	121 dny	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - severní vestibul 01.04.29 - 31.05.29											
690	SO 13-43	Definitivní úprava povrchů pro stavbu	1307 dny	14.04.22	11.12.25	1 den	1 den	Definitivní úprava povrchů pro stavbu 14.04.22 - 11.12.25											
691		1.etapa - obousměrný režim dopravy	56 dny	14.04.22	09.06.22	1 den	1 den	1.etapa - obousměrný režim dopravy 14.04.22 - 09.06.22											
692		2.etapa - obousměrný režim dopravy	12 dny	09.06.22	21.06.22	1 den	1 den	2.etapa - obousměrný režim dopravy 09.06.22 - 21.06.22											
693		3.etapa - jednosměrný režim dopravy	273 dny	21.06.22	31.03.23	1 den	1 den	3.etapa - jednosměrný režim dopravy 21.06.22 - 31.03.23											
694		4.etapa - ulice Na Strži - neprůjezdná	965 dny	01.04.23	11.12.25	1 den	1 den	4.etapa - ulice Na Strži - neprůjezdná 01.04.23 - 11.12.25											
695	SO 13-44	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - jižní vestibul	60 dny	01.04.29	31.05.29	1 den	1 den	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - jižní vestibul 01.04.29 - 31.05.29											
696	SO 13-45	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Na Strži	60 dny	30.10.25	08.01.26	1 den	1330 dny	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Na Strži 30.10.25 - 08.01.26											
697		I.etapa - komunikace	30 dny	30.10.25	29.11.25	1 den	1 den	I.etapa - komunikace 30.10.25 - 29.11.25											
698		II.etapa - chodníky + dokončovací práce	30 dny	29.11.25	08.01.26	1330 dny	1330 dny	II.etapa - chodníky + dokončovací práce 29.11.25 - 08.01.26											
699	SO 13-49	Informační systém	355 dny	02.01.28	22.12.28	271 dny	271 dny	Informační systém 02.01.28 - 22.12.28											
700	SO 13-50	Definitivní dopravní značení	12 dny	29.11.25	11.12.25	1 den	1 den	Definitivní dopravní značení 29.11.25 - 11.12.25											
701																			
702		Přeložky IS	1461 dny	09.06.22	19.07.26	0 dny	227 dny	Přeložky IS 09.06.22 - 19.07.26											
703	SO 13-51/10	Přeložka vodovodu DN300, DN200 - definitivní	60 dny	16.01.23	17.03.23	4 dny	4 dny	Přeložka vodovodu DN300, DN200 - definitivní 16.01.23 - 17.03.23											
704	SO 13-51/11	Rušení vodovodu DN300, 200	60 dny	17.03.23	16.05.23	4 dny	4 dny	Rušení vodovodu DN300, 200 17.03.23 - 16.05.23											
705	SO 13-52/10	Přeložka vodovodu DN200 - definitivní	60 dny	31.08.25	30.10.25	1 den	1 den	Přeložka vodovodu DN200 - definitivní 31.08.25 - 30.10.25											
706	SO 13-52/11	Rušení vodovodu DN200	30 dny	02.05.23	01.06.23	4 dny	4 dny	Rušení vodovodu DN200 02.05.23 - 01.06.23											
707	SO 13-52/20	Přeložka vodovodu DN200 - provizorní	52 dny	18.10.22	09.12.22	4 dny	4 dny	Přeložka vodovodu DN200 - provizorní 18.10.22 - 09.12.22											
708	SO 13-53/10	Přeložka vodovodu DN200-sever - definitivní	88 dny	21.06.22	17.09.22	1 den	1 den	Přeložka vodovodu DN200-sever - definitivní 21.06.22 - 17.09.22											
709	SO 13-53/11	Rušení vodovodu DN200-sever	81 dny	08.08.22	28.10.22	1 den	1 den	Rušení vodovodu DN200-sever 08.08.22 - 28.10.22											
710	SO 13-53/20	Přepojení stáv. vodov. přípojky - provizorní	254 dny	02.11.22	24.07.23	0 dny	1 den	Přepojení stáv. vodov. přípojky - provizorní 02.11.22 - 24.07.23											
711		I.etapa - východní část	170 dny	02.11.22	01.05.23	1 den	1 den	I.etapa - východní část 02.11.22 - 01.05.23											
712		II.etapa - západní část	114 dny	01.04.23	24.07.23	1 den	1 den	II.etapa - západní část 01.04.23 - 24.07.23											
713	SO 13-54/10	Přeložka kanalizace DN600/1100 - definitivní	555 dny	04.07.22	30.01.24	0 dny	1 den	Přeložka kanalizace DN600/1100 - definitivní 04.07.22 - 30.01.24											
714		I.etapa - přeložka včetně šachet	395 dny	04.07.22	13.08.23	1 den	1 den	I.etapa - přeložka včetně šachet 04.07.22 - 13.08.23											
715		II.etapa - pokládka v jámě + přepojení	60 dny	21.11.23	30.01.24	1 den	1 den	II.etapa - pokládka v jámě + přepojení 21.11.23 - 30.01.24											
716	SO 13-54/11	Rušení kanalizace DN600/1100	40 dny	21.12.23	09.02.24	1 den	1 den	Rušení kanalizace DN600/1100 21.12.23 - 09.02.24											
717	SO 13-54/20	Přepojení stáv. kanál. přípojek - provizorní	60 dny	21.11.23	30.01.24	1 den	1 den	Přepojení stáv. kanál. přípojek - provizorní 21.11.23 - 30.01.24											
718		Přepojení stáv. kanál. Přípojek - definitivní	60 dny	31.08.25	30.10.25	1 den	1 den	Přepojení stáv. kanál. Přípojek - definitivní 31.08.25 - 30.10.25											
719	SO 13-61	Přeložka NTL plynovodu dn160 - definitivní	60 dny	31.08.25	30.10.25	1 den	1 den	Přeložka NTL plynovodu dn160 - definitivní 31.08.25 - 30.10.25											

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag

Úkol Rozdělení Mílník Souhrnný Souhrn projektu Neaktivní úkol Neaktivní mílník Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější mílník Konečný termín Kritický Kritické rozdělení Průběh Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 16

Sjízdnosti kolejevého svršku - termín bude upřesněn po koordinaci se stavbou LD1b
Tento HMG platí za předpokladu dodržení předpokládaného postupu prací ze ZD stavby LD1b (Olbrachtova) mimo - Nové Dvory aktualizace z 03/2022


ID	Režim úkolů	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	Gantt chart showing project progress from 2022 to 2030 across various tasks and milestones.											
720	SO 13-62	Přeložka NTL plynovodu DN150 - provizorní	276 dny	09.01.23	12.10.23	61 dny	1 den	Přeložka NTL plynovodu DN150 - provizorní 276 dny											
721		I.etapa - východní část	216 dny	09.01.23	13.08.23	61 dny	61 dny	I.etapa - východní část 09.01. 13.08.											
722		II.etapa - západní část	114 dny	20.06.23	12.10.23	1 den	1 den	II.etapa - západní část 20.06. 12.10.											
723	SO 13-67/10	Kanalizační přípojky odvodnění - sever	100 dny	09.06.22	17.09.22	1 den	1 den	Kanalizační přípojky odvodnění - sever 09.06. 17.09.											
724	SO 13-67/20	Kanalizační přípojky odvodnění - jih	60 dny	31.08.25	30.10.25	1 den	1 den	Kanalizační přípojky odvodnění - jih 31.08. 30.10.											
725	SO 13-68/10	Vodovodní přípojka stanice - sever	60 dny	20.05.26	19.07.26	227 dny	227 dny	Vodovodní přípojka stanice - sever 20.05. 19.07.											
726	SO 13-68/11	Vodovodní přípojka stanice - jih	60 dny	31.08.25	30.10.25	1 den	1 den	Vodovodní přípojka stanice - jih 31.08. 30.10.											
727	SO 13-69/10	Kanalizační přípojka stanice - sever	100 dny	09.06.22	17.09.22	1 den	1 den	Kanalizační přípojka stanice - sever 09.06. 17.09.											
728	SO 13-69/11	Kanalizační přípojka stanice - jih	60 dny	31.08.25	30.10.25	1 den	1 den	Kanalizační přípojka stanice - jih 31.08. 30.10.											
729		Přeložky Elektro	1260 dny	19.04.22	30.10.25	0 dny	1 den	Přeložky Elektro 1260 dny											
730	SO 13-72/10	Definitivní přeložky a ochrana sítě 22 kV PŘEdi a.s. - 1.jáma	30 dny	09.06.22	09.07.22	60 dny	60 dny	Definitivní přeložky a ochrana sítě 22 kV PŘEdi a.s. - 1.jáma 09.06. 09.07.											
731	SO 13-72/20	Definitivní přeložky a ochrana sítě 22 kV a diferenciálních PŘEdi a.s. - 2.jáma	300 dny	17.09.22	24.07.23	1 den	1 den	Definitivní přeložky a ochrana sítě 22 kV a diferenciálních PŘEdi a.s. - 2.jáma 17.09. 24.07.											
732	SO 13-73	Provizorní přeložka a ochrana kabelů NN PŘEdi a.s.	400 dny	09.06.22	24.07.23	0 dny	1 den	Provizorní přeložka a ochrana kabelů NN PŘEdi a.s. 400 dny											
733		1.etapa	30 dny	09.06.22	09.07.22	87 dny	87 dny	1.etapa 09.06. 09.07.											
734		2.etapa - východní část	216 dny	17.09.22	01.05.23	1 den	1 den	2.etapa - východní část 17.09. 01.05.											
735		3. etapa - západní část	114 dny	01.04.23	24.07.23	1 den	1 den	3. etapa - západní část 01.04. 24.07.											
736	SO 13-74	Definitivní přeložka a ochrana kabelů NN PŘEdi a.s.	60 dny	31.08.25	30.10.25	1 den	1 den	Definitivní přeložka a ochrana kabelů NN PŘEdi a.s. 31.08. 30.10.											
737	SO 13-75/10	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO) - 2.jáma	1200 dny	19.04.22	31.08.25	1 den	1 den	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO) - 2.jáma 19.04. 31.08.											
738	SO 13-76/10	Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) - 2.jáma	60 dny	31.08.25	30.10.25	1 den	1 den	Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) - 2.jáma 31.08. 30.10.											
739		Přeložky SLP	1707 dny	09.06.22	01.04.27	60 dny	267 dny	Přeložky SLP 1707 dny											
740	koordinace s SO 13-80/01D	Přeložka kabelů Cetin - I. Etapa - definitivní - není součástí dodávky	92 dny	01.07.22	01.10.22	367 dny	367 dny	Přeložka kabelů Cetin - I. Etapa - definitivní - není součástí dodávky 01.07. 01.10.											
741	koordinace s SO 13-80/01P	Přeložka kabelů Cetin - II. Etapa - provizorní - není součástí dodávky	30 dny	09.06.22	09.07.22	60 dny	60 dny	Přeložka kabelů Cetin - II. Etapa - provizorní - není součástí dodávky 09.06. 09.07.											
742	SO 13-81/01D	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T Systems) - I. etapa - definitivní	92 dny	01.07.22	01.10.22	367 dny	367 dny	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T Systems) - I. etapa - definitivní 01.07. 01.10.											
743	SO 13-81/01P	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T Systems) - I. etapa - provizorní	30 dny	09.06.22	09.07.22	60 dny	60 dny	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T Systems) - I. etapa - provizorní 09.06. 09.07.											
744	SO 13-81/02	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) - II. etapa	60 dny	31.01.27	01.04.27	267 dny	267 dny	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) - II. etapa 31.01. 01.04.											
745	SO 13-81/03	Přeložka kabelů Pražské Teplárenské	92 dny	01.07.22	01.10.22	367 dny	367 dny	Přeložka kabelů Pražské Teplárenské 01.07. 01.10.											
746	SO 13-82/01D	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - I. etapa - definitivní	78 dny	01.07.22	17.09.22	381 dny	381 dny	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - I. etapa - definitivní 01.07. 17.09.											
747	SO 13-82/01P	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - I. etapa - provizorní	30 dny	09.06.22	09.07.22	60 dny	60 dny	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - I. etapa - provizorní 09.06. 09.07.											
748	SO 13-82/02	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - II. etapa	60 dny	31.01.27	01.04.27	267 dny	267 dny	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - II. etapa 31.01. 01.04.											
749	SO 13-83/01	Přeložka kabelů UPC - I. etapa	30 dny	09.06.22	09.07.22	60 dny	60 dny	Přeložka kabelů UPC - I. etapa 09.06. 09.07.											
750	SO 13-83/02	Přeložka kabelů UPC - II. etapa	60 dny	31.01.27	01.04.27	267 dny	267 dny	Přeložka kabelů UPC - II. etapa 31.01. 01.04.											
751	SO 13-90/11	Konstrukce pro provizorní vedení inž. sítě	100 dny	04.07.23	12.10.23	41 dny	1 den	Konstrukce pro provizorní vedení inž. sítě 100 dny											
752		1.etapa	40 dny	04.07.23	13.08.23	41 dny	41 dny	1.etapa 04.07. 13.08.											
753		2.etapa	40 dny	02.09.23	12.10.23	1 den	1 den	2.etapa 02.09. 12.10.											
754	SO 13-90/21	Terénní úpravy	90 dny	01.05.29	30.07.29	1 den	1 den	Terénní úpravy 01.05. 30.07.											
755	SO 13-90/31	Sadové úpravy	90 dny	30.06.29	28.09.29	1 den	1 den	Sadové úpravy 30.06. 28.09.											
756	SO 13-90/51	Protihluková opatření	405 dny	14.04.22	03.06.23	2 dny	2 dny	Protihluková opatření 14.04. 03.06.											
757		Protihluková opatření pro VS a ETS	30 dny	01.03.24	31.03.24	97 dny	97 dny	Protihluková opatření pro VS a ETS 01.03. 31.03.											
758		STP pro technologii	0 dny	22.12.27	22.12.27	627 dny	627 dny	STP pro technologii 22.12.											
759		Technologie	444 dny	02.01.28	31.03.29	0 dny	0 dny	Technologie 444 dny											
760		Stavební objekty	356 dny	02.01.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Stavební objekty 356 dny											
761	SO 13-91/21	Sílové rozvody ve stanicích Olbrachtova	356 dny	02.01.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Sílové rozvody ve stanicích Olbrachtova 02.01. 02.01.											
762	SO 13-91/61.1	Osvětlení stanice	356 dny	02.01.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Osvětlení stanice 02.01. 02.01.											
763	SO 13-91/61.2	Osvětlení stanice - ASDR-O	356 dny	02.01.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Osvětlení stanice - ASDR-O 02.01. 02.01.											
764	SO 13-91/92	Požární těsnění	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Požární těsnění 30.06. 02.01.											

ID	Režim úkol	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	Gantt chart timeline (2022-2030)											
765		SO 13-93/01	Sdílovací kabely v tr. úseku OL-NZ	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Sdílovací kabely v tr. úseku OL-NZ 30.06. 02.01.											
766		SO 13-93/11	VKV spojení ve stanici	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	VKV spojení ve stanici 30.06. 02.01.											
767		SO 13-93/12	Radiová síť TSM 400 ve stanici Olbrachtova	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Radiová síť TSM 400 ve stanici Olbrachtova 30.06. 02.01.											
768		SO 13-93/13	Radiová síť MRS TETRA ve stanici Olbrachtova	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Radiová síť MRS TETRA ve stanici Olbrachtova 30.06. 02.01.											
769		SO 13-93/14	Radiová síť - vyzařovací kabel v tr. úseku	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Radiová síť - vyzařovací kabel v tr. úseku 30.06. 02.01.											
770		SO 13-93/21	Pracoviště dozorčího stanice č.m.201	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Pracoviště dozorčího stanice č.m.201 30.06. 02.01.											
771		SO 13-93/31	Zařízení průmyslové televize ve stanici Olbrachtova	296 dny	02.03.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Zařízení průmyslové televize ve stanici Olbrachtova 02.03. 02.01.											
772		SO 13-93/41	Automatizace odbavování cestujících ve stanici OL	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Automatizace odbavování cestujících ve stanici OL 30.06. 02.01.											
773		SO 13-93/51	Telefonní zařízení ve stanici Olbrachtova	296 dny	02.03.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Telefonní zařízení ve stanici Olbrachtova 02.03. 02.01.											
774		SO 13-93/52	Datová síť ve stanici Olbrachtova	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Datová síť ve stanici Olbrachtova 30.06. 02.01.											
775		SO 13-93/53	Technologická síť ve stanici Olbrachtova	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Technologická síť ve stanici Olbrachtova 30.06. 02.01.											
776		SO 13-93/54	Strukturovaná kabeláž pro OV ve stanici Olbrachtova	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Strukturovaná kabeláž pro OV ve stanici Olbrachtova 30.06. 02.01.											
777		SO 13-93/61	Rozhlasové zařízení ve stanici OL	296 dny	02.03.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Rozhlasové zařízení ve stanici OL 02.03. 02.01.											
778		SO 13-93/71	Hodinové a informační zařízení ve stanici Olbrachtova	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Hodinové a informační zařízení ve stanici Olbrachtova 30.06. 02.01.											
779		SO 13-93/81	Elektrická požární signalizace ve stanici Olbrachtova	296 dny	02.03.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Elektrická požární signalizace ve stanici Olbrachtova 02.03. 02.01.											
780		SO 13-93/91	Elektrická zabezpečovací signalizace ve stanici OL	296 dny	02.03.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Elektrická zabezpečovací signalizace ve stanici OL 02.03. 02.01.											
781		SO 13-93/92	Přístupový systém ve stanici OL	176 dny	30.06.28	02.01.29	0 dny	0 dny	Přístupový systém ve stanici OL 30.06. 02.01.											
782			Energetická páteř trasy	0 dny	15.11.28	15.11.28	0 dny	0 dny	Energetická páteř trasy 15.11.											
783			Harmonogram funkčních zkoušek a revizí zhotovitele - stanice Olbrachtova	87 dny	03.01.29	31.03.29	0 dny	0 dny	Harmonogram funkčních zkoušek a revizí zhotovitele - stanice Olbrachtova 87 dny											
784			Individuální zkoušky slaboproudých systémů (telefonní, datové, technologické sítě, EPS, EZS) OL	31 dny	12.01.29	12.02.29	0 dny	0 dny	Individuální zkoušky slaboproudých systémů (telefonní, datové, technologické sítě, EPS, EZS) OL 12.01. 12.02.											
785			Individuální zkoušky silnoproudých systémů (silové rozvody, osvětlení) OL	40 dny	03.01.29	12.02.29	0 dny	0 dny	Individuální zkoušky silnoproudých systémů (silové rozvody, osvětlení) OL 03.01. 12.02.											
786			Individuální zkoušky technologií (VZT, větrání, eskalátory, výtahy) OL	20 dny	09.01.29	29.01.29	14 dny	14 dny	Individuální zkoušky technologií (VZT, větrání, eskalátory, výtahy) OL 09.01. 29.01.											
787			Individuální zkoušky technologií (čerpací stanice, tunelovod) OL	20 dny	09.01.29	29.01.29	14 dny	14 dny	Individuální zkoušky technologií (čerpací stanice, tunelovod) OL 09.01. 29.01.											
788			Individuální zkoušky ASDŘ T, O, E OL	20 dny	12.02.29	04.03.29	0 dny	0 dny	Individuální zkoušky ASDŘ T, O, E OL 12.02. 04.03.											
789			Zkoušky komunikace mezi jednotlivými technologiemi, prověření vazeb PND, OL, CD	26 dny	04.03.29	30.03.29	0 dny	0 dny	Zkoušky komunikace mezi jednotlivými technologiemi, prověření vazeb PND, OL, CD 04.03. 30.03.											
790			Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 27 měření / revizí	26 dny	04.03.29	30.03.29	0 dny	0 dny	Měření, revize, dokumenty pro DOSS - 27 měření / revizí 04.03. 30.03.											
791			Úpravy, opravy zařízení po individuálních zkouškách, podklady pro DSPS	26 dny	04.03.29	30.03.29	0 dny	0 dny	Úpravy, opravy zařízení po individuálních zkouškách, podklady pro DSPS 04.03. 30.03.											
792			Dokončení stavební části TG / připravenost na komplexní zkoušky	0 dny	31.03.29	31.03.29	0 dny	0 dny	Dokončení stavební části TG / připravenost na komplexní zkoušky 31.03.											
793		SO 13-94/1	Pohyblivé schody	354 dny	01.04.28	31.03.29	38 dny	0 dny	Pohyblivé schody 354 dny											
794			Montáž eskalátorů	150 dny	01.04.28	29.08.28	38 dny	38 dny	01.04. Montáž eskalátorů 29.08.											
795			Oplaštění eskalátorů	60 dny	29.08.28	28.10.28	38 dny	38 dny	29.08. Oplaštění eskalátorů 28.10.											
796			Oživení eskalátorů	60 dny	15.11.28	24.01.29	0 dny	0 dny	15.11. Oživení eskalátorů 24.01.											
797			Dokončovací práce	60 dny	25.01.29	26.03.29	0 dny	0 dny	25.01. Dokončovací práce 26.03.											
798			Zahájení zkoušek	0 dny	31.03.29	31.03.29	0 dny	0 dny	31.03. Zahájení zkoušek											
799		SO 13-94/2	Výtahy	354 dny	01.04.28	31.03.29	38 dny	0 dny	Výtahy 354 dny											
800			Montáž výtahů	150 dny	01.04.28	29.08.28	38 dny	38 dny	01.04. Montáž výtahů 29.08.											
801			Oplaštění výtahů	60 dny	29.08.28	28.10.28	38 dny	38 dny	29.08. Oplaštění výtahů 28.10.											
802			Oživení výtahů	60 dny	15.11.28	24.01.29	0 dny	0 dny	15.11. Oživení výtahů 24.01.											
803			Dokončovací práce	60 dny	25.01.29	26.03.29	0 dny	0 dny	25.01. Dokončovací práce 26.03.											
804			Zahájení zkoušek	0 dny	31.03.29	31.03.29	0 dny	0 dny	31.03. Zahájení zkoušek											
805		SO 13-94/3	Čerpací stanice	378 dny	02.01.28	24.01.29	92 dny	14 dny	Čerpací stanice 378 dny											
806			Hrubá montáž	240 dny	02.01.28	29.08.28	92 dny	92 dny	02.01. Hrubá montáž 29.08.											
807			Zprovoznění čerpání	60 dny	15.11.28	24.01.29	14 dny	14 dny	15.11. Zprovoznění čerpání 24.01.											
808		SO 13-95/1	Hlavní větrání	378 dny	02.01.28	24.01.29	92 dny	14 dny	Hlavní větrání 378 dny											
809			Hrubá montáž	240 dny	02.01.28	29.08.28	92 dny	92 dny	02.01. Hrubá montáž 29.08.											

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag

Úkol Rozdělení Mílník Souhrnný Souhrn projektu Neaktivní úkol Neaktivní mílník Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější úkoly Vnější mílník Konečný termín Kritický Kritické rozdělení Průběh Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Režim úkol	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
810		Zprovoznění větrání	60 dny	15.11.28	24.01.29	14 dny	14 dny									
811	SO 13-95/2	Staniční VZT ve st.Olbrachtova	356 dny	02.01.28	02.01.29	36 dny	36 dny									
812	SO 13-95/3	Větrání EGB ve st.Olbrachtova	356 dny	02.01.28	02.01.29	36 dny	36 dny									
813	SO 13-96	ASDR - Technologický systém	356 dny	02.01.28	02.01.29	41 dny	41 dny									
814		Dokončení stavebních prací na SOD13 mimo terénních a sadových úprav a likvidace ZS	0 dny	31.07.29	31.07.29	60 dny	60 dny									
815																
816	SOD 51	SPOLEČNÉ OBJEKTY TRASY	851 dny	11.05.26	28.09.28	0 dny	356 dny									
817	SO 51-21	Kolejový svršek	580 dny	11.05.26	22.12.27	0 dny	0 dny									
818	SOD 11		215 dny	21.05.27	22.12.27	0 dny	0 dny									
819		Kolejové betony	105 dny	21.05.27	03.09.27	0 dny	0 dny									
820		Kolejový svršek	125 dny	19.08.27	22.12.27	0 dny	0 dny									
821	SOD 13		215 dny	16.01.27	19.08.27	0 dny	0 dny									
822		Kolejové betony	30 dny	16.01.27	15.02.27	0 dny	0 dny									
823		Kolejový svršek	60 dny	20.06.27	19.08.27	0 dny	0 dny									
824	SOD 12		275 dny	08.09.26	20.06.27	0 dny	0 dny									
825		Kolejové betony - směr PA	90 dny	15.02.27	16.05.27	0 dny	0 dny									
826		Kolejové betony - směr OL	120 dny	08.09.26	16.01.27	0 dny	0 dny									
827		Kolejový svršek	105 dny	07.03.27	20.06.27	0 dny	0 dny									
828	SOD 71		290 dny	11.05.26	07.03.27	0 dny	0 dny									
829		Kolejové betony	120 dny	11.05.26	08.09.26	0 dny	0 dny									
830		Kolejový svršek	120 dny	28.10.26	07.03.27	0 dny	0 dny									
831		Sjízdnost 1.TK	0 dny	30.09.27	30.09.27	0 dny	0 dny									
832		Dokončení kolejového svršku	0 dny	22.12.27	22.12.27	0 dny	0 dny									
833	SO 51-23	Tunelový vodovod	270 dny	02.01.28	28.09.28	356 dny	356 dny									
834	SO 51-24	Kontrolní měřicí objekty pro měření blud. proudů ve stav. konstr. metra	270 dny	02.01.28	28.09.28	356 dny	356 dny									
835	SO 51-25	Kontrolní a měřicí objekty bludných proudů na inž. sítích	270 dny	02.01.28	28.09.28	356 dny	356 dny									
836	SO 51-30/02	Úpravy informačního systému - provizorní stavy	270 dny	02.01.28	28.09.28	356 dny	356 dny									
837	SO 51-30/03	Úpravy informačního systému - číslování místnosti dle směrnice DPP	270 dny	02.01.28	28.09.28	356 dny	356 dny									
838	SO 51-51	Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Pankrác	270 dny	02.01.28	28.09.28	356 dny	356 dny									
839	SO 51-53	Dozbrojení TR 9940 110/22 kV PRÉdistribuce Pankrác	270 dny	02.01.28	28.09.28	356 dny	356 dny									
840	SO 51-55	Obchodní měření spotřeby el. energie pro stanici metra Pankrác	90 dny	31.05.28	29.08.28	386 dny	386 dny									
841	SO 51-91/31	Uzemnění metra	270 dny	02.01.28	28.09.28	356 dny	356 dny									
842	SO 51-97/31	Zařízení a prostředky pro čištění	90 dny	31.05.28	29.08.28	386 dny	386 dny									
843	SO 51-97/51	Prostředky požární ochrany	90 dny	31.05.28	29.08.28	386 dny	386 dny									
844																
845	SOD 71	SPOJKA C-D	1986 dny	02.04.23	28.10.28	0 dny	84 dny									
846	SO 71-15	Úpravy pro napojení LD/LC - I. etapa	45 dny	25.08.23	09.10.23	350 dny	350 dny									
847	SO 71-15	Úpravy pro napojení LD/LC - II. etapa	30 dny	10.02.26	12.03.26	650 dny	650 dny									
848	SO 71-20	Ražený jednokolejný tunel spojky C-D	1560 dny	02.04.23	19.08.27	0 dny	210 dny									
849		Ražba a primární ostění	540 dny	02.04.23	03.10.24	0 dny	0 dny									
850		Probourání do stanice Pankrác C	30 dny	03.10.24	02.11.24	0 dny	0 dny									
851		Sekundární ostění - dno	120 dny	02.11.24	12.03.25	0 dny	0 dny									
852		Sekundární ostění - klenba	300 dny	12.03.25	16.01.26	0 dny	0 dny									
853		Kabelové konstrukce	75 dny	05.06.27	19.08.27	210 dny	210 dny									
854	SO 71-91/41	Kabelové vedení 22 kV spojka C-D	300 dny	02.01.28	28.10.28	84 dny	84 dny									

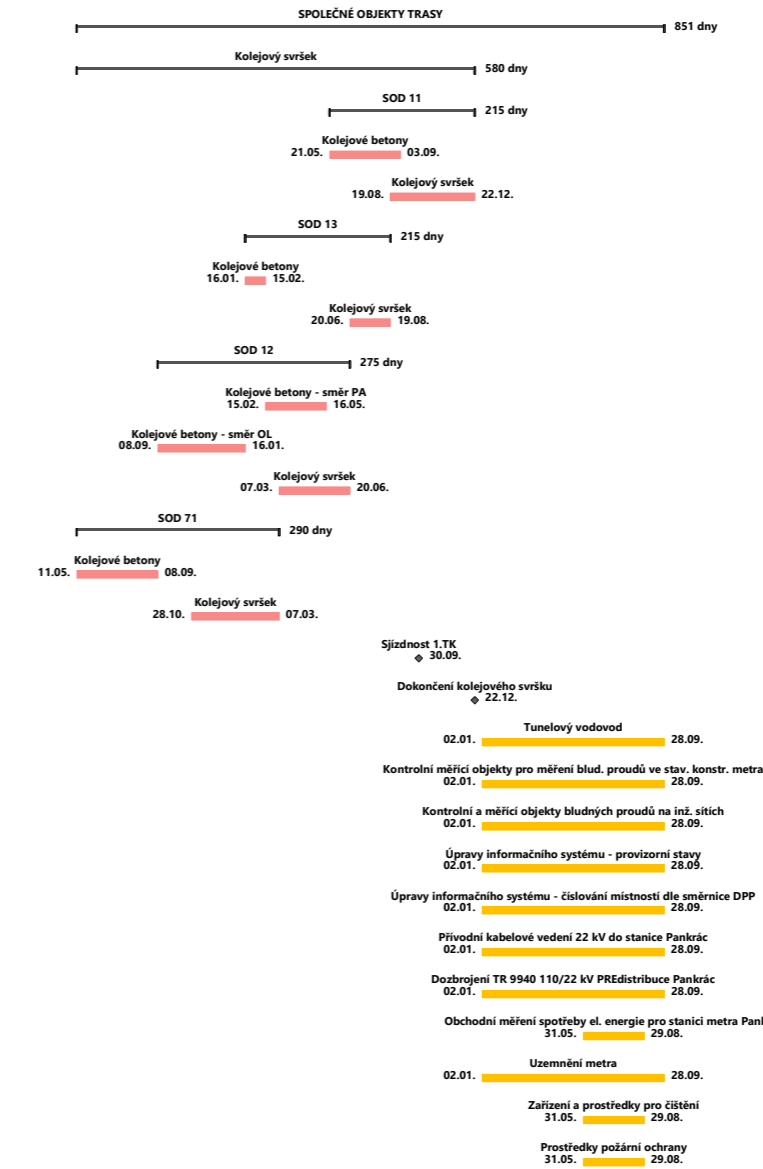

Metro LD1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag

Úkol: Rozdělení, Mílník, Souhrnný, Souhrn projektu, Neaktivní úkol, Neaktivní mílník, Neaktivní souhrn, Ruční úkol

Pouze s dobou trvání, Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu, Ruční souhrn, Vnější úkoly

Pouze zahájení, Pouze s datem dokončení, Vnější mílník, Konečný termín, Kritický, Kritické rozdělení, Průběh, Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 19

Sjízdnosti kolejového svršku - termín bude upřesněn po koordinaci se stavbou LD1b
Tento HMG platí za předpokladu dodržení předpokládaného postupu prací ze ZD stavby LD1b (Olbrachtova) mimo - Nové Dvory aktualizace z 03/2022

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva zahájení	Časová rezerva dokončení	Gantt chart timeline (2022-2030)											
855								Timeline grid from 2022 to 2030											
856	VON	Vedlejší a ostatní náklady	2667 dny	01.04.22	28.09.29	1 den	1 den	Vedlejší a ostatní náklady											
857	VON 01	Zařízení staveniště	2664 dny	04.04.22	28.09.29	11 dny	1 den	Zařízení staveniště											
858	ZS-1-PAD1-1	Zařízení staveniště PAD 1 - zřízení	120 dny	14.04.22	12.08.22	1 den	1 den	Zařízení staveniště PAD 1 - zřízení											
859	ZS-1-PAD1-2	Zařízení staveniště PAD 1 - provoz	2564 dny	14.05.22	30.07.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště PAD 1 - provoz											
860	ZS-1-PAD1-3	Zařízení staveniště PAD 1 - odstranění	120 dny	31.05.29	28.09.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště PAD 1 - odstranění											
861	ZS-2-PAD2-1	Zařízení staveniště PAD 2 - zřízení	120 dny	14.04.22	12.08.22	1 den	1 den	Zařízení staveniště PAD 2 - zřízení											
862	ZS-2-PAD2-2	Zařízení staveniště PAD 2 - provoz	2564 dny	14.05.22	30.07.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště PAD 2 - provoz											
863	ZS-2-PAD2-3	Zařízení staveniště PAD 2 - odstranění	120 dny	31.05.29	28.09.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště PAD 2 - odstranění											
864	ZS-3-PAD3-1	Zařízení staveniště PAD 3 - zřízení	30 dny	04.04.22	04.05.22	1885 dny	1885 dny	Zařízení staveniště PAD 3 - zřízení											
865	ZS-3-PAD3-2	Zařízení staveniště PAD 3 - provoz	720 dny	04.05.22	13.05.24	1885 dny	1885 dny	Zařízení staveniště PAD 3 - provoz											
866	ZS-3-PAD3-3	Zařízení staveniště PAD 3 - odstranění	30 dny	13.05.24	12.06.24	1885 dny	1885 dny	Zařízení staveniště PAD 3 - odstranění											
867	ZS-4-PAD4-1	Zařízení staveniště PAD 4 - zřízení	120 dny	14.04.22	12.08.22	1 den	1 den	Zařízení staveniště PAD 4 - zřízení											
868	ZS-4-PAD4-2	Zařízení staveniště PAD 4 - provoz	2564 dny	14.05.22	30.07.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště PAD 4 - provoz											
869	ZS-4-PAD4-3	Zařízení staveniště PAD 4 - odstranění	120 dny	31.05.29	28.09.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště PAD 4 - odstranění											
870	ZS-5-PAD5-1	Zařízení staveniště PAD 5 - zřízení	7 dny	31.03.27	07.04.27	795 dny	795 dny	Zařízení staveniště PAD 5 - zřízení											
871	ZS-5-PAD5-2	Zařízení staveniště PAD 5 - provoz	84 dny	07.04.27	30.06.27	795 dny	795 dny	Zařízení staveniště PAD 5 - provoz											
872	ZS-5-PAD5-3	Zařízení staveniště PAD 5 - odstranění	7 dny	30.06.27	07.07.27	795 dny	795 dny	Zařízení staveniště PAD 5 - odstranění											
873	ZS-5-VO-OL-1	Zařízení staveniště VO-OL - zřízení	120 dny	14.04.22	12.08.22	1 den	1 den	Zařízení staveniště VO-OL - zřízení											
874	ZS-5-VO-OL-2	Zařízení staveniště VO-OL - provoz	2595 dny	14.05.22	30.08.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště VO-OL - provoz											
875	ZS-5-VO-OL-3	Zařízení staveniště VO-OL - odstranění	120 dny	31.05.29	28.09.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště VO-OL - odstranění											
876	ZS-6-OL1-1	Zařízení staveniště OL 1 - zřízení	120 dny	14.04.22	12.08.22	1 den	1 den	Zařízení staveniště OL 1 - zřízení											
877	ZS-6-OL1-2	Zařízení staveniště OL 1 provoz	2564 dny	14.05.22	30.07.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště OL 1 provoz											
878	ZS-6-OL1-3	Zařízení staveniště OL 1 odstranění	120 dny	31.05.29	28.09.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště OL 1 odstranění											
879	ZS-6-OL2-1	Zařízení staveniště OL 2 - zřízení	120 dny	01.07.22	29.10.22	1 den	1 den	Zařízení staveniště OL 2 - zřízení											
880	ZS-6-OL2-2	Zařízení staveniště OL 2 provoz	2486 dny	31.07.22	30.07.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště OL 2 provoz											
881	ZS-6-OL2-3	Zařízení staveniště OL 2 odstranění	120 dny	31.05.29	28.09.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště OL 2 odstranění											
882	ZS-6-OL3-1	Zařízení staveniště OL 3 (nahrazeno Auto Strž)	120 dny	14.04.22	12.08.22	1 den	1 den	Zařízení staveniště OL 3 (nahrazeno Auto Strž)											
883	ZS-6-OL3-2	Zařízení staveniště OL 3 provoz (nahrazeno Auto Strž)	2564 dny	14.05.22	30.07.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště OL 3 provoz (nahrazeno Auto Strž)											
884	ZS-6-OL3-3	Zařízení staveniště OL 3 odstranění (nahrazeno Auto Strž)	120 dny	31.05.29	28.09.29	1 den	1 den	Zařízení staveniště OL 3 odstranění (nahrazeno Auto Strž)											
885		Likvidace ZS	0 dny	28.09.29	28.09.29	1 den	1 den	Likvidace ZS											
886	VON 02	Projektová dokumentace	2667 dny	01.04.22	28.09.29	1 den	1 den	Projektová dokumentace											
887	PD 01	Dopracování dokumentace pro provedení stavby	2301 dny	01.04.22	17.09.28	1 den	1 den	Dopracování dokumentace pro provedení stavby											
888	PD 02	Dokumentace skutečného provedení stavby	365 dny	18.09.28	28.09.29	1 den	1 den	Dokumentace skutečného provedení stavby											
889	VON 03	Ostatní náklady	2667 dny	01.04.22	28.09.29	1 den	1 den	Ostatní náklady											
890	ON 03-1	Geodetická činnost	2667 dny	01.04.22	28.09.29	1 den	1 den	Geodetická činnost											
891	ON 03-2	Kompletační a koordinační činnost	2667 dny	01.04.22	28.09.29	1 den	1 den	Kompletační a koordinační činnost											
892	ON 03-3	Finanční a ostatní náklady	2667 dny	01.04.22	28.09.29	1 den	1 den	Finanční a ostatní náklady											
893	ON 03-4	Pasportizace komunikací na odvozových trasách	90 dny	01.04.22	30.06.22	2578 dny	2578 dny	Pasportizace komunikací na odvozových trasách											

Metro ID1a Revize HMG č.3 ze dne 30.4.2024 Subterra + Hochtief + Strabag	Úkol Rozdělení Mílník	Souhrnný Souhrn projektu Neaktivní úkol	Neaktivní mílník Neaktivní souhrn Ruční úkol	Pouze s dobou trvání Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn	Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější úkoly	Vnější mílník Konečný termín Kritický	Kritické rozdělení Průběh Průběh ručně zadaného úkolu	Kritický
--	-----------------------------	---	--	--	---	---	---	----------
