


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	II	III	Čtvr. 2, 2018 IV	V	VI	Čtvr. 3, 2018 VII	VIII	IX	Čtvr. 4, 2018 X
1		<b>HMG Zápy</b>	<b>154 dny</b>	<b>1.3. 18</b>	<b>2.10. 18</b>											
2		Předání staveniště	0 dny	1.3. 18	1.3. 18											
3		<b>Bourání</b>	<b>154 dny</b>	<b>1.3. 18</b>	<b>2.10. 18</b>											
4		frézování NK	2 dny	1.3. 18	2.3. 18	2										
5		Bourání horní	2 týdny	5.3. 18	16.3. 18	4										
6		<b>první polovina</b>	<b>7 dny</b>	<b>19.3. 18</b>	<b>27.3. 18</b>											
7		řezání	1 týden	19.3. 18	23.3. 18	5										
8		bourání	2 dny	26.3. 18	27.3. 18	7										
9		<b>první polovina</b>	<b>7 dny</b>	<b>28.3. 18</b>	<b>5.4. 18</b>											
10		řezání	1 týden	28.3. 18	3.4. 18	8										
11		bourání	2 dny	4.4. 18	5.4. 18	10										
12		Bourání SS	2 týdny	6.4. 18	19.4. 18	9										
13		pažení	1 týden	20.4. 18	26.4. 18	12										
14		<b>mikropiloty</b>	<b>5 dny</b>	<b>27.4. 18</b>	<b>3.5. 18</b>											
15		op1	1 den	27.4. 18	27.4. 18	13										
16		P2	1 den	30.4. 18	30.4. 18	15										
17		P3	1 den	1.5. 18	1.5. 18	16										
18		P4	1 den	2.5. 18	2.5. 18	17										
19		OP5	1 den	3.5. 18	3.5. 18	18										
20		<b>Základy</b>	<b>50 dny</b>	<b>30.4. 18</b>	<b>6.7. 18</b>											
21		op1	1 týden	30.4. 18	4.5. 18	15										
22		P2	1 týden	21.5. 18	25.5. 18	16;27										
23		P3	1 týden	4.6. 18	8.6. 18	17;28										
24		P4	1 týden	18.6. 18	22.6. 18	18;29										
25		OP5	1 týden	2.7. 18	6.7. 18	19;30										
26		<b>Spodní stavba</b>	<b>55 dny</b>	<b>7.5. 18</b>	<b>20.7. 18</b>											
27		op1	2 týdny	7.5. 18	18.5. 18	21										
28		P2	1 týden	28.5. 18	1.6. 18	22										
29		P3	1 týden	11.6. 18	15.6. 18	23										
30		P4	1 týden	25.6. 18	29.6. 18	24										
31		OP5	2 týdny	9.7. 18	20.7. 18	25										
32		Osazení Nosníků	3 dny	23.7. 18	25.7. 18	26										
33		NK	2 týdny	26.7. 18	8.8. 18	32										
34		techn. Přes.	1 týden	9.8. 18	15.8. 18	33										
35		izolace říms	6 dny	16.8. 18	23.8. 18	34										
36		římsy	2 týdny	24.8. 18	6.9. 18	35										
37		isolace mostovky	6 dny	7.9. 18	14.9. 18	36										
38		ochrana izolace	1 den	17.9. 18	17.9. 18	37										
39		obrusná vrstva	1 den	18.9. 18	18.9. 18	38										
40		dokončovací práce	2 týdny	19.9. 18	2.10. 18	39										

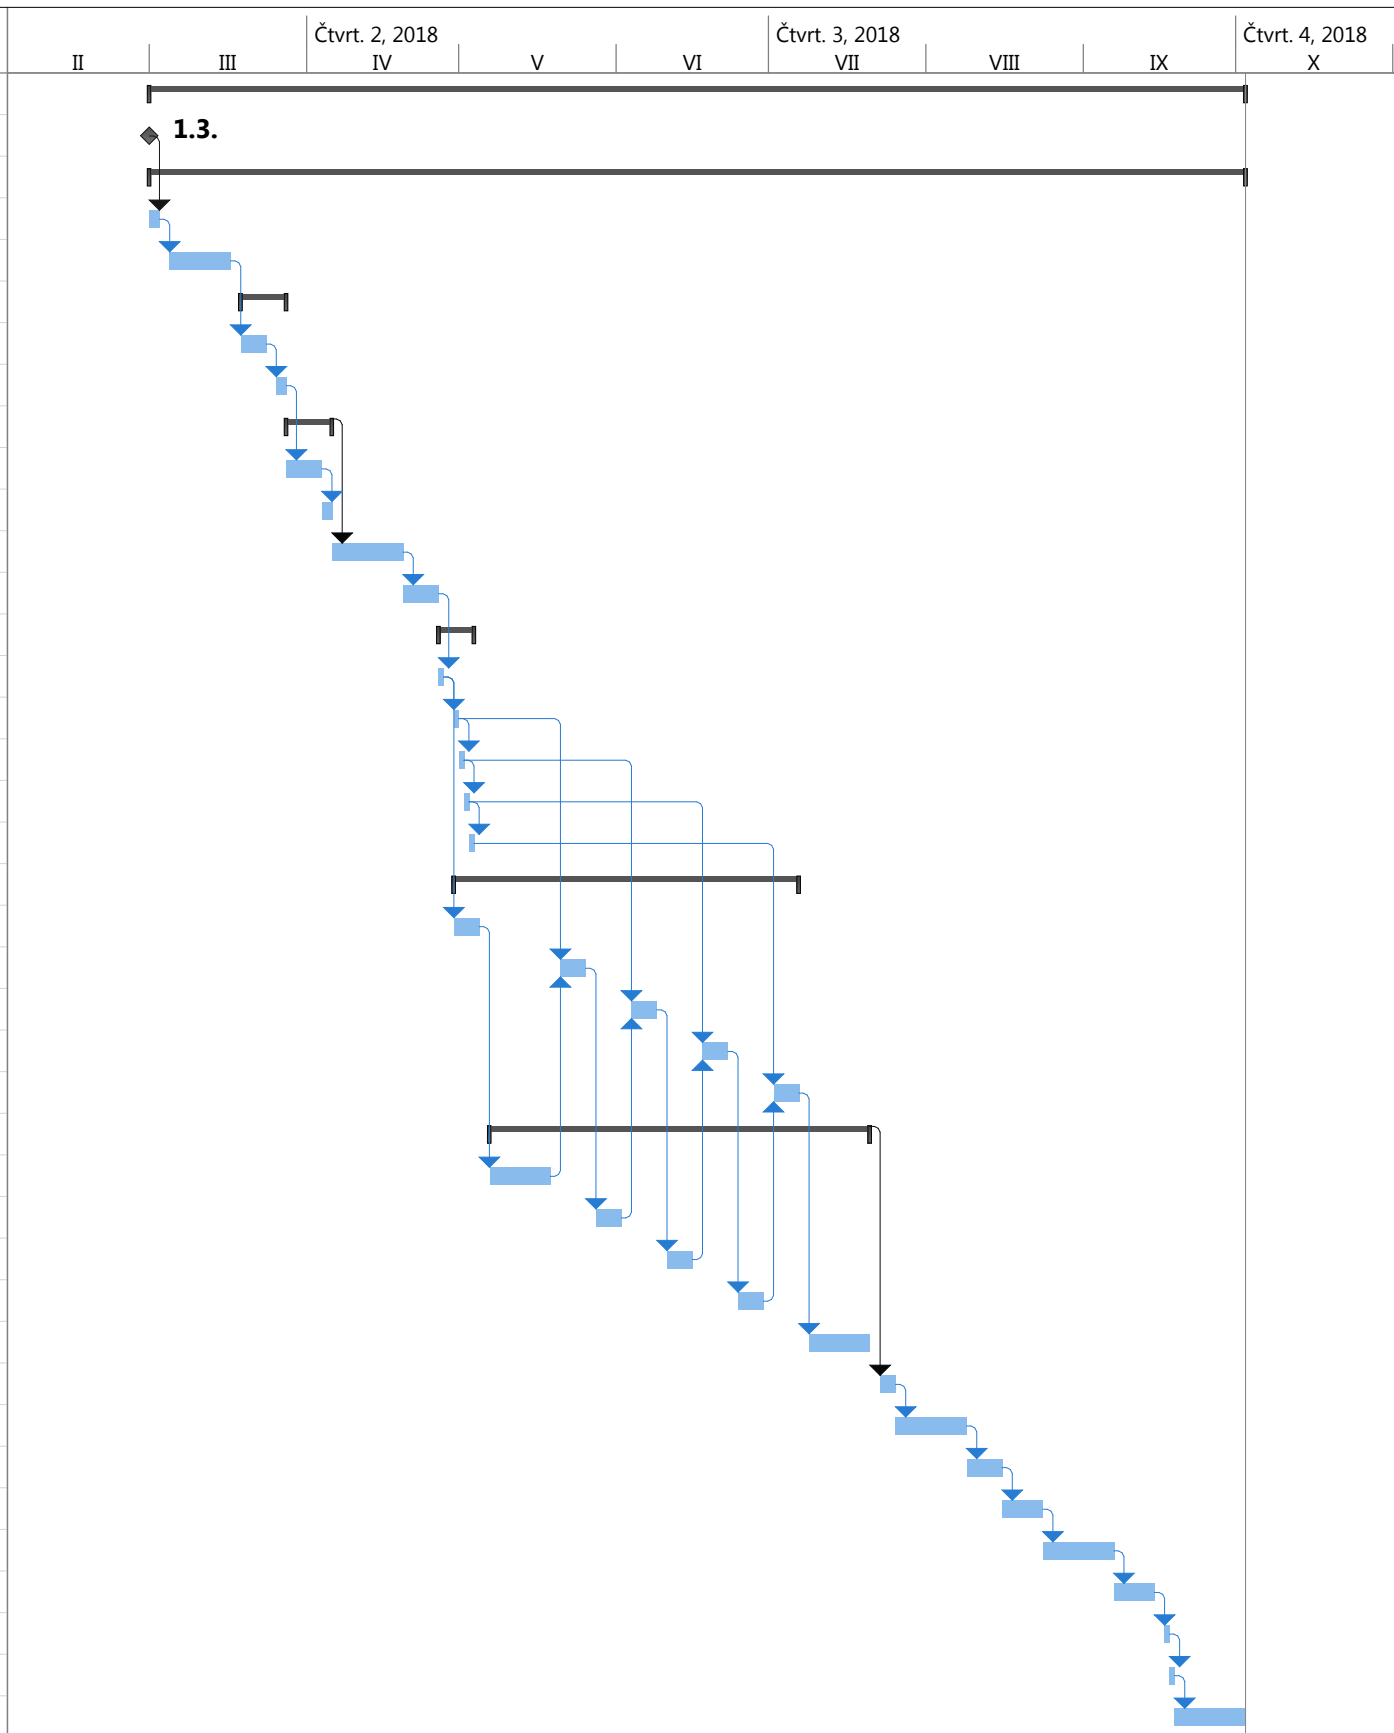

Projekt: HMG Zápy.mpp Datum: 1.8. 17	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			
