


ID	Režim/Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Úkol			
2	Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení na zastávkách Loučovice zast. (trať Rybník – Lipno), Líšnice (trať Tábor – Písek), Myslín a Smetanova Lhota (trať Protivín – Zdice)	214 dny	1.5.18	30.11.18
3	Předání staveniště, zahájení prací	1 den	1.5.18	1.5.18
4	Stavební práce	213 dny	1.5.18	29.11.18
5	SO 01 - ČEKÁRENSKÝ PŘÍSTŘEŠEK – LOUČOVICE ZASTÁVKA	44 dny	1.5.18	19.6.18
6	Vytýčení tras stávajících sítí technické infrastruktury	1 den	2.5.18	2.5.18
7	Vytýčení stavby	1 den	3.5.18	3.5.18
8	Bourací práce stávajícího objektu	3 dny	4.5.18	6.5.18
9	Výkopové práce	2 dny	7.5.18	8.5.18
10	Základové konstrukce	8 dny	9.5.18	16.5.18
11	Nadzákladové konstrukce	9 dny	17.5.18	25.5.18
12	Montáž označení zastávky	5 dny	26.5.18	30.5.18
13	Povrchové úpravy	7 dny	31.5.18	6.6.18
14	Dokončovací práce	7 dny	7.6.18	13.6.18
15	SO 02 - ČEKÁRENSKÝ PŘÍSTŘEŠEK - LÍŠNICE	52 dny	14.6.18	4.8.18
16	Vytýčení tras stávajících sítí technické infrastruktury	1 den	14.6.18	14.6.18
17	Vytýčení stavby	1 den	15.6.18	15.6.18
18	Bourací práce stávajícího objektu	3 dny	16.6.18	18.6.18
19	Výkopové práce	2 dny	19.6.18	20.6.18
20	Základové konstrukce	8 dny	21.6.18	28.6.18
21	Montáž prefabrikovaných panelů přístřešku	9 dny	29.6.18	7.7.18
22	Montáž označení zastávky	5 dny	8.7.18	12.7.18
23	Zpevněná plocha uvnitř přístřešku	4 dny	13.7.18	16.7.18
24	Zřízení osvětlení nástupiště	7 dny	17.7.18	23.7.18
25	Zpevněná plocha vně přístřešku	4 dny	24.7.18	27.7.18
26	Dokončovací práce	8 dny	28.7.18	4.8.18
27	SO 03 - ČEKÁRENSKÝ PŘÍSTŘEŠEK - MYSLÍN	52 dny	5.8.18	25.9.18
28	Vytýčení tras stávajících sítí technické infrastruktury	1 den	5.8.18	5.8.18
29	Vytýčení stavby	1 den	6.8.18	6.8.18
30	Bourací práce stávajícího objektu	3 dny	7.8.18	9.8.18
31	Výkopové práce	2 dny	10.8.18	11.8.18
32	Základové konstrukce	8 dny	12.8.18	19.8.18
33	Montáž prefabrikovaných panelů přístřešku	9 dny	20.8.18	28.8.18
34	Montáž označení zastávky	5 dny	29.8.18	2.9.18
35	Zpevněná plocha uvnitř přístřešku	4 dny	3.9.18	6.9.18
36	Zřízení osvětlení nástupiště	7 dny	7.9.18	13.9.18
37	Zpevněná plocha vně přístřešku	4 dny	14.9.18	17.9.18
38	Dokončovací práce	8 dny	18.9.18	25.9.18
39	SO 04 - ČEKÁRENSKÝ PŘÍSTŘEŠEK - SMETANOVA LHOTA	65,13 dn	26.9.18	29.11.18
40	Vytýčení tras stávajících sítí technické infrastruktury	1 den	26.9.18	26.9.18
41	Vytýčení stavby	1 den	27.9.18	27.9.18
42	Bourací práce stávajícího objektu	3 dny	28.9.18	30.9.18
43	Výkopové práce	2 dny	30.9.18	1.10.18
44	Základové konstrukce	8 dny	2.10.18	9.10.18
45	Nadzákladové konstrukce	21 dny	10.10.18	30.10.18
46	Montáž označení zastávky	5 dny	31.10.18	4.11.18
47	Zpevněná plocha uvnitř přístřešku	4 dny	5.11.18	8.11.18
48	Zřízení osvětlení nástupiště	7 dny	9.11.18	15.11.18
49	Zpevněná plocha vně přístřešku	4 dny	16.11.18	19.11.18
50	Dokončovací práce	10 dny	20.11.18	29.11.18
51	Ukončení prací, předání staveniště	1 den	30.11.18	30.11.18

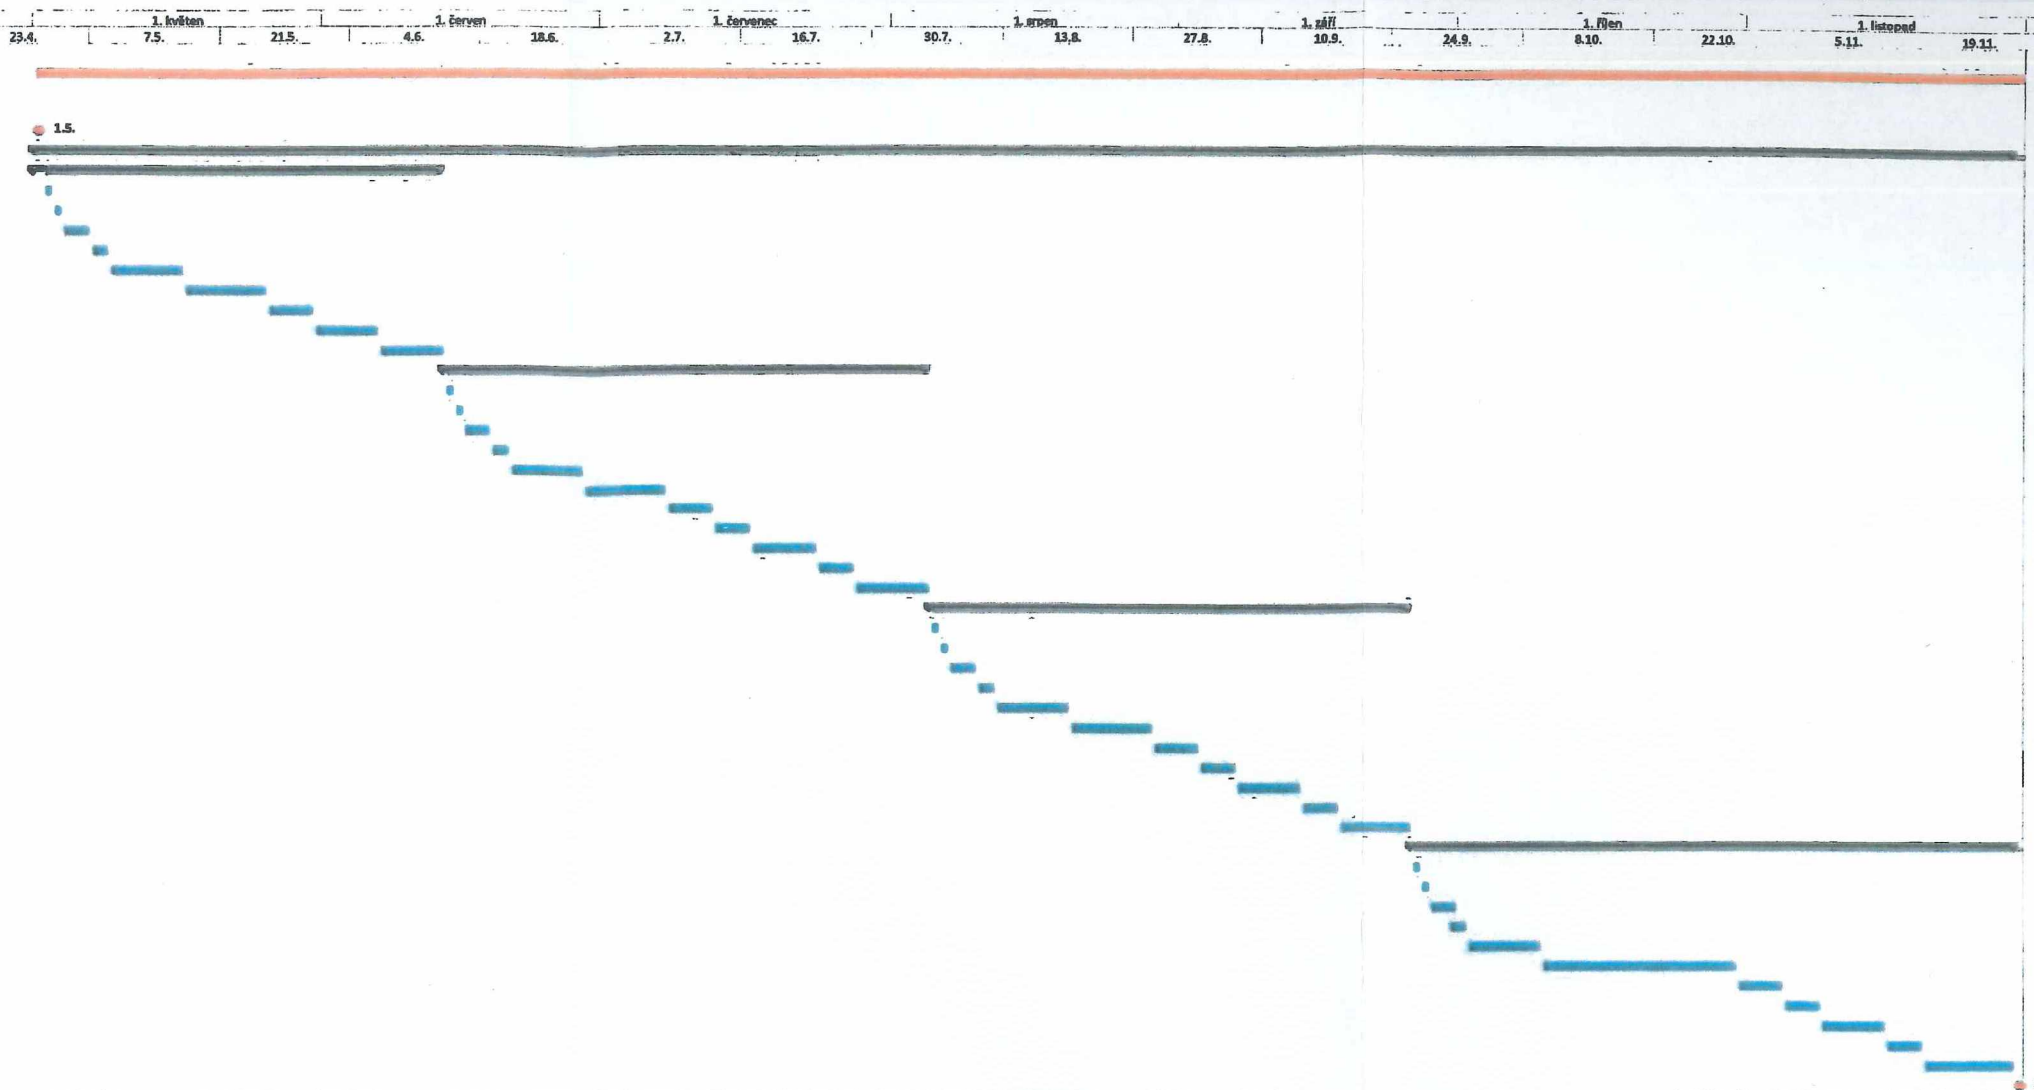

23-03-2018

Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D.
obchodní ředitel
na základě plné moci
