


# ČASOVÁ OSA PROJEKTU

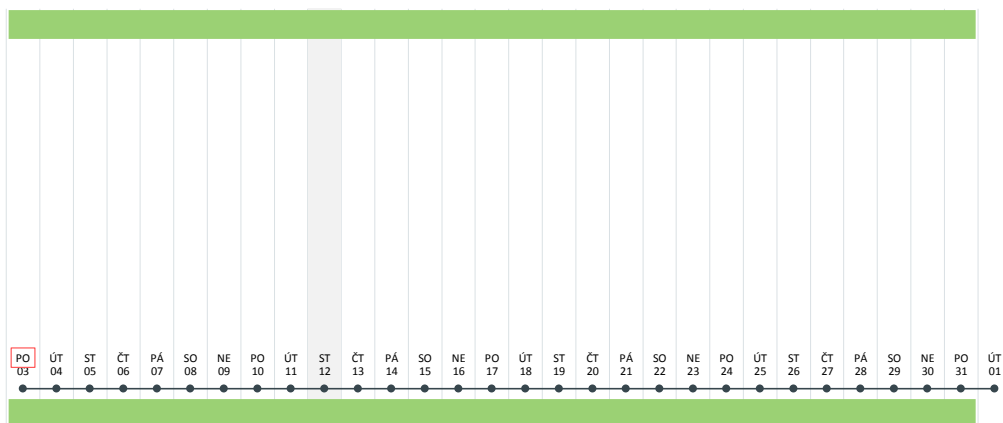

ZADEJTE DATUM ZAHÁJENÍ:

3.12.2018

ČINNOST	TÝDEN	ZAHÁJENÍ	UKONČENÍ	POZNÁMKY
Zahájení projektu		7.1.19		
1. Stavební úpravy m.č. 014 + 015 Tyršova	1 - 3	7.1.19	24.1.19	prázdná místnost - probíhá naše výroba 1. ETAPA - VÝROBA VEŠKERÝCH obr. Dílů a výpalků
2. Stavební úpravy m.č. 01.15; 01.13 Olomoc	4 - 5	21.1.19	1.2.19	prázdná místnost - probíhá naše výroba 1. ETAPA, včetně PÚ, kolejí 1. etapa (01.13 - BEZ VÝMALBY - POUŽITÍ JAKO SKLAD MATERIÁLU)
3. Vyklízení regálů m.č. 01.06 Ol	5	28.1.19	1.2.19	POUŽIJEME většinu regálů; montáž podvozků
4. Montáž regálů m.č. 014 + 015 Tyršova	6 - 7	4.2.19	15.2.19	014= 2 poj reg 4147 + stac reg 3051; 015 = 5 poj reg 2222
5. Stavební úpravy m.č. 01.06 Ol	6 - 7	4.2.19	20.2.19	
6. Montáž regálů m.č. 01.15 Ol	8 - 9	18.2.19	1.3.19	01.05= 2 poj reg 4147 + 18 kovovými regály z místnosti 01.06
7. Vyklízení regálů m.č. 01.05 Ol	10	4.3.19	8.3.19	POUŽIJEME většinu regálů
8. Stavební úpravy m.č. 01.05 Ol	11-12	11.3.19	27.3.19	probíhá naše výroba 2. ETAPA
9. Montáž regálů m.č. 01.06 Ol	13-14	25.3.19	5.4.19	10 poj reg 4414 + 2 poj reg 3613 + 3 stac regály + 2 kovové regály z m.č. 01.06; probíhá výroba 2.ETAPA <b>NEJVĚTŠÍ POČET REGÁLŮ NA MONTÁŽ</b>
10. Vyklízení regálů m.č. 01.07; 01.08 Ol	15	8.4.19	12.4.19	( m.č. 01.07 kromě 1 regálu dvojitého regálu 243x251 vše LIKVIDACE) 1.08 POUŽIJEME; probíhá výroba 2.ETAPA, pokládka kolejí místnost 1.05
11. Stavební úpravy m.č. 01.07 Ol	16-17	15.4.19	30.4.19	probíhá naše výroba 2. ETAPA - montáž podvozků, výroba kolejí, PÚ, <b>POZOR 2 DNY VELIKONOCE</b>
12. Montáž regálů m.č. 1.05 Ol	16-17	15.4.19	26.4.19	5 poj reg 2222 + 3 poj reg 1955 + 13 st reg 241x265 + 12x kovový regál z m.č. 01.06 - <b>POZOR 2 DNY VELIKONOCE, proto koleje předem</b>
13. Stavební úpravy m.č. 01.08 Ol	18 - 19	29.4.19	15.5.19	probíhá případná naše výroba 2.ETPA - díly ze Zn plechu (resty) - <b>POZOR 2 STÁTNÍ SVÁTKY</b>
14. Vyklízení regálů m.č. 01.12 Ol	20	13.5.19	17.5.19	POUŽIJEME většinu regálů (pokl kolejí 01.07)
15. Montáž regálů m.č. 1.07 Ol	21	20.5.19	24.5.19	2 poj reg 2222 + 2 poj reg 1955 + kombinace dřevěných a kovových regálů
16. Stavební úpravy m.č. 01.12 Ol	21-22	20.5.19	5.6.19	
17. Montáž regálů m.č. 1.08 Ol	22-23	27.5.19	7.6.19	5 poj reg 2222 + 3 poj reg 1955 + kombinace dřevěných regálů
18. Stavební úpravy m.č. 01.01 Ol, venkovní	24-25	10.6.19	28.6.19	prázdná místnost, kterou jsme předtím použili jako sklad regálů + <b>DOKONČENÍ VÝMALBY m.č. 01.13 v 26. týdnu</b>
19. Montáž regálů m.č. 1.12	24 - 25	10.6.19	21.6.19	5 poj reg 2222 + 3 poj reg 1955 + kombinace dřevěných regálů
Ukončení projektu	26	31.5.19		1 TÝDEN REZERVA

V případě potřeby zadavatele je možno pořadí místností po vzájemné dohodě upravit.

V Klimkovicích dne 4. 12. 2018.
