


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	17.XII Č	14.I P	15.II Ú	11.II S	11.III S	11.III N	10.IV Č	10.VI P	10.VI Ú	10.VI S	10.VII S	29.VII N	26.VIII Č	23.IX P	12.IX Ú	11.XI S	116	
0		Výběr zhotovitele, výstavba nové vozovny Hloubětín I. fáze - havarijní bourání	214 dny	15.01. 19	08.11. 19																		
1		Předání a převzetí staveniště, zahájení stavebních prací	0 dny	15.01. 19	15.01. 19																		
2		Provádění podpěrných konstrukcí	35 dny	15.01. 19	04.03. 19																		
3		Přípravné práce a odstřel	41 dny	05.03. 19	30.04. 19																		
4		Odvoz sutě z odstřelu	46 dny	01.05. 19	03.07. 19																		
5		Dobourání přístavků	92 dny	04.07. 19	08.11. 19																		
6		Dokončení díla, předání a převzetí díla	0 dny	08.11. 19	08.11. 19																		



Projekt: Výběr zhotovitele, výstava Datum: 08.11. 18	Úkol		Neaktivní souhrn		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Ruční úkol		Vnější milník	
	Milník		Pouze s dobou trvání		Konečný termín	
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh	
	Souhrn projektu		Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Neaktivní úkol		Pouze zahájení			
	Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení			

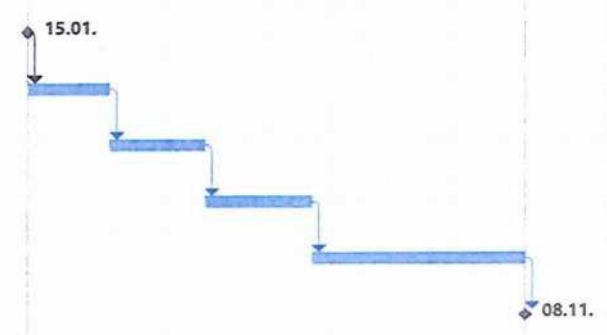
