

Datum

Denní záznamy stavby


- provádění vodorovné H1 v 1.PP
 - návrh a rozprostření železni do podlahy 1.PP

za MROS BRNO a.s.

8.6.2018 Proběhlo jednání za účasti GD, GP, uživatele, TDI, investora, EZH. Bylo dohodnuto:

- Zhotovitel provede CW na stoupačty elektro (zapuštěná verze) s SDK předstěnou a 3 revizními otvory 300x300. GP provede návrh tedy řešení.
- Uživatel zašle datavatelí projekt AVT a interiéru.
- Před realizací SLP vyžve zhotovitel GP na koordinací poradě pro umístění koncových prvků.
- Proběhne koordinací poradě s projektantem AVT a GD pro upřesnění požadavků příprav.

za EZH a.s.

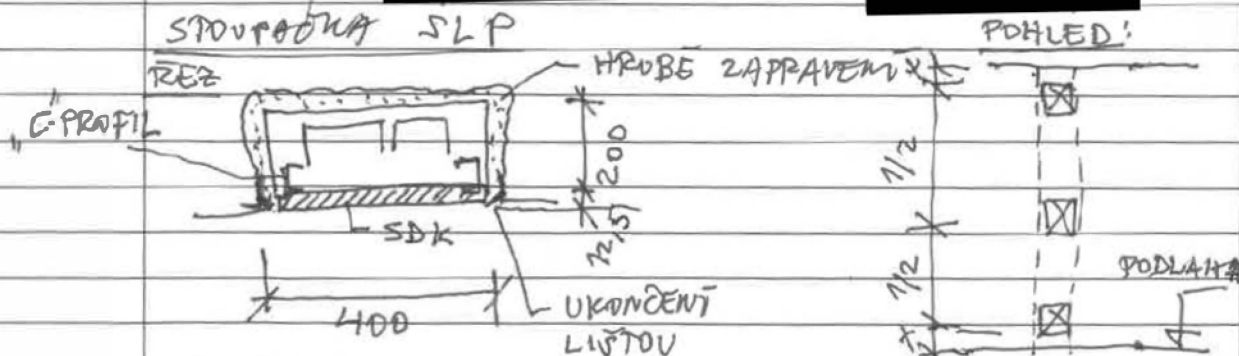

3x SDK REVIZNÍ DVÍŘKA PODVÝŠLE
 MÍSTNOSTI 300x300 MM, ZÁNEK-OTVĚŘANEM

Datum	Denní záznamy stavby
	za MOS BRNO a.s. [redacted]
20.6.2018 středa	<p>p počasí: počasí: podjásno +18 v +30 °C</p> <p>pracovníci: MOS - 4THP+4</p> <p>MOS PSV-3</p> <p>LAZ PLUS-2</p> <p>EZH-4</p> <p>ESOX-8</p> <p>WOODARCH-3</p> <p>PRIVILEG-3</p>
	pracovní doba: 7 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
	mechanizace: náhl. automobily, čerpadla na beton, autocamíčovací
	<p>popis práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úklid staveniště - zardívání stáv. otvorů 2.NP, 1.PP - betonáž podlahy 1.PP - rozvody ZTI - sňatí kapes pro ok - rozvody elektrop - vykopové a sanacní práce ul. Jostova - opalování starých materiálů, broušení, repase stáv. oken - čištění okrasných pruhů fasády
ZÁPIS:	<p>Proběhla koordináční schůzka týkající se AVT za účasti GD, GP, TD, EZH, uživatele a projektanta AVT.</p> <p>Bylo dohodnuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prověřit orientáční osvětlení - poslouchárně (GP) - prověřit ovládání hl. osvětlení od jednotky řídicího systému AVT - projednat s architektem umístění reproduktoru AVT a ERS v atriu
	<p>[redacted] Za BZK, [redacted]</p> <p>[redacted] Za AD, [redacted]</p>
	<p>FP MČ: [redacted]</p> <p>Projednání: [redacted]</p>

Datum	Denní záznamy stavby
	<ul style="list-style-type: none"> - seřazení drážek pro VZT - zazdivání zářubní - rozvody ZTI, VT - 1. PP - rozvody elektro 1. PP - omítkání 1. PP - práce na renovaci fasády - omítkání 2. NP - rozebírání přelovek, likvidace odpady, přesuny kmit - provádění sávacích detailů 1. PP - montáž lešení nástava + vyhovování pro opravu říms • Proběhla kontrola přípravy pro AVT za účasti GD, EZH, uživatele, projektanta AVT. • Bylo dohodnuto, že dveře do místnosti PO1035 budou z důvodu ušlechťování namísto 800/1970 provedeny 700/1970. <p>za INTAR: [redacted] za uživatele [redacted] za TDI: [redacted]</p> <p>za IKOS BANO a.s. [redacted]</p>
4. 8. 18 úterý	<p>Počasí: Jasný +21°C ~ +27°C</p> <p>Přít. pracovníci: IKOS HSV + 4 THP + 2 IKOS PSV + 6 ESOX + 9 SINOSTAV + 4 EZH + 2 PRIVILEG + 6 LABCO + 9</p> <p>Pracovní doba Mechanice: 7⁰⁰ ~ 18⁰⁰ hod</p> <p>Mechanice: Nařel. automobily, stavební výťah (geda)</p> <p>Popis práce: - renovace fasády - omítkání 1. PP + 2. NP - detaily sámací - nářez materiálů do podlah (kav. síť)</p>

Datum	Denní záznamy stavby
	<p>Proběhlo jednání za účasti zástupců uživatele, TD1, GD, GP, EZH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - příprava pro kameru dle požadavků uživatele - uživatel přípravu objedná napřímou u firmy EZH - krabice proložkové + žláby do vstava dle VV AVT objedná uživatel napřímou u firmy EZH - dylbější krabice a rele' k elektrotechnickým roletám budou součástí stavby, GD vytvoří rozpočet... bude dořešeno s dodavatelem žaluzií <p style="text-align: right;">Za BZH: [redacted]</p> <p>TD1: [redacted] AD: [redacted] FFMU: [redacted]</p>
12.9. Sběr	<p>Počasí: Jasně +14°C ~ +26°C</p> <p>Počet pracovníků: MOS HSV +4 THP +4 MOS PSV +4 PRIVILEG +6 ESOX +5 MUTO +2 GABCO +9 SINOSTAV +3+1 EZH +3</p> <p>Pracovní doba: 7⁰⁰ ~ 18⁰⁰ hod</p> <p>Mechanizace: Strukt. výřub, mtl. automobil</p> <p>Typy práce: <ul style="list-style-type: none"> - betonáž kapes na ocel. kci na půdě - dozdivání ostění dveří v 2.NP - úklid staveniště - rozvody ET a ZTI v 1.PP - renovace fasády na mlici Joštova - sanační práce v areálu - oplechování říms a parapetů - likvidace sutě na půdě - omítky v 1.NP <p style="text-align: right;">Za MOS BRNO a.s. [redacted]</p> </p>
