


Harmonogram stavby: 2019/SPS Revitalizace školního areálu ZŠ SYCHROV


Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	duben 2019				květen 2019				červen 2019				červenec 2019				srpen 2019			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2019/032	Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov	2.4.2019	26.8.2019	8 871 900																				
001	Vedlejší a ostatní náklady	2.4.2019	26.8.2019	297 500																				
VN	Vedlejší náklady	2.4.2019	26.8.2019	167 500																				
ON	Ostatní náklady	2.4.2019	26.8.2019	130 000																				
SO 01-1	Multifunkční hřiště - sportoviště	2.4.2019	26.8.2019	2 761 260																				
11	Přípravné a přidružené práce	2.4.2019	26.4.2019	68 864																				
12	Odkopávky a prokopávky	15.4.2019	30.4.2019	10 092																				
13	Hloubené vykopávky	19.4.2019	5.5.2019	25 258																				
16	Přemístění výkopku	15.4.2019	5.5.2019	19 774																				
17	Konstrukce ze zemin	27.5.2019	6.6.2019	1 466																				
18	Povrchové úpravy terénu	16.8.2019	26.8.2019	37 236																				
21	Úprava podloží a základ.spáry	29.4.2019	24.5.2019	87 247																				
27	Základy	16.5.2019	3.6.2019	11 067																				
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněnýc	26.6.2019	2.8.2019	314 805																				
59	Dlažby a předlažby komunikací	15.7.2019	28.7.2019	4 911																				
87	Potrubí z trub z plastických hmot	8.5.2019	19.5.2019	2 019																				
91	Doplňující práce na komunikaci	1.7.2019	16.7.2019	15 396																				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	22.7.2019	1.8.2019	8 468																				
96	Bourání konstrukcí	2.4.2019	26.4.2019	73 763																				
99	Staveništní přesun hmot	2.4.2019	26.8.2019	45 967																				
58.1	Herní povrch	29.7.2019	25.8.2019	1 272 229																				
58.3	Mobiliář	26.6.2019	14.7.2019	80 896																				
58.4	Sportovní vybavení	15.7.2019	2.8.2019	56 123																				
767	Konstrukce zámečnické	2.4.2019	16.4.2019	11 454																				
999	Poplatky za skládky	2.4.2019	2.5.2019	133 139																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2.4.2019	2.5.2019	481 086																				
SO 01-2	Multifunkční hřiště - opěrná zeď	6.5.2019	14.7.2019	789 442																				
1	Stavební rozpočet	6.5.2019	14.7.2019	789 442																				
13	Hloubené vykopávky	6.5.2019	21.5.2019	29 008																				
16	Přemístění výkopku	6.5.2019	21.5.2019	56 514																				
17	Konstrukce ze zemin	12.6.2019	2.7.2019	49 010																				
18	Povrchové úpravy terénu	3.7.2019	14.7.2019	29 734																				
27	Základy	15.5.2019	5.6.2019	134 473																				
31	Zdi podpěrné a volné	27.5.2019	27.6.2019	260 514																				
99	Staveništní přesun hmot	6.5.2019	14.7.2019	104 771																				
711	Izolace proti vodě	22.5.2019	11.6.2019	81 947																				
999	Poplatky za skládky	6.5.2019	21.5.2019	43 472																				
SO 02	Běžecká dráha	8.4.2019	26.8.2019	1 290 256																				
11	Přípravné a přidružené práce	8.4.2019	23.4.2019	22 343																				
12	Odkopávky a prokopávky	22.4.2019	3.5.2019	6 724																				
13	Hloubené vykopávky	29.4.2019	14.5.2019	22 511																				
16	Přemístění výkopku	22.4.2019	14.5.2019	31 835																				
17	Konstrukce ze zemin	28.5.2019	9.6.2019	74 421																				
18	Povrchové úpravy terénu	12.8.2019	26.8.2019	42 990																				
21	Úprava podloží a základ.spáry	6.5.2019	30.5.2019	19 479																				
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	20.5.2019	30.5.2019	13 077																				
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněnýc	5.6.2019	9.7.2019	92 553																				
59	Dlažby a předlažby komunikací	24.6.2019	23.7.2019	101 271																				
8	Trubní vedení	31.5.2019	4.6.2019	2 000																				

87	Potrubí z trub z plastických hmot	22.5.2019	4.6.2019	22 625
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	15.5.2019	4.6.2019	42 055
91	Doplňující práce na komunikaci	12.6.2019	2.7.2019	71 969
96	Bourání konstrukcí	12.4.2019	30.4.2019	140 439
99	Staveništní přesun hmot	8.4.2019	26.8.2019	32 110
58.1	Herní povrch	22.7.2019	18.8.2019	236 170
58.4	Sportovní vybavení	16.7.2019	23.7.2019	18 672
767	Konstrukce zámečnické	15.4.2019	25.4.2019	15 469
M46	Zemní práce při montážích	1.5.2019	8.5.2019	1 800
999	Poplatky za skládky	8.4.2019	30.4.2019	76 580
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	8.4.2019	30.4.2019	203 161
SO 03	Rozběhová dráha a doskočiště pro skok c	10.4.2019	26.8.2019	654 050
11	Přípravné a přidružené práce	10.4.2019	25.4.2019	16 855
12	Odkopávky a prokopávky	24.4.2019	2.5.2019	2 558
13	Hloubené vykopávky	1.5.2019	12.5.2019	3 432
16	Přemístění výkopku	24.4.2019	12.5.2019	5 332
17	Konstrukce ze zemin	13.5.2019	21.5.2019	720
18	Povrchové úpravy terénu	19.8.2019	26.8.2019	27 088
21	Úprava podloží a základ.spáry	13.5.2019	31.5.2019	13 227
27	Základy	6.5.2019	17.5.2019	6 363
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	13.5.2019	21.5.2019	676
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněnýc	24.5.2019	18.6.2019	58 726
59	Dlažby a předlažby komunikací	10.7.2019	6.8.2019	69 863
8	Trubní vedení	17.5.2019	24.5.2019	550
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	15.5.2019	25.5.2019	6 080
91	Doplňující práce na komunikaci	10.6.2019	25.6.2019	53 245
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	19.6.2019	2.7.2019	20 942
95	Dokončovací konstrukce na pozemních st	20.5.2019	26.8.2019	4 950
96	Bourání konstrukcí	17.4.2019	28.4.2019	21 707
99	Staveništní přesun hmot	10.4.2019	26.8.2019	17 539
58.1	Herní povrch	29.7.2019	23.8.2019	62 019
58.3	Mobiliář	24.6.2019	16.7.2019	60 959
58.4	Sportovní vybavení	8.7.2019	30.7.2019	68 121
M46	Zemní práce při montážích	3.5.2019	10.5.2019	1 800
999	Poplatky za skládky	10.4.2019	28.4.2019	30 482
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	10.4.2019	28.4.2019	100 817
SO 04	Sklad sportovního nářadí	9.5.2019	21.7.2019	144 062
1	Zásuvková skříň	14.6.2019	21.7.2019	8 970
2	Elektromontáže	14.6.2019	21.7.2019	5 435
3	HZS	14.6.2019	21.7.2019	6 720
M99	Ostatní práce "M"	14.6.2019	21.7.2019	5 000
12	Odkopávky a prokopávky	9.5.2019	21.5.2019	473
16	Přemístění výkopku	9.5.2019	21.5.2019	655
17	Konstrukce ze zemin	25.5.2019	4.6.2019	795
27	Základy	15.5.2019	4.6.2019	15 964
99	Staveništní přesun hmot	9.5.2019	14.7.2019	6 013
58.3	Mobiliář	1.6.2019	14.7.2019	93 346
999	Poplatky za skládky	9.5.2019	21.5.2019	693

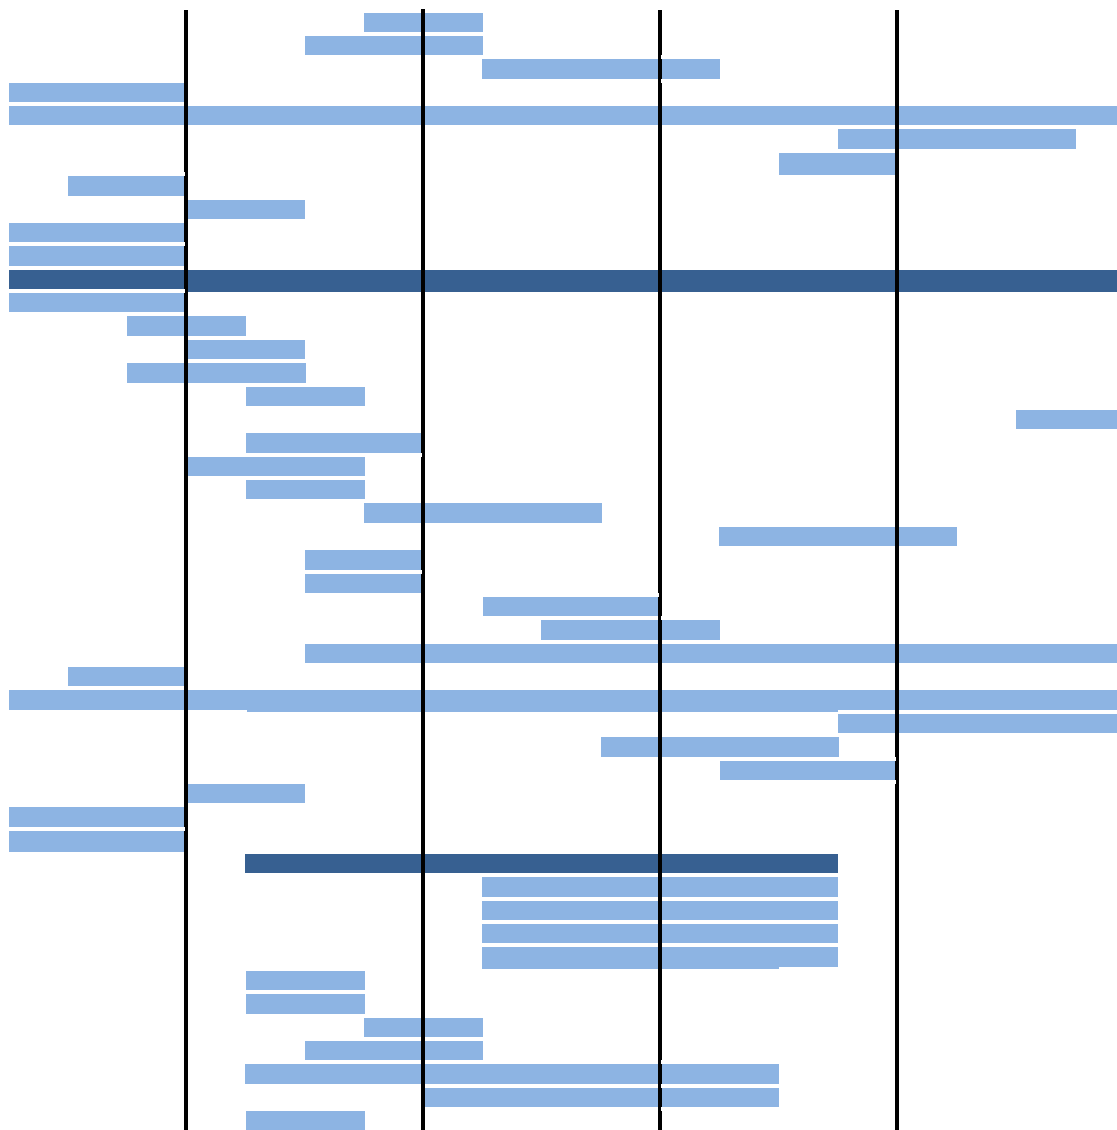

SO 05	Oplocení	22.4.2019	21.6.2019	657 089
1	Stavební rozpočet	22.4.2019	21.6.2019	657 089
13	Hloubené vykopávky	26.4.2019	7.5.2019	6 294
16	Přemístění výkopku	26.4.2019	7.5.2019	1 490
27	Základy	3.5.2019	23.5.2019	63 474
94	Lešení a stavební výtahy	23.5.2019	21.6.2019	13 033
96	Bourání konstrukcí	22.4.2019	30.4.2019	3 600
99	Staveništní přesun hmot	22.4.2019	21.6.2019	10 284
767	Konstrukce zámečnické	20.5.2019	21.6.2019	557 523
999	Poplatky za skládky	22.4.2019	7.5.2019	1 285
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	22.4.2019	30.4.2019	107
SO 06	Cvičná tenisová stěna	13.5.2019	6.8.2019	501 912
13	Hloubené vykopávky	13.5.2019	26.5.2019	12 239
16	Přemístění výkopku	13.5.2019	26.5.2019	18 540
17	Konstrukce ze zemin	29.5.2019	16.6.2019	15 473
18	Povrchové úpravy terénu	29.7.2019	6.8.2019	11 150
27	Základy	22.5.2019	14.6.2019	70 027
31	Zdi podpěrné a volné	5.6.2019	7.7.2019	224 525
62	Úpravy povrchů vnější	8.7.2019	21.7.2019	18 142
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	8.7.2019	21.7.2019	5 964
94	Lešení a stavební výtahy	5.6.2019	2.8.2019	3 807
99	Staveništní přesun hmot	13.5.2019	6.8.2019	50 864
711	Izolace proti vodě	27.5.2019	11.6.2019	9 419
783	Nátěry	17.7.2019	2.8.2019	47 501
999	Poplatky za skládky	13.5.2019	26.5.2019	14 261
SO 07 - 1	Dlážděné plochy	18.4.2019	26.8.2019	729 500
11	Přípravné a přidružené práce	29.4.2019	12.5.2019	19 419
12	Odkopávky a prokopávky	6.5.2019	14.5.2019	5 937
13	Hloubené vykopávky	22.4.2019	5.5.2019	4 980
16	Přemístění výkopku	29.4.2019	14.5.2019	5 980
17	Konstrukce ze zemin	23.5.2019	11.6.2019	8 692
18	Povrchové úpravy terénu	3.8.2019	26.8.2019	29 277
27	Základy	13.5.2019	23.5.2019	3 613
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	20.5.2019	28.5.2019	1 567
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných	7.6.2019	25.7.2019	110 895
59	Dlažby a předlažby komunikací	12.7.2019	18.8.2019	141 782
8	Trubní vedení	15.5.2019	6.6.2019	3 100
87	Potrubi z trub z plastických hmot	24.5.2019	6.6.2019	3 435
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	13.5.2019	30.5.2019	23 965
91	Doplňující práce na komunikaci	14.6.2019	16.7.2019	23 970
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	25.6.2019	18.7.2019	4 780
96	Bourání konstrukcí	18.4.2019	30.4.2019	16 414
99	Staveništní přesun hmot	18.4.2019	26.8.2019	51 304
58.2	Herní zařízení	3.7.2019	23.7.2019	35 131
58.3	Mobiliář	3.7.2019	24.7.2019	77 335
999	Poplatky za skládky	18.4.2019	14.5.2019	35 640
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	18.4.2019	5.5.2019	122 283
SO 07 - 2	Opěrná zeď se zábradlím	13.5.2019	26.8.2019	857 216
12	Odkopávky a prokopávky	17.5.2019	2.6.2019	20 087
13	Hloubené vykopávky	27.5.2019	4.6.2019	149
15	Roubení	27.5.2019	4.6.2019	13 515
16	Přemístění výkopku	17.5.2019	4.6.2019	45 105
17	Konstrukce ze zemin	10.6.2019	30.6.2019	57 447
18	Povrchové úpravy terénu	9.8.2019	26.8.2019	24 579
27	Základy	3.6.2019	22.6.2019	99 985
31	Zdi podpěrné a volné	20.6.2019	19.7.2019	182 363
41	Stropy a stropní konstrukce	15.7.2019	2.8.2019	54 882
94	Lešení a stavební výtahy	13.6.2019	2.8.2019	4 800

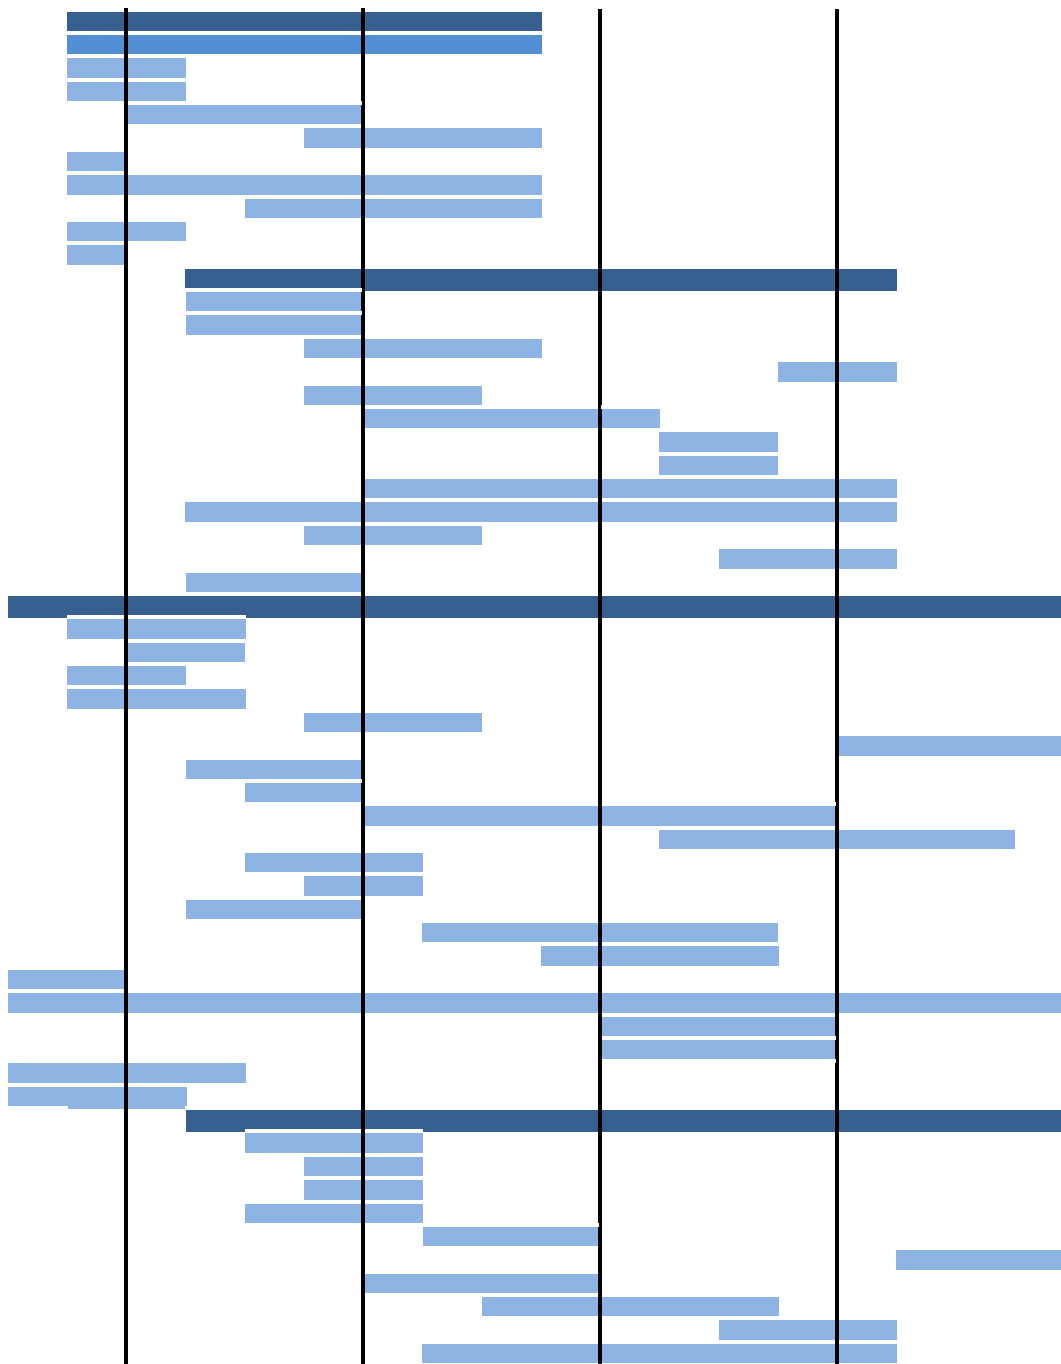

96	Bourání konstrukcí	13.5.2019	24.5.2019	30 800					
99	Staveništní přesun hmot	13.5.2019	26.8.2019	97 699					
711	Izolace proti vodě	27.5.2019	13.6.2019	40 010					
767	Konstrukce zámečnické	25.7.2019	20.8.2019	128 626					
999	Poplatky za skládky	13.5.2019	4.6.2019	43 535					
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	13.5.2019	24.5.2019	13 636					
SO 08	Venkovní odběrné elektrické zařízení	25.4.2019	28.5.2019	88 046					
1	Úprava stávajícího rozváděče v 1.PP	6.5.2019	24.5.2019	5 393					
2	Elektromontáže	6.5.2019	24.5.2019	29 748					
3	Uzemnění	6.5.2019	24.5.2019	1 440					
4	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	6.5.2019	24.5.2019	8 520					
M99	Ostatní práce "M"	6.5.2019	24.5.2019	5 000					
13	Hloubené vykopávky	25.4.2019	9.5.2019	8 438					
16	Přemístění výkopku	25.4.2019	9.5.2019	3 900					
17	Konstrukce ze zemin	12.5.2019	28.5.2019	15 388					
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	1.5.2019	13.5.2019	3 956					
99	Staveništní přesun hmot	25.4.2019	28.5.2019	2 139					
999	Poplatky za skládky	25.4.2019	9.5.2019	4 125					
SO 09	Plochy u venkovních posilovacích strojů	6.5.2019	13.8.2019	101 566					
13	Hloubené vykopávky	13.5.2019	26.5.2019	1 401					
16	Přemístění výkopku	13.5.2019	26.5.2019	265					
17	Konstrukce ze zemin	3.6.2019	14.6.2019	661					
18	Povrchové úpravy terénu	1.8.2019	13.8.2019	743					
27	Základy	23.5.2019	7.6.2019	4 846					
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněnýc	10.6.2019	14.7.2019	10 500					
96	Bourání konstrukcí	6.5.2019	19.5.2019	4 840					
99	Staveništní přesun hmot	6.5.2019	13.8.2019	1 358					
58.1	Herní povrch	8.7.2019	7.8.2019	49 002					
58.4	Sportovní vybavení	27.6.2019	12.7.2019	24 161					
M46	Zemní práce při montážích	20.5.2019	29.5.2019	1 800					
999	Poplatky za skládky	6.5.2019	26.5.2019	618					
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	6.5.2019	19.5.2019	1 371					
	Cena za měsíc				1 656 000	1 567 828	2 001 230	1 802 366	1 844 476
	Cena za rok						8 871 900		
