


PROGRAM PRACÍ

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání		VI 2016	VII 2016	VIII 2016	IX 2016	X 2016	XI 2016	XII 2016
1	Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevo	3.6. 16	23.12. 16	190 dny		16.23.30.6.13.20.27.4.11.18.25	1.8.15.22.29.5.12.19.26	3.10.17.24.31.7.14.21.28.5.12.19.26				
2	Zpracování RDS	3.6. 16	3.7. 16	31 dny								
3	Předání a schválení RDS 1. etapa	24.6. 16	28.6. 16	5 dny								
4	Předání a schválení RDS 2. etapa	29.6. 16	3.7. 16	5 dny								
5	Projednání a schválení DIO, plnění příslušných závazků smlouvy	4.7. 16	24.7. 16	21 dny								
6	Předání staveniště	25.7. 16	25.7. 16	1 den								
7	Vybudování zařízení staveniště	26.7. 16	4.8. 16	10 dny								
8	S0 101.1 Rekonstrukce vozovky	1.8. 16	14.10. 16	75 dny								
9	Vytýčení inženýrských sítí	1.8. 16	2.8. 16	2 dny								
10	Demontáž svodidel a sejmutí drnu	1.8. 16	6.8. 16	6 dny								
11	Vybourání CB krytu, podkladu vozovek a rigolů	1.8. 16	12.8. 16	12 dny								
12	Diagnostika stavu stabilizace	13.8. 16	15.8. 16	3 dny								
13	Frézování SC	8.8. 16	17.8. 16	10 dny								
14	Výměna vrstvy SC v celé tloušťce (cca 25 % plochy)	16.8. 16	31.8. 16	16 dny								
15	Vyrovnání SC vrstvy v místě propadů (cca 20 % plochy)	16.8. 16	22.8. 16	7 dny								
16	Pokládka CB krytu	1.9. 16	16.9. 16	16 dny								
17	Zrání a ošetřování betonu	17.9. 16	14.10. 16	28 dny								
18	Prořezání a utěsnění spár	15.9. 16	4.10. 16	20 dny								
19	Čištění drenáží	7.8. 16	27.8. 16	21 dny								
20	Zhotovení monolitického žlabu	10.10. 16	12.10. 16	3 dny								
21	Zpevnění a pročištění stávajících příkopů	8.10. 16	14.10. 16	7 dny								
22	Dosypání krajnic	8.10. 16	14.10. 16	7 dny								
23	Montáž svodidel	10.10. 16	14.10. 16	5 dny								

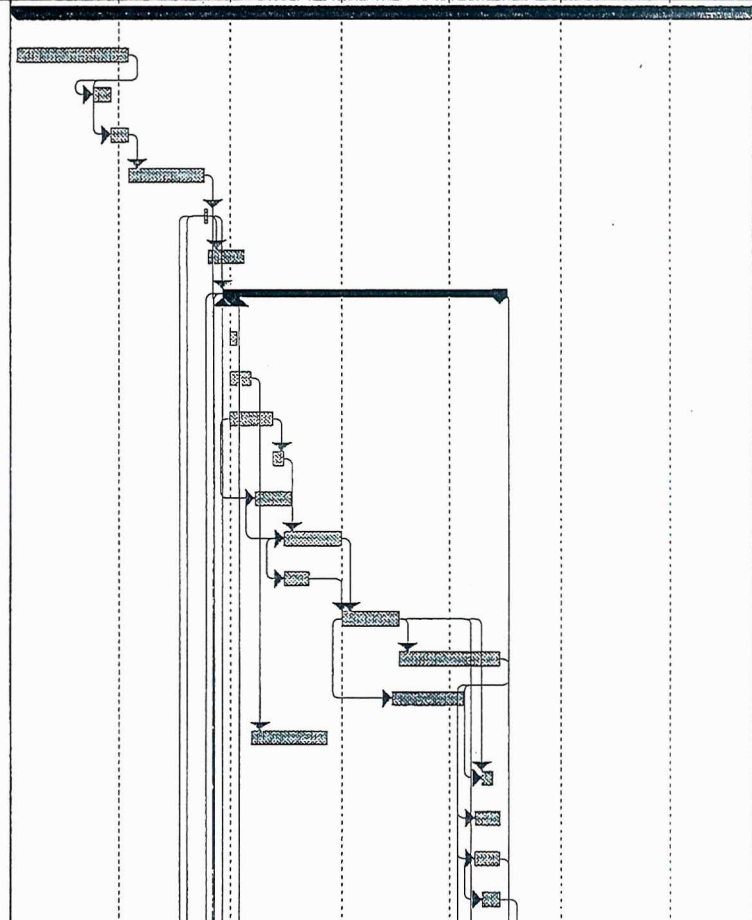

Projekt: Harmonogram prací ZKRÁ
Datum: 25.4. 16

Úkol		Vnější úkoly
Kritický úkol		Souhm projektu
Milník		Seskupit podle souhmu
Souhmný		Neaktivní úkol
Zahmutý úkol		Neaktivní milník
Zahmutý kritický úkol		Neaktivní milník
Zahmutý milník		Neaktivní souhm
Zahmutý průběh		Ruční úkol
Rozdělení		Pouze s dobou trvání

	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Ruční souhm	
	Pouze zahájení	
	Pouze s datem dokončení	
	Vnější úkoly	
	Vnější milník	
	Průběh	
	Konečný termín	

PROGRAM PRACÍ

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	Gantt chart timeline (M 2016 to XII 2016)																											
24	SO 101.2 Vegetační úpravy	13.10. 16	15.10. 16	3 dny	[Timeline visualization for SO 101.2 Vegetační úpravy]																											
25	SO 102 Přejezdy SDP	25.7. 16	31.7. 16	7 dny	[Timeline visualization for SO 102 Přejezdy SDP]																											
26	Zemní práce	25.7. 16	27.7. 16	3 dny	[Timeline visualization for Zemní práce]																											
27	Zhotovení vozovky přejezdů	27.7. 16	31.7. 16	5 dny	[Timeline visualization for Zhotovení vozovky přejezdů]																											
28	SO 181 Přechodné dopravní značení	25.7. 16	16.10. 16	84 dny	[Timeline visualization for SO 181 Přechodné dopravní značení]																											
29	Instalace přechodného dopravního značení	25.7. 16	26.7. 16	2 dny	[Timeline visualization for Instalace přechodného dopravního značení]																											
30	Odstranění přechodného dopravního značení	16.10. 16	16.10. 16	1 den	[Timeline visualization for Odstranění přechodného dopravního značení]																											
31	SO 191 Dopravní značení	8.10. 16	14.10. 16	7 dny	[Timeline visualization for SO 191 Dopravní značení]																											
32	Výměna svislého DZ	8.10. 16	12.10. 16	5 dny	[Timeline visualization for Výměna svislého DZ]																											
33	Vododrovné DZ	11.10. 16	14.10. 16	4 dny	[Timeline visualization for Vododrovné DZ]																											
34	SO 201.1 Most D2 - 020.2	1.8. 16	10.10. 16	71 dny	[Timeline visualization for SO 201.1 Most D2 - 020.2]																											
35	Odfrézování AB krytu	1.8. 16	3.8. 16	3 dny	[Timeline visualization for Odfrézování AB krytu]																											
36	Pokládka nové obrusné vrstvy včetně opravy spár	7.10. 16	10.10. 16	4 dny	[Timeline visualization for Pokládka nové obrusné vrstvy včetně opravy spár]																											
37	SO 201.2 Most D2 - 022.2	4.8. 16	14.10. 16	72 dny	[Timeline visualization for SO 201.2 Most D2 - 022.2]																											
38	Odfrézování AB krytu	4.8. 16	6.8. 16	3 dny	[Timeline visualization for Odfrézování AB krytu]																											
39	Pokládka nové obrusné vrstvy včetně opravy spár	11.10. 16	14.10. 16	4 dny	[Timeline visualization for Pokládka nové obrusné vrstvy včetně opravy spár]																											
40	SO 401.01 Přeložka kabelů NN	25.7. 16	31.7. 16	7 dny	[Timeline visualization for SO 401.01 Přeložka kabelů NN]																											
41	SO 401.02 Přeložka a ochrana kabelů SEK v SDP	25.7. 16	31.7. 16	7 dny	[Timeline visualization for SO 401.02 Přeložka a ochrana kabelů SEK v SDP]																											
42	Předání díla do provozu	16.10. 16	16.10. 16	1 den	[Timeline visualization for Předání díla do provozu]																											
43	Odstranění ZS, dokončující práce, vyhotovení dokumentace pro předání díla	17.10. 16	22.12. 16	53 dny	[Timeline visualization for Odstranění ZS, dokončující práce, vyhotovení dokumentace pro předání díla]																											
44	Předání dokončeného díla	23.12. 16	23.12. 16	1 den	[Timeline visualization for Předání dokončeného díla]																											

Projekt: Harmonogram prací ZKRÁ Datum: 25.4. 16	Úkol		Vnější úkoly		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	◆
	Kritický úkol		Souhm projektu		Ruční souhrn	◆
	Milník	◆	Seskupit podle souhrnu		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní úkol		Pouze s datem dokončení	
	Zahmutý úkol		Neaktivní milník		Vnější úkoly	◆
	Zahmutý kritický úkol		Neaktivní milník		Vnější milník	
	Zahmutý milník	◇	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Zahmutý průběh		Ruční úkol	◇	Konečný termín	↓
	Rozdělení		Pouze s dobou trvání			

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost: Skanska a.s.,
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8,
IČ: 26271303,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevo, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 525664 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele **zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou (včetně zejména technických podmínek)**, uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
Ing. Pavel Dudík Dopravní stavby		
Ing. Michal Hrutkai Mosty a inženýrské konstrukce		
Ing. Ilja Hustý Statika a dynamika staveb		

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Uherském Hradišti dne 3.5.2016

Skanska a.s.

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Realizační dokumentace bude vyhotovena subdodavatelem - projekční společností Dopravní stavby PROJEKCE s r.o.

Výstupní kontrola bude spočívat v níže uvedených činnostech prováděných autorizovanými osobami v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce uvedenými ve formuláři 4.4.7.

Systém činnosti výstupní kontroly RDS:

- seznámení autorizovaných osob s výstupy ze vstupního jednání ke zpracování RDS jednotlivých stavebních objektů
- převzetí pracovního paré ke kontrole a připomínkování /současně s předložením objednateli/
- kontrola zpracování připomínek a předání zpracovateli k zapracování /kopie pro objednatele/
- kontrola zapracování připomínek do čístopisu RDS
- potvrzení čístopisu RDS (v případě, že se nezúčastní jednání, bude seznámen s obsahem jednání)

Harmonogram předání RDS je doložen v části FORMULÁŘE 4.4.6

V Uherském Hradišti dne 3.5.2016

Skanska a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost: Skanska a.s.,
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8,
IČ: 26271303,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevo“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 525664 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
2.	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
2.	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Uherském Hradišti dne 3.5.2016

Skanska a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.12
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost: Skanska a.s.,
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8,
IČ: 26271303,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce CB vozovky D2 km 18,4 - 11,9 vlevo, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek VZ 525664 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

alternativa A

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

V Uherském Hradišti dne 3.5.2016

Skanska a.s.
