


„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 3, 2019		Čtvrt. 4, 2019		Čtvrt. 1, 2020			Čtvrt. 2, 2020			Čtvrt. 3, 2020			Čtvrt. 4, 2020			Čtvrt. 1, 2021			Čtvrt. 2, 2021				
					VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
1	„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“	670 dny	1.8. 19	31.5. 21	[Gantt bar]																							
3	Přípravné práce	213 dny	1.8. 19	29.2. 20	[Gantt bar]																							
4	Příprava zhotovitele na stavební sezónu	122 dny	1.8. 19	30.11. 19	[Gantt bar]																							
5	Výkopy a pokládka kabelových tras	122 dny	1.8. 19	30.11. 19	[Gantt bar]																							
6	Úpravy ve VB pro umístění technologie SZZ	122 dny	1.8. 19	30.11. 19	[Gantt bar]																							
7	Projektování, výroba, montáž a odzkoušení MPZZ v TÚ	213 dny	1.8. 19	29.2. 20	[Gantt bar]																							
8	Realizace železničního a svršku a spodku ve výhybně včetně provizorních výhybek L1 a L2, zatím bez zapojení do TK č.1, výstavba pažení, vložení provizorní výhybky pro zapojení vlečky Duchcovská svařovna, práce na TV	21 dny	1.10. 19	21.10. 19	[Gantt bar]																							
9	Demontáže kolejí v ŽST Oldřichov u Duchcova	21 dny	1.8. 19	21.8. 19	[Gantt bar]																							
11	SO 11-21-01 propustek	21 dny	1.10. 19	21.10. 19	[Gantt bar]																							
12	SO 11-21-02 propustek	21 dny	1.10. 19	21.10. 19	[Gantt bar]																							
13	SO 11-21-03 propustek	21 dny	1.10. 19	21.10. 19	[Gantt bar]																							
14	SO 11-21-06 propustek	21 dny	1.10. 19	21.10. 19	[Gantt bar]																							
16	SO 11-20-10 most	47 dny	5.9. 19	21.10. 19	[Gantt bar]																							
17	SO 11-71-01 přeložka vodovodu	21 dny	5.9. 19	25.9. 19	[Gantt bar]																							
18	SO 10-26-03 a SO 11-26-01 návěstní lávka krakorec	30 dny	22.9. 19	21.10. 19	[Gantt bar]																							
20	SO 11-20-10 demolice	14 dny	1.10. 19	14.10. 19	[Gantt bar]																							
21	SO 11-20-07 demolice	60 dny	2.10. 19	30.11. 19	[Gantt bar]																							
23	Montáž neutrálních polí TV u mostů SO 11-20-05, SO 11-20-09, SO 11-20-12	14 dny	1.10. 19	14.10. 19	[Gantt bar]																							
24	SO 10-60-01,SO 10-60-02,SO 10-60-03,SO 11-60-01,SO 11-60-02 práce na TV	213 dny	1.8. 19	29.2. 20	[Gantt bar]																							
26	Provizorní zapojení výhybek L1 a L2 ve výhybně Ledvice včetně TV	3 dny	27.2. 20	29.2. 20	[Gantt bar]																							
28	Přípravné práce	3 dny	1.3. 20	3.3. 20	[Gantt bar]																							
29	Aktivace neutrálních polí, propojení provizorní výhybny	1 den	1.3. 20	1.3. 20	[Gantt bar]																							
30	Aktivace MPZZ v TÚ	2 dny	2.3. 20	3.3. 20	[Gantt bar]																							
32	1. stavební postup	122 dny	2.3. 20	1.7. 20	[Gantt bar]																							
33	1. TK směr Bílina, železniční svršek a spodek	122 dny	2.3. 20	1.7. 20	[Gantt bar]																							
34	Provizorní zapojení vlečky Duchcovská svařovna	14 dny	3.4. 20	16.4. 20	[Gantt bar]																							
36	SO 10-14-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, nástupiště	30 dny	19.5. 20	17.6. 20	[Gantt bar]																							
37	SO 11-14-01 Zast.Duchcov, nástupiště	30 dny	19.5. 20	17.6. 20	[Gantt bar]																							
38	SO 11-14-02 Zast.Želénky, nástupiště	30 dny	19.5. 20	17.6. 20	[Gantt bar]																							
39	SO 11-14-03 Zast.Chotějovice, nástupiště	30 dny	19.5. 20	17.6. 20	[Gantt bar]																							
41	Zastřešení SO 11-41-01, SO 11-41-02, SO 11-41-03 včetně technologií	40 dny	23.5. 20	1.7. 20	[Gantt bar]																							
43	SO 10-20-03 nový podchod	70 dny	3.4. 20	11.6. 20	[Gantt bar]																							
44	SO 10-20-04 most sanace pod 1.TK	22 dny	12.3. 20	2.4. 20	[Gantt bar]																							
45	SO 10-20-04 most hydroizolace pod 1.TK a vlečkou	14 dny	3.4. 20	16.4. 20	[Gantt bar]																							
46	SO 11-22-01 silniční nadjezd	11 dny	1.6. 20	11.6. 20	[Gantt bar]																							
47	SO 11-20-01 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20	[Gantt bar]																							
48	SO 11-20-02 most	60 dny	13.4. 20	11.6. 20	[Gantt bar]																							
49	SO 11-20-03 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20	[Gantt bar]																							
50	SO 11-20-04 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20	[Gantt bar]																							
51	SO 11-20-05 most	108 dny	5.3. 20	20.6. 20	[Gantt bar]																							
52	SO 11-20-06 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20	[Gantt bar]																							
53	SO 11-20-08 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20	[Gantt bar]																							
54	SO 11-20-09 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20	[Gantt bar]																							
55	SO 11-20-11 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20	[Gantt bar]																							
56	SO 11-20-12 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20	[Gantt bar]																							
58	2. stavební postup	80 dny	23.3. 20	10.6. 20	[Gantt bar]																							
59	SO 10-14-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, demolice hrany nástupiště a části zastřešení	30 dny	23.3. 20	21.4. 20	[Gantt bar]																							
60	Výstavba SK č. 1,3,5 s provizorním zapojením do výhyby č. 3 stávající	80 dny	23.3. 20	10.6. 20	[Gantt bar]																							
61	Propojení výhybky st.v.č. 3 a nové č. 5 pro účely stavby	2 dny	30.4. 20	1.5. 20	[Gantt bar]																							
62	Výstavba provizorních nástupišť u SK č. 1,3 včetně provizorního přechodu přes SK č. 1	14 dny	7.5. 20	20.5. 20	[Gantt bar]																							
64	3x. stavební postup	3 dny	8.6. 20	10.6. 20	[Gantt bar]																							
65	Náhrada provizorní výhybky na bílinském zhlaví kolejovým polem	1 den	8.6. 20	8.6. 20	[Gantt bar]																							
66	Provizorní umístění provizorní výhybky v nové poloze v 1. SK (X2)	2 dny	9.6. 20	10.6. 20	[Gantt bar]																							
68	3y. stavební postup	21 dny	11.6. 20	1.7. 20	[Gantt bar]																							
69	Dokončení železničního svršku v TK č. 1	21 dny	11.6. 20	1.7. 20	[Gantt bar]																							
70	Otočení výhybny	3 dny	29.6. 20	1.7. 20	[Gantt bar]																							
71	TK č. 1 směr Řetenice	9 dny	23.6. 20	1.7. 20	[Gantt bar]																							
72	SO 10-26-01 návěstní lávka, osazení	1 den	29.6. 20	29.6. 20	[Gantt bar]																							

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 3, 2019		Čtvrt. 4, 2019			Čtvrt. 1, 2020			Čtvrt. 2, 2020			Čtvrt. 3, 2020			Čtvrt. 4, 2020			Čtvrt. 1, 2021			Čtvrt. 2, 2021		
					VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
73																											
74	Výhybný aktivace	1 den	1.7. 20	1.7. 20																							
75																											
76	4. stavební postup	18 dny	2.7. 20	19.7. 20																							
77	TK č. 2 směr Řetenice	12 dny	2.7. 20	13.7. 20																							
78	TK č. 2 směr Bílina, průjezd sanační čističkou	12 dny	2.7. 20	13.7. 20																							
79																											
80	Aktivace def. zab. zařízení po zhlavích a v TÚ	6 dny	14.7. 20	19.7. 20																							
81																											
82	5. stavební postup	122 dny	17.7. 20	15.11. 20																							
83	SK č. 2.,4.,6.,8,10.	90 dny	25.7. 20	22.10. 20																							
84	2. TK směr Bílina, železniční svršek a spodek	122 dny	17.7. 20	15.11. 20																							
85	TK směr Litvínov	2 dny	25.7. 20	26.7. 20																							
86	TK směr Litvínov	9 dny	14.10. 20	22.10. 20																							
87	SO 10-14-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, nástupiště	30 dny	3.10. 20	1.11. 20																							
88	SO 10-14-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, demolice nástupiště	30 dny	3.10. 20	1.11. 20																							
89	SO 11-14-01 Zast.Duchcov, nástupiště	30 dny	3.10. 20	1.11. 20																							
90	SO 11-14-02 Zast.Želénky, nástupiště	30 dny	3.10. 20	1.11. 20																							
91	SO 11-14-03 Zast.Chotějovice, nástupiště	30 dny	3.10. 20	1.11. 20																							
92																											
93	Zastřešení SO 11-41-02, SO 11-41-03 včetně technologií	40 dny	7.10. 20	15.11. 20																							
94	Zastřešení SO 11-41-01 včetně technologií	40 dny	13.9. 20	22.10. 20																							
95																											
96	SO 10-20-01 demolice	60 dny	7.9. 20	5.11. 20																							
97	SO 10-20-02 demolice	60 dny	7.9. 20	5.11. 20																							
98	SO 10-20-03 nový podchod	80 dny	4.8. 20	22.10. 20																							
99	SO 10-20-04 most pod 2.TK	90 dny	25.7. 20	22.10. 20																							
100	SO 11-22-01 silniční nadjezd	14 dny	9.10. 20	22.10. 20																							
101	SO 11-20-01 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20																							
102	SO 11-20-02 most	60 dny	24.8. 20	22.10. 20																							
103	SO 11-20-03 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20																							
104	SO 11-20-04 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20																							
105	SO 11-20-05 most	108 dny	21.7. 20	5.11. 20																							
106	SO 11-20-06 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20																							
107	SO 11-20-08 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20																							
108	SO 11-20-09 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20																							
109	SO 11-20-11 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20																							
110	SO 11-20-12 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20																							
111																											
112	SO 10-26-02 návěstní lávka	35 dny	9.10. 20	12.11. 20																							
113																											
114	Aktivace TZZ	2 dny	14.11. 20	15.11. 20																							
115																											
116	6. stavební postup	14 dny	16.11. 20	29.11. 20																							
117	1.SK + 1. TK železniční svršek a spodek	14 dny	16.11. 20	29.11. 20																							
118																											
119	SO 11-21-04 demolice	14 dny	16.11. 20	29.11. 20																							
120																											
121	Aktivace TZZ	2 dny	20.11. 20	21.11. 20																							
122																											
123	Dokončovací práce (dokončovací práce na mostech, broušení kolejnic, následné podbití atp.), dokončení zrušení (vyplnění prostoru) mostu SO 11-21-04	183 dny	30.11. 20	31.5. 21																							

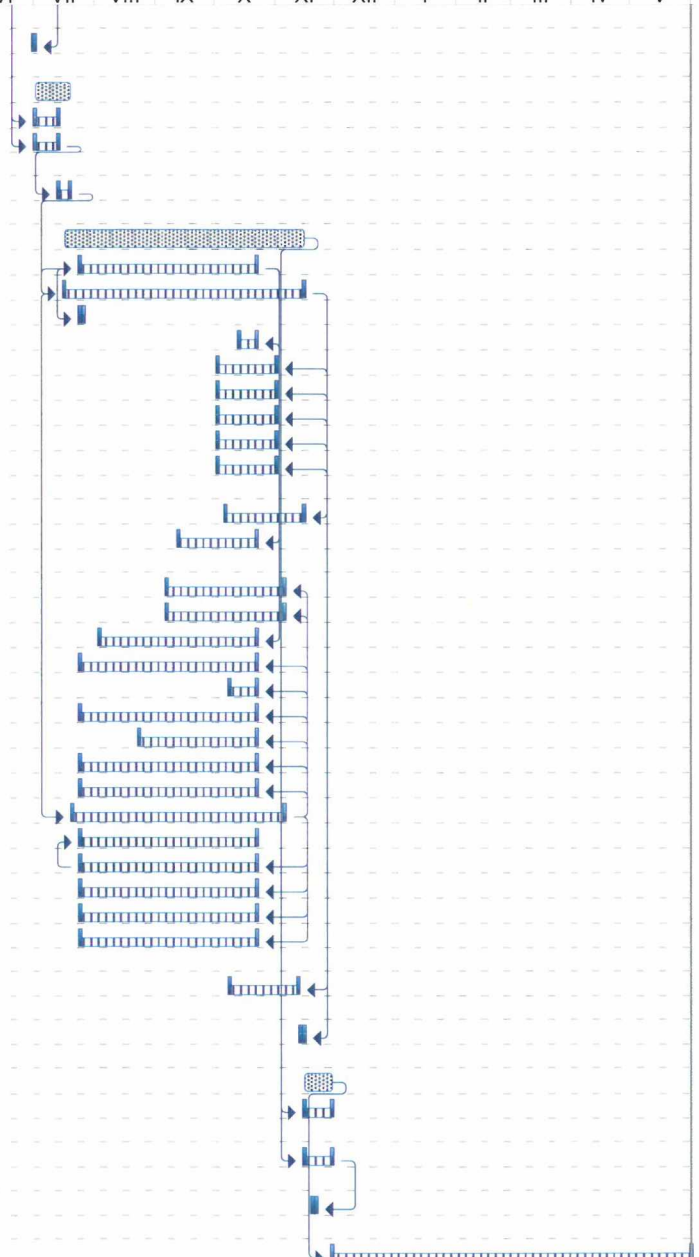

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 351332

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a39a2ba8-fc16-4dc2-8bff-e5481e4de94d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.07.2019 13:06:01



a462f80f-da59-46de-8e5f-99e19bf1d6f4
