


VD Nechanice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

Bez SO 02

Časový harmonogram postupu prací

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Úroveň hladiny VD	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	VD Nechanice - rekonstrukce levého bezpečnostního přelivu r.2019	42 dny	18.04. 19	15.12. 19																				
2	SO 01 Levý přeliv - realizace stavby s provizorním hrazením (bez návodní strany)	242 dny	08.04. 19	05.12. 19																				
3	Úpravy zimního hrazení pro zamezení průsaků do spodní stavby TEBA	7 dny	08.04. 19	14.04. 19																				
4	Dobourání detailů - kouty vč. Úklidu sutí a dočištění FISAD + TEBA Montáže	10 dny	13.04. 19	22.04. 19	3FS-2 dny																			
5	Vypálení zbylé odkryté výztuže a potrubí + montáž odvzdušňovacího potrubí DN 300 Klement	4 dny	15.04. 19	18.04. 19	3																			
6	Betonové konstrukce - spodní stavba (kobky) do úrovně 265,02 m.n.m.	44 dny	15.04. 19	28.05. 19																				
7	Úklid prostoru kobek, vyčerpání vody a naplavenin	8 dny	15.04. 19	22.04. 19	3																			
8	Montáž výztuže, vrtnání a lepení kotev, bednění, betonáže (1,2,3) SMP	36 dny	23.04. 19	28.05. 19	7																			
9	Osazení trnů pro kozlíky hydroválců SMP	1 den	24.04. 19	24.04. 19	8SS+1 den																			
10	Osazení základu kozlíků hydroválců Str Podzimek	7 dny	29.04. 19	05.05. 19	9SS+5 dny																			
11	Vyvaření kozlíků, montáž primárního zavzdušnění Str Podzimek,	8 dny	11.05. 19	18.05. 19	10FS+5 dny																			
12	Montáž potrubí hydrauliky, chrániček elektro Seal, Energo	8 dny	11.05. 19	18.05. 19	11SS																			
13	Prostor bočních štítů L+P pilíř vč. odvdz potrubí a štítů	180 dny	29.05. 19	24.11. 19																				
14	Montáž výztuže, vrtnání a lepení kotev, bednění, betonáže (Z-16) SMP	79 dny	29.05. 19	15.08. 19	8																			
15	Osazení ploten pro technologii Str Podzimek + SMP	1 den	08.06. 19	08.06. 19	14SS+10 dny																			
16	Montáž bočních štítů vč. Odvdz potrubí 1.část Str Podzimek	8 dny	30.06. 19	07.07. 19	15FS+21 dny																			
17	Montáž bočních štítů vč. Odvdz potrubí 2.část Str Podzimek	6 dny	18.07. 19	23.07. 19	16FS+10 dny																			
18	Montáž bočních štítů vč. Odvdz potrubí 3.část Str Podzimek	7 dny	05.08. 19	11.08. 19	17FS+12 dny																			
19	Oprava nátěrů po svařování L+P štítů Str Podzimek	5 dny	12.08. 19	16.08. 19	18																			
20	Montáž teflonového obložení štítů L+P Str Podzimek	6 dny	17.08. 19	22.08. 19	19																			
21	Zavaření montážních otvorů v teflonových štítech L+P Str Podzimek	14 dny	23.08. 19	05.09. 19	20																			
22	Stěna uvnitř pilíře a strogy levý pilíř SMP	12 dny	16.08. 19	27.08. 19	14																			
23	Sanace vnitřků pilířů a návodní strany mostu Čáp	14 dny	06.10. 19	19.10. 19	44																			
24	Montáž poklopů Klement	6 dny	19.08. 19	24.08. 19	22SS+3 dny																			
25	Montáž žebříků Klement	6 dny	20.10. 19	25.10. 19	23																			
26	PS 02 - hydraulické systémy -montáž rozvodů, osazení agregátu Seal	15 dny	26.10. 19	09.11. 19	25																			
27	PS 03 - silnoproudé rozvody - trasy Energo	30 dny	26.10. 19	24.11. 19	26SS																			
28	PS 04 - Motorové rozvody a MAR Energo	30 dny	26.09. 19	25.10. 19	26SS-30 dny																			
29	PS 06 - kamerový systém a telekomunikace Energo	20 dny	16.10. 19	04.11. 19	26SS-10 dny																			
30	Zpětná montáž zábradlí FISAD	14 dny	28.08. 19	10.09. 19	22																			
31	Výměna kompozitního zábradlí za stávající ocelové MEA - FISAD	15 dny	18.09. 19	02.10. 19	30FS+7 dny																			
32	Demontáž zimního hrazení a montáž staveništního hrazení	34 dny	23.08. 19	25.09. 19		265,00																		
33	Demontáž zimního hrazení fa TEBA montáže bez technologické přestávky	14 dny	23.08. 19	05.09. 19	20	266,00																		
34	Dobetonování drážek po provizorním hrazení - neobsahuje PD ani VV - nutno dopracovat	10 dny	06.09. 19	15.09. 19	33	265,00																		
35	Zpětná montáž staveništního hrazení fa MULAČ	10 dny	16.09. 19	25.09. 19	34	265,00																		
36	Přelivná hrana, práh pod klapku vč. Kotev a kozlíků klapky	84 dny	13.09. 19	05.12. 19																				
37	montáž výztuže, vrtnání a lepení kotev, bednění, betonáže (29,30) SMP	69 dny	26.09. 19	03.12. 19	35																			
38	PS 01 Hradicí uzávěr	84 dny	13.09. 19	05.12. 19																				
39	Osazení základu ložiska klapky Str Podzimek	7 dny	01.10. 19	07.10. 19	37SS+5 dny																			
40	Vyvrtnání, osazení, lepení kotev ložisek klapky Freyssinet	12 dny	16.10. 19	27.10. 19	39FS+8 dny	! 263,50 !																		
41	Aktivace kotev Freyssinet	2 dny	03.11. 19	04.11. 19	40FS+6 dny	! 263,50 !																		
42	Osazení ložisek a vyvaření Str Podzimek	9 dny	05.11. 19	13.11. 19	41																			
43	Montáž spodní hrany provizorního hrazení MVS - Podzimek	5 dny	10.11. 19	14.11. 19	41FS+5 dny																			
44	PS 05 Montáž a osazení dorazu stupic na mostní kci vč.lešení MVS	10 dny	26.09. 19	05.10. 19	35																			
45	Demontáž provizorní podpůrné konstrukce mostovky SMP Beroun	10 dny	13.09. 19	22.09. 19	14FS+28 dny																			
46	PS 05 Montáž a kompletace provizorního hrazení MVS - mlíník	4 dny	27.11. 19	30.11. 19	37FS-7 dny																			
47	Demontáž staveništního hrazení fa MULAČ	5 dny	01.12. 19	05.12. 19	46	265,00																		
48	Úplná uzávěra komunikace hráze VD Nechanice	78 dny	13.09. 19	29.11. 19	45SS																			
49	Úplná uzávěra komunikace hráze VD Nechanice	4 dny	27.11. 19	30.11. 19	46SS																			

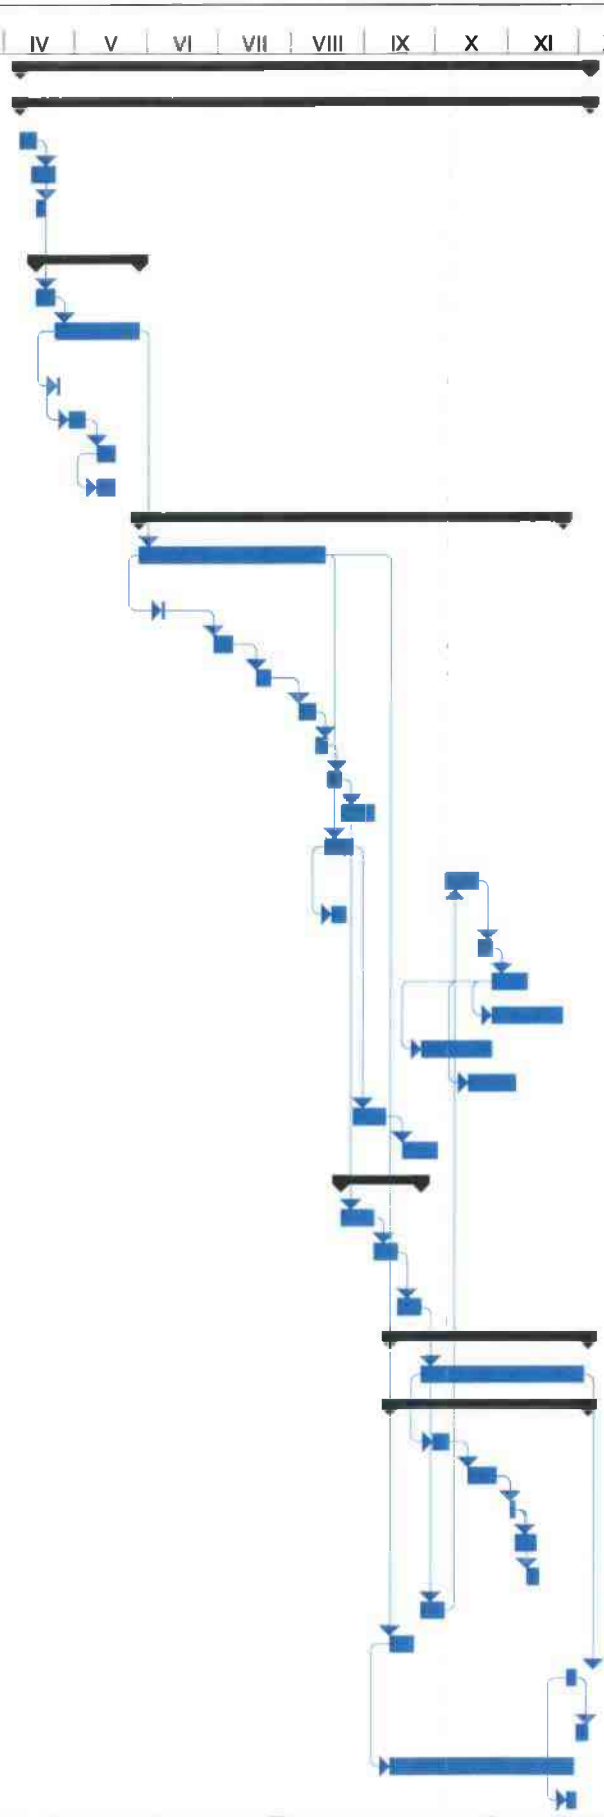

VD Nechanice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

Bez SO 02

Časový harmonogram postupu prací

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1															
2	VD Nechanice - rekonstrukce levého bezpečnostního přelivu r.2020	166 dny	17.06. 20	29.11. 20											
3	SO 01 Levý přeliv - realizace stavby s novými provizorními hrázaním po zimním období (práce budou probíhat pod provizorním hrázaním) Současně objednatelé - od 17.5. zajistí nulový odtok přes bezpečnostní přelivy (PP a SP)	166 dny	17.06. 20	29.11. 20											
4	Osazení a montáž klapky vč těsnění a pomocné OK Str Podzimek	32 dny	17.06. 20	18.07. 20											
5	Osazení rámu kobek hydroválců Str Podzimek	4 dny	19.07. 20	22.07. 20	4										
6	Montáž těsnění hydroválců	4 dny	23.07. 20	26.07. 20	5										
7	Kompletace a seřízení levého přelivu	5 dny	27.07. 20	31.07. 20	6										
8	Stěny 1. dilatační blok	36 dny	19.07. 20	23.08. 20											
9	Montáž výztuže, vrtní a lepení kotev, bodnění, betonáže (6,17-21) SMP	36 dny	19.07. 20	23.08. 20	4										
10	Rozšířená stěna za klapkou - přečnívající výztuž pravý pilíř	23 dny	24.08. 20	15.09. 20											
11	Montáž výztuže, vrtní a lepení kotev, bodnění, betonáže (9-15) SMP	23 dny	24.08. 20	15.09. 20	9										
12	Betonáž dna skluzu	40 dny	16.09. 20	25.10. 20											
13	Montáž výztuže, vrtní a lepení kotev, bodnění, betonáže SMP	40 dny	16.09. 20	25.10. 20	11										
14	Navazující činnosti	166 dny	17.06. 20	29.11. 20											
15	PS 02 hydraulika a servoválců Seall	56 dny	17.06. 20	11.08. 20	4SS										
16	PS 02 dokončení rozvodů hydrauliky Seall	14 dny	05.07. 20	18.07. 20	4FS-14 dny										
17	PS ?X rozvody vzduchu	10 dny	12.08. 20	21.08. 20	15										
18	PS 03 kompletace rozvaděčů ENERGO	21 dny	17.06. 20	07.07. 20	4SS										
19	PS 04 Motorové rozvody a MaR ENERGO	15 dny	17.06. 20	01.07. 20	18SS										
20	PS 06 Komerový systém a telekomunikace - rozvody ENERGO	7 dny	02.07. 20	08.07. 20	19										
21	PS 06 Komerový systém a telekomunikace - kompletace ENERGO	10 dny	09.07. 20	18.07. 20	20										
22	PS 01 Montáž sekundárního zavzdušnění levý pilíř Str. Podzimek	5 dny	11.09. 20	15.09. 20	23SS-5 dny										
23	PS 01 Montáž sekundárního zavzdušnění pravý pilíř Str. Podzimek	5 dny	16.09. 20	20.09. 20	11										
24	PS 01 - PS 06 Suché zkoušky	7 dny	22.08. 20	28.08. 20	17										
25	PS 01 - PS 06 Mokrý zkoušky (v závislosti na klimatických podmínkách)	7 dny	23.11. 20	29.11. 20	13FS+28 dny										
26	Předání dokončeného díla bez návodní strany pilířů	1 den	30.11. 20	30.11. 20	25										

