

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	Předchůdci	Názvy zdrojů	XII 2019												I 2020						II 2020						III 2020						IV 2020																	
								11.	18.	25.	2.	9.	16.	23.	30.	6.	13.	20.	27.	3.	10.	17.	24.	2.	9.	16.	23.	30.	6.																										
1		Rekonstrukce depozitáře SVK PK	20.1. 20	20.1. 21	253 dny?			Rekonstrukce depozitáře SVK PK																																															
2		Podpis SoD	20.1. 20	20.1. 20	1 den?			Podpis SoD 20.1.																																															
3		Předání staveniště	24.1. 20	24.1. 20	1 den?	2FS+3 dny		Předání staveniště 24.1.																																															
4		Příprava zařízení staveniště	27.1. 20	31.1. 20	5 dny	3		Příprava zařízení staveniště 27.1. - 31.1.																																															
5		Bourací práce, zemní práce	3.2. 20	6.3. 20	25 dny	4		Bourací práce, zemní práce 3.2. - 6.3.																																															
6		Speciální zakládání	9.3. 20	3.4. 20	20 dny	5		Speciální zakládání 9.3. - 3.4.																																															
7		Železobetonové konstrukce	6.4. 20	11.9. 20	115 dny	6		Železobetonové konstrukce 6.4.																																															
8		Střešní plášť	14.9. 20	9.10. 20	20 dny	7		Střešní plášť 14.9. - 9.10.																																															
9		Výplně otvorů - fasádní	14.9. 20	23.10. 20	30 dny	7		Výplně otvorů - fasádní 14.9. - 23.10.																																															
10		Opláštění	21.9. 20	13.11. 20	40 dny	9SS+5 dny		Opláštění 21.9. - 13.11.																																															
11		Zděné konstrukce	7.9. 20	2.10. 20	20 dny	7FS-5 dny		Zděné konstrukce 7.9. - 2.10.																																															
12		Hrubé rozvody TZB, elektro	17.8. 20	25.9. 20	30 dny	7FS-20 dny		Hrubé rozvody TZB, elektro 17.8. - 25.9.																																															
13		Podlahové konstrukce	28.9. 20	23.10. 20	20 dny	11SS+5 dny; 8SS+10 dny		Podlahové konstrukce 28.9. - 23.10.																																															
14		Vnitřní dispozice	17.8. 20	25.9. 20	30 dny	12SS		Vnitřní dispozice 17.8. - 25.9.																																															
15		Úpravy povrchů	31.8. 20	2.10. 20	25 dny	14SS+10 dny		Úpravy povrchů 31.8. - 2.10.																																															
16		Dokončovací práce	7.9. 20	8.1. 21	80 dny	15SS+5 dny		Dokončovací práce 7.9. - 8.1. 21																																															
17		Výtah	5.10. 20	11.12. 20	50 dny	11		Výtah 5.10. - 11.12.																																															
18		Kompletace TZB, elektro	14.9. 20	18.12. 20	70 dny	16SS+5 dny		Kompletace TZB, elektro 14.9. - 18.12.																																															
19		Kompletační práce	14.9. 20	18.12. 20	70 dny	18SS		Kompletační práce 14.9. - 18.12.																																															
20		Inženýrské sítě	6.4. 20	30.10. 20	150 dny	6		Inženýrské sítě 6.4. - 30.10.																																															
21		Komunikace a zpevněné plochy	21.9. 20	8.1. 21	70 dny	20FS-30 dny		Komunikace a zpevněné plochy 21.9. - 8.1. 21																																															

Projekt: 19 11 14_Depozitář SVK
Datum: 19.2. 20

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	Předchůdci	Názvy zdrojů	Gantt chart timeline																							
								XII 2019						I 2020						II 2020						III 2020					
								11.	18.	25.	2.	9.	16.	23.	30.	6.	13.	20.	27.	3.	10.	17.	24.	2.	9.	16.	23.	30.	6.		
22		Oplocení	30.11. 20	8.1. 21	20 dny	21FS-20 dny																									
23		Úklid,finální kompletace	4.1. 21	19.1. 21	12 dny	19																									
24		Milník č.1 - Zahájení výstavby	24.1. 20	24.1. 20	1 den?	3SS																									
25		Milník č.2 - Dokončení bouracích prací, provedení vrt.pilot	1.6. 20	1.6. 20	1 den?	7SS+40 dny																									
26		Milník č.3 - Dokončení hrubé	12.10. 20	12.10. 20	1 den?	7FS+20 dny																									
27		Milník č.4 - Dokončení	30.11. 20	30.11. 20	1 den?	10FS+10 dny																									
28		Milník č.5 - Stavební připravenost pro montáž posuvných	7.9. 20	7.9. 20	1 den?	7FS-5 dny																									
29		Kolejnice regálů	8.9. 20	5.10. 20	20 dny	28																									
30		Montáž regálů	14.10. 20	19.1. 21	60 dny	13SS+12 dny																									
31		Milník č.6 - Dokončení a předání	20.1. 21	20.1. 21	1 den?	23																									

Projekt: 19 11 14_Depozitář SVK Datum: 19.2. 20	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

Rekonstrukce depozitáře SVK PK

3.4.


Železobetonové konstrukce

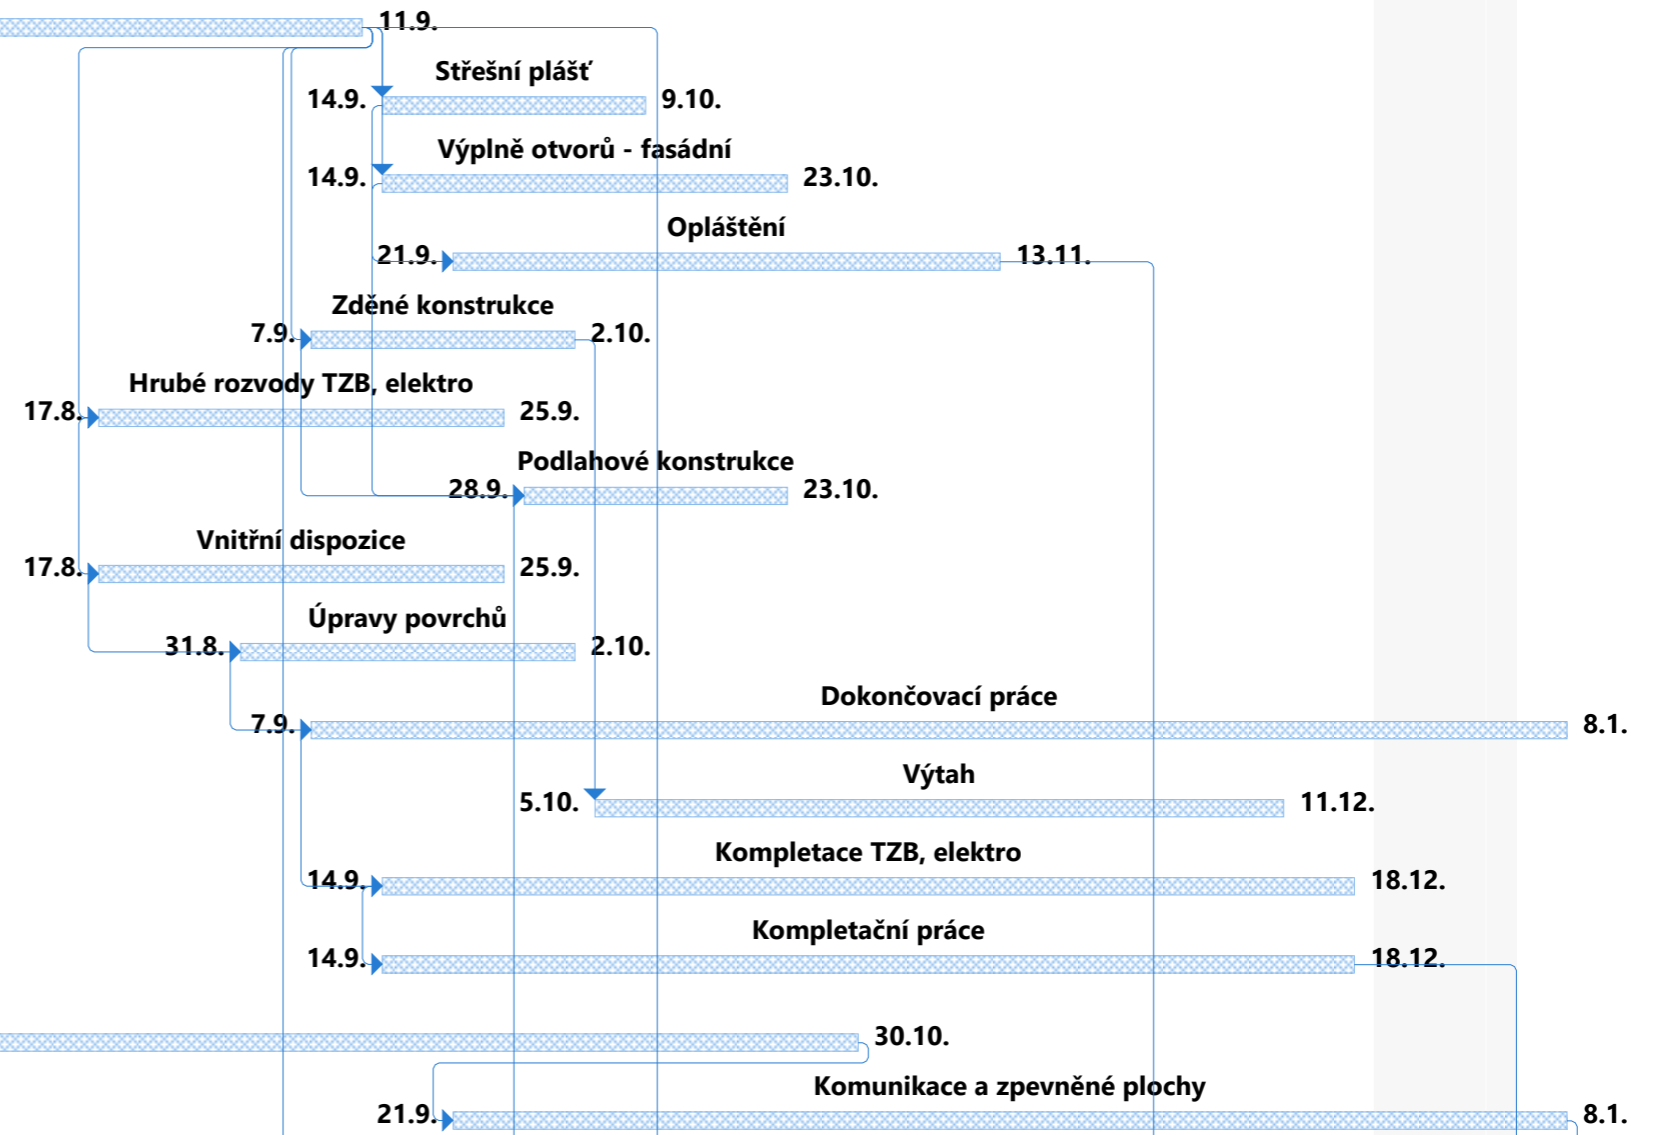

Inženýrské sítě

Projekt: 19 11 14_Depozitář SVK
 Datum: 19.2. 20

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

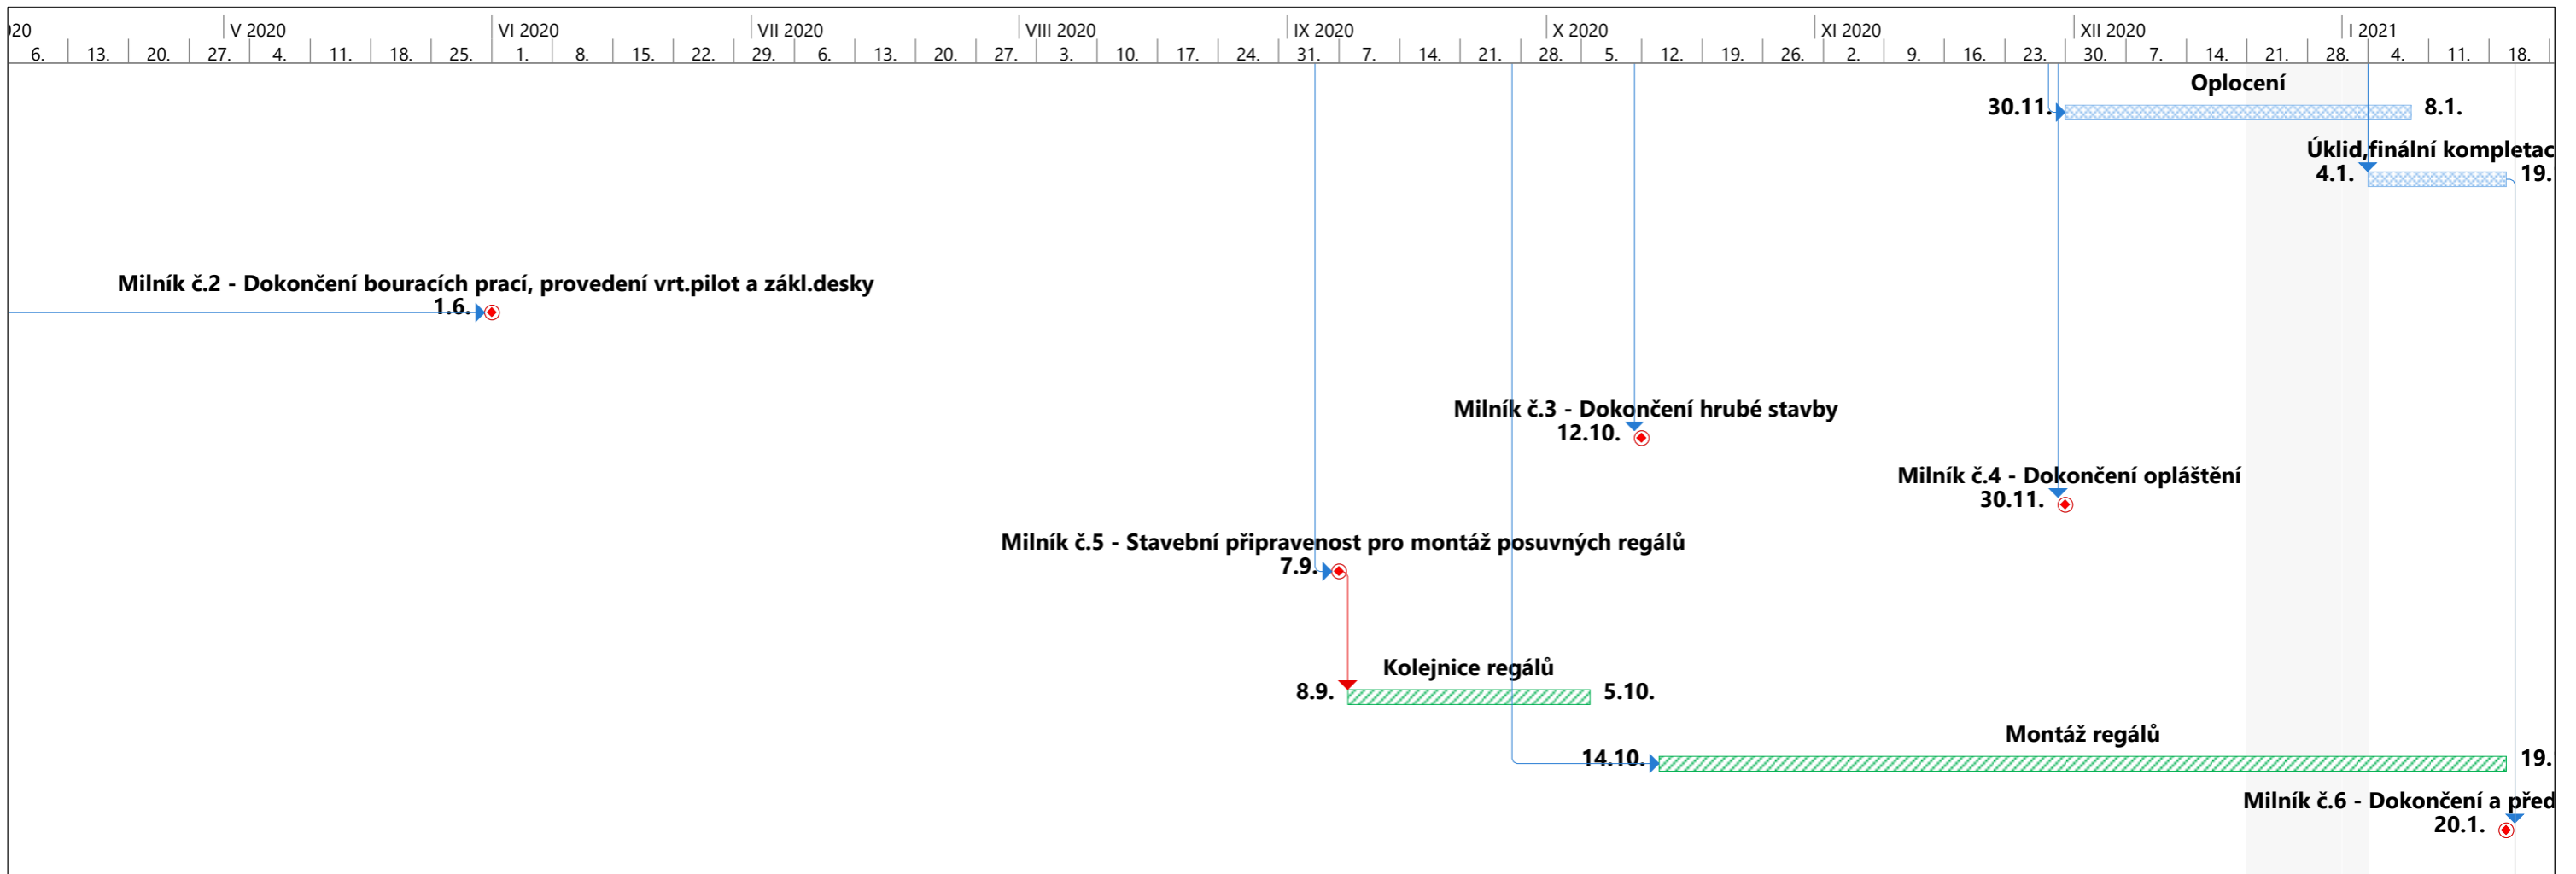

Projekt: 19 11 14_Depozitář SVK
Datum: 19.2. 20

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			
