


Projekt: OS RV - F1.1, G1 a H Datum : 12.04.2017	Úkol		Zahmutý milník		Souhrn projektu		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Zahmutý průběh		Seskupit podle souhrnu		Ruční úkol		Pouze zahájení			
	Souhrnný		Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení			
	Zahmutý úkol		Vnější úkoly		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh			

1 / 3

Vpracoval: Metrostav a.s.

Projekt: OS RV - F1.1, G1 a H Datum :12.04.2017	Úkol		Zahmutý milník		Souhm projektu		Neaktivní souhm		Ruční souhm		Konečný termín	
	Milník		Zahmutý průběh		Seskupit podle souhmu		Ruční úkol		Pouze zahájení			
	Souhmný		Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení			
	Zahmutý úkol		Vnější úkoly		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhmném úkolu		Průběh			
2 / 3												Vypracoval: Metrostav a.s.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	1, 2018	Čtvrt. 2, 2018	Čtvrt. 3, 2018	Čtvrt. 4, 2018	2019	Čtvrt. 1, 2019	Čtvrt. 2, 2019	Čtvrt. 3, 2019	Čtvrt. 4, 2019	2020	Čtvrt. 1, 2020	Čtvrt. 2, 2020	Čtvrt. 3, 2020	Čtvrt. 4, 2020	2021	Čtvrt. 1, 2021	Čtvrt. 2, 2021	Čtvrt. 3, 2021	Čtvrt. 4, 2021
134	Fasáda	186 dny	27.11. 20	31.05. 21																					
135	restaurování stávající fasády v Mikulandské ulici	185 dny	27.11. 20	30.05. 21	111	177;138FS+1 den																			
136	provedení nových fasád	145 dny	06.01. 21	30.05. 21	139FS-30 dny																				
137	Oprava fasády bytového domu	80 dny	26.01. 21	15.04. 21	115FS+10 dny																				
138	Opláštění objektu min z 95%	0 dny	31.05. 21	31.05. 21	135FS+1 den																				
139	Provedení obvodového zdiva	100 dny	28.10. 20	04.02. 21	107	136FS-30 dny;140SS+20 dny																			
140	Vnější výplňové konstrukce	90 dny	17.11. 20	14.02. 21	139SS+20 dny	143SS+45 dny																			
141	Montované a zděné příčky, podhledy	150 dny	17.12. 20	15.05. 21	115FS-30 dny	142SS+27 dny																			
142	Vnitřní omítky, provádění obkladů	140 dny	13.01. 21	01.06. 21	141SS+27 dny;67SS+30 dny;170SS+30 dny																				
143	Hrubé podlahy	110 dny	01.01. 21	20.04. 21	140SS+45 dny;144FS-35 dny;146FS-14 dny																				
144	Nášlapné vrstvy podlah	60 dny	17.03. 21	15.05. 21	143FS-35 dny;145FS-45 dny;183SS+30 dny																				
145	Zármečnické konstrukce	90 dny	01.04. 21	29.06. 21	144FS-45 dny																				
146	Vnitřní ocelové příčky	85 dny	07.04. 21	30.06. 21	143FS-14 dny	147SS+25 dny																			
147	Vnitřní dveře	60 dny	02.05. 21	30.06. 21	146SS+25 dny																				
148	Malby a nátěry	60 dny	02.05. 21	30.06. 21	142FS-31 dny	150SS+10 dny																			
149	Výtahy	90 dny	27.12. 20	26.03. 21	115FS-20 dny																				
150	Dokončovací a kompletační práce PSV	90 dny	12.05. 21	09.08. 21	148SS+10 dny	178FS-20 dny																			
151	TZB	294 dny	30.09. 20	20.07. 21	8																				
152	Zahájení rozvodů TZB	0 dny	30.09. 20	30.09. 20	154SS																				
153	ZTI	265 dny	30.09. 20	21.06. 21																					
154	Hrubé rozvody a stoupačky	190 dny	30.09. 20	07.04. 21	102FS-9 dny	152SS																			
155	Kompletace	130 dny	12.02. 21	21.06. 21	142SS+30 dny	172FS-10 dny;171																			
156	VZT	256 dny	09.10. 20	21.06. 21																					
157	Hrubé rozvody a stoupačky	190 dny	09.10. 20	16.04. 21	102																				
158	Kompletace	130 dny	12.02. 21	21.06. 21	142SS+30 dny	171																			
159	Vytápění a chlazení	256 dny	09.10. 20	21.06. 21																					
160	Hrubé rozvody a stoupačky	190 dny	09.10. 20	16.04. 21	102																				
161	Kompletace	130 dny	12.02. 21	21.06. 21	142SS+30 dny	171																			
162	Elektroinstalace	221 dny	13.11. 20	21.06. 21																					
163	Hrubé rozvody a stoupačky	200 dny	13.11. 20	31.05. 21	105																				
164	Kompletace	130 dny	12.02. 21	21.06. 21	142SS+30 dny	171																			
165	Plynovod a stlačený vzduch	256 dny	09.10. 20	21.06. 21																					
166	Hrubé rozvody a stoupačky	200 dny	09.10. 20	26.04. 21	102																				
167	Kompletace	130 dny	12.02. 21	21.06. 21	142SS+30 dny	171																			
168	GHZ, SHZ, ZOTK	256 dny	09.10. 20	21.06. 21																					
169	Hrubé rozvody a stoupačky	200 dny	09.10. 20	26.04. 21	102																				
170	Kompletace	130 dny	12.02. 21	21.06. 21	142SS+30 dny	171																			
171	Provedení zkoušek před kolaudací	20 dny	22.06. 21	11.07. 21	155;158;161;1	180FS+3 dny																			
172	Dokončovací a kompletační práce TZB	30 dny	12.06. 21	11.07. 21	155FS-10 dny	173;179FS-12 dny																			
173	Provedení komplexních zkoušek	9 dny	12.07. 21	20.07. 21	172	185																			
174	Venkovní úpravy	264 dny	09.10. 20	29.06. 21																					
175	Provedení přípojek IS + drenáž v Mikulandské ulici	40 dny	09.10. 20	17.11. 20	102																				
176	Terénní úpravy	30 dny	01.04. 21	30.04. 21	78																				
177	Venkovní komunikace	30 dny	31.05. 21	29.06. 21	135																				
178	Provedení finálního úklidu stavby	25 dny	21.07. 21	14.08. 21	150FS-20 dny																				
179	Stavební a technologická připravenost ke stěhování zařízení školy	0 dny	30.06. 21	30.06. 21	172FS-12 dny																				
180	Kolaudační souhlas - praktické dokončení díla (nestačí žádost ??)	0 dny	14.07. 21	14.07. 21	171FS+3 dny	181SS+10 dny																			
181	Odstraňování vad a nedodělků po kolaudaci a převímáním řízení	37 dny	25.07. 21	30.08. 21	180SS+10 dny;187FS-21 dny;188FS+1 den																				
182	Technologické vybavení UMPRUM	166 dny	16.04. 21	28.09. 21																					
183	Osazování technologického vybavení učeben	95 dny	16.04. 21	19.07. 21	144SS+30 dny	184SS+5 dny																			
184	zapojování jednotlivých technologických zařízení	95 dny	21.04. 21	24.07. 21	183SS+5 dny																				
185	provedení zkoušek technologického vybavení	30 dny	21.07. 21	19.08. 21	173	186																			
186	uvedení technologického zařízení do provozu	40 dny	20.08. 21	28.09. 21	185																				
187	Předání stavby	6 dny	10.08. 21	15.08. 21	181FS-21 dny	190FS-14 dny																			
188	Úplné dokončení díla	0 dny	31.08. 21	31.08. 21	181FS+1 den																				
189	Příprava na zahájení provozu nové budovy UMPRUM	63 dny	02.08. 21	03.10. 21																					
190	Stěhování mobiliáře	40 dny	02.08. 21	10.09. 21	187FS-14 dny	191																			
191	Provedení finálního úklidu po stěhování	21 dny	11.09. 21	01.10. 21	190	192																			
192	Slavnostní uvedení budovy do provozu	0 dny	01.10. 21	01.10. 21	191	193FS+2 dny																			
193	Zahájení výuky ve školním roce 2021/2022	0 dny	03.10. 21	03.10. 21	192FS+2 dny																				

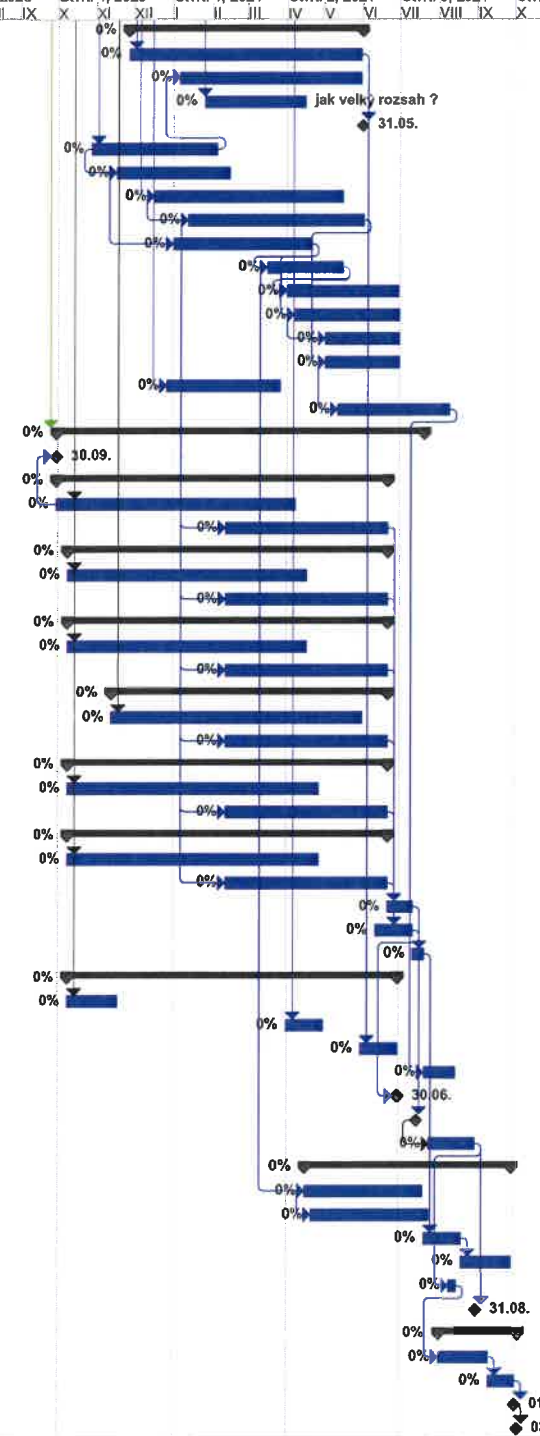

Projekt: OS RV - F1.1, G1 a H
Datum :12.04.2017

Úkol
Mílník
Souhrnný
Zahmutý úkol

Zahmutý mílník
Zahmutý průběh
Rozdělení
Vnější úkoly

Souhrn projektu
Seskupit podle souhrnu
Neaktivní úkol
Neaktivní mílník

Neaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Průběh

Konečný termín
