

Denní záznamy stavby

Datum


KONTROLNÍ DEN

20.10.2020

PŘÍTOMNI - KEAROV, RŮŽENEC, VYROUBAL, PĚK

PO ZEMNUTÁČI STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE NA OKRAJI STŘECHY SPĚREM
KĚ ŽLABŮM, VZNIKL DALŠÍ ODSKOK, VÝŠKA
CCA 14cm A ŠÍŘKA CCA 20cm.

ŘEŠENÍ - DOJEDNĚNÍ TĚTO VÝŠKY YTONGEM A
ZE STRANY FASÁDY ZAKRÝT KLEMPÍŘSKÝM
PRVKEM. POTÉ DODRŽET PŮVODNÍ SKLADBU
STŘECHY. VŠE KOETNĚ OLS DESKY (POD OPCE-
CHOVÁNÍM) UKOTVIT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA.
POUŽITÍ YTONGU JE ODSOULČENO PROJEKČÍ JEK.

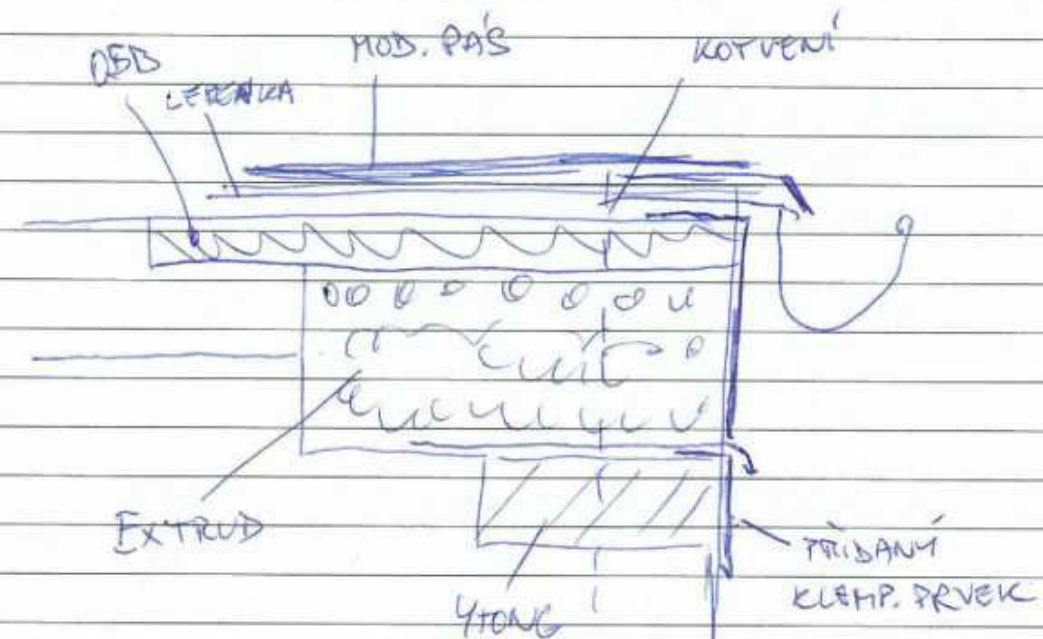

NOVÝ ŘEZ SKLADBY U OKAPU JE VYOBRAZEN
NA PŘILOŽENÉM VÝKRESU OD PROJEKTANTA VEDAG.
ODPOLEDNE ZJIŠTĚNO ŽE JE NUTNO PŘIDAT
JEŠTĚ EXTRUD. POLYSTYREN H. 6cm NA STÁVAJÍCÍ
EXTRUD. H. 12,5cm.

VŠE JE NUTNO ŘEŠIT JAKO VÍCEPRÁCE.
