


Harmonogram výstavby - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň HL. n.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	září	21. březen	11. říjen	01. květen	21. listopad	11. červen	01. leden
							05.10.	11.01.	19.04.	26.07.	01.11.	07.02.	16.05.
1	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň HL. n.	805 dny	19.04. 21	18.05. 24									
2	Zahájení stavby	1 den	19.04. 21	19.04. 21									
3	příprava staveniště - záběr 1	23 dny	19.04. 21	19.05. 21									
4	oplocení staveniště	11 dny	19.04. 21	03.05. 21									
5	ZS1	23 dny	19.04. 21	19.05. 21									
6	ZS2	13 dny	03.05. 21	19.05. 21									
7	ZS3	13 dny	03.05. 21	19.05. 21									
8	připojení na silnoproud	13 dny	03.05. 21	19.05. 21									
9	Eskalátory a část ČD centra - záběr 2	88 dny	03.05. 21	01.09. 21									
10	instalace nových eskalátorů	33 dny	19.07. 21	01.09. 21									
11	Provizorní orientační systém	88 dny	03.05. 21	01.09. 21									
12	rekonstrukce ČD centra	63 dny	24.05. 21	18.08. 21									
13	realizace horkovodního kanálu a výměňkové stanice v 1PP; přepojení na nový horkovod	58 dny	31.05. 21	18.08. 21									
14	Silnoproud - realizace napájecích okruhů a zařízení provizorních zařízení	24 dny	03.05. 21	03.06. 21									
15	Slaboproud - zřízení provizorních zařízení, především datových	24 dny	03.05. 21	03.06. 21									
16	Vytápění - demontáž stávajících otopných větví, příprava nových otopných větví, instalace otopných těles	68 dny	17.05. 21	18.08. 21									
17	ZTI - realizace napojení SV do předávací stanice a TV a CTV z předávací stanice, demolice a dílčí tlakové zkoušky	68 dny	17.05. 21	18.08. 21									
18	VZT a chlazení - montáž A0.10, demontáže stávajících a montáže nových VZT potrubí, osazení nových chladících jednotek a rozvodů	75 dny	17.05. 21	27.08. 21									
19	Dokončení pracovního záběru 2, včetně provedení přejímky (počátek běhu záručních lhůt prací v rozsahu záběru 2)	1 den	01.09. 21	01.09. 21									
20	Nové výtahy - záběr 3	92 dny	12.08. 21	17.12. 21									
21	montáž výtahů mezi halami	43 dny	20.10. 21	17.12. 21									
22	Provizorní orientační systém	88 dny	12.08. 21	13.12. 21									
23	zrušení stávající úschovny zavazadel	88 dny	12.08. 21	13.12. 21									
24	Silnoproud - realizace napájecích okruhů a zařízení provizorních zařízení, případné přeložky	45 dny	12.08. 21	13.10. 21									
25	Slaboproud - zřízení provizorních zařízení, především datových	45 dny	12.08. 21	13.10. 21									
26	Vytápění - mnt otopných těles, rozvodů; montáž hlavního potrubí , demontáž stávajících rozvodů, provizorní napojení VZT na strojovnu v 1.PP	70 dny	30.08. 21	03.12. 21									

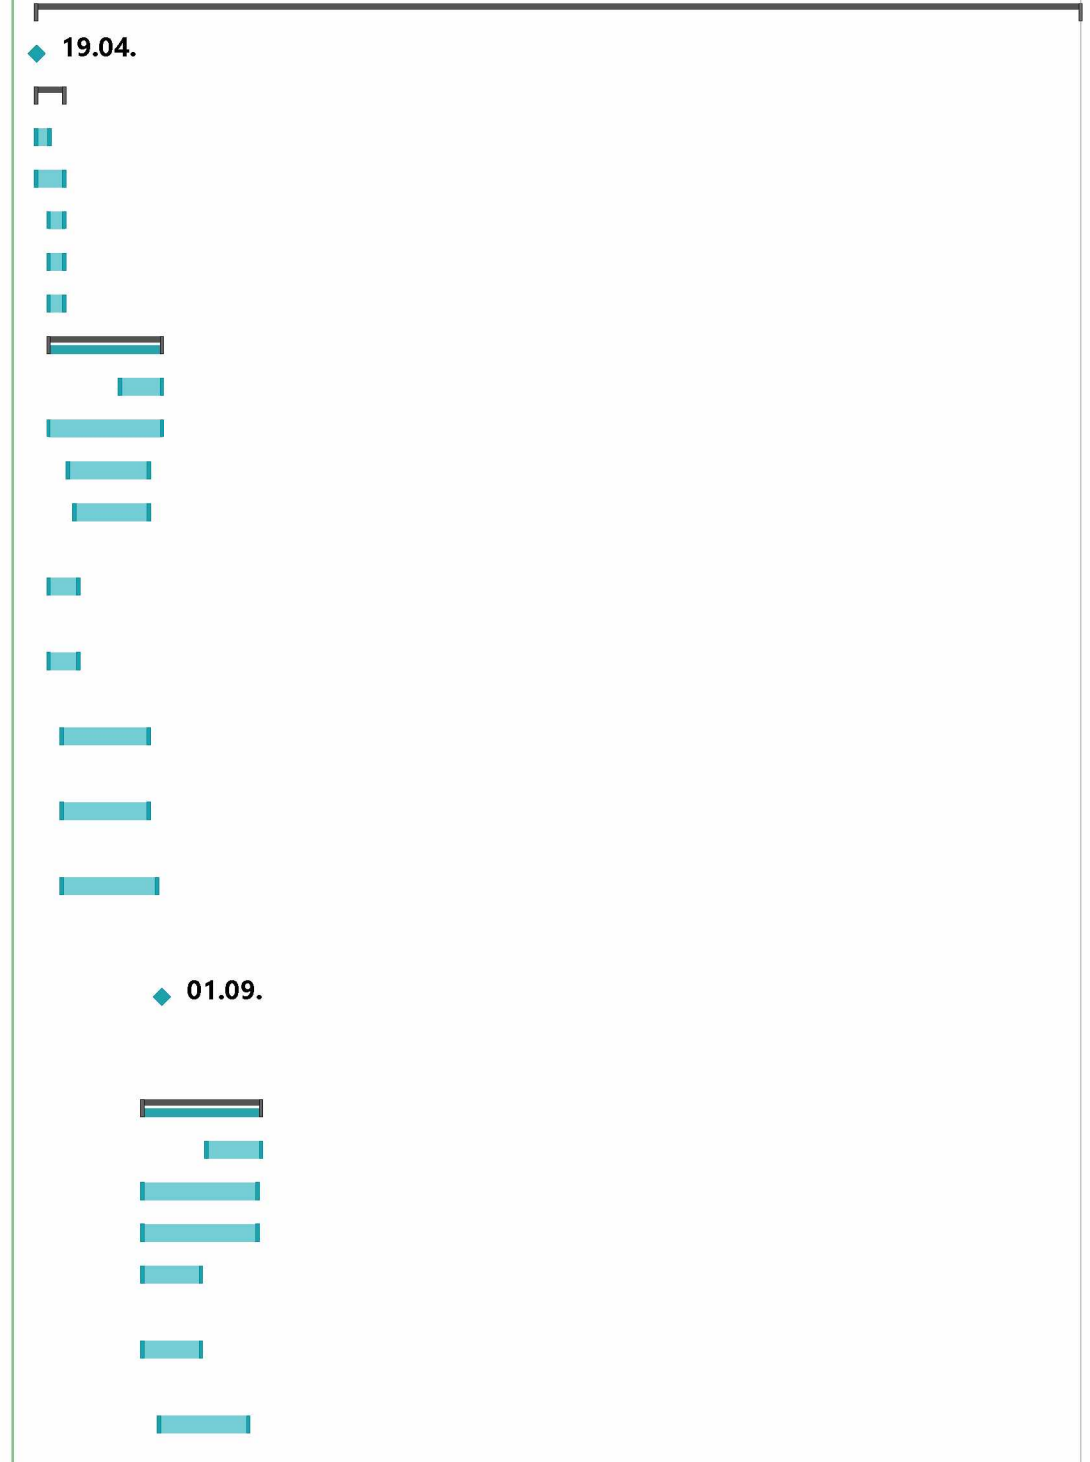

Harmonogram výstavby
18.1.2021
Pozn.: "Doba trvání" - v pracovních dnech

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

Harmonogram výstavby - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň Hl. n.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	září	21. březen	11. říjen	01. květen	21. listopad	11. červen	01. leden
							05.10.	11.01.	19.04.	26.07.	01.11.	07.02.	16.05.
27	ZTI - napojení strojovny VZT na kanalizaci a provizorní přípojku SV, demontáž stávajících rozvodů, dílčí tlakové zkoušky	70 dny	30.08. 21	03.12. 21									
28	VZT a chlazení - demontáže, montáže nových rozvodů a VZT jednotek s návazností na další záběry	80 dny	30.08. 21	17.12. 21									
29	Dokončení pracovního záběru 3, včetně provedení přejímky (počátek běhu záručních lhůt prací v rozsahu záběru 3)	1 den	17.12. 21	17.12. 21									
30	Rekonstrukce východní části 1PP západní budovy - záběr 4	88 dny	18.11. 21	21.03. 22									
31	Architektonicko-stavební část rekonstrukce 1PP nádražní budovy	88 dny	18.11. 21	21.03. 22									
32	Provizorní orientační systém	88 dny	18.11. 21	21.03. 22									
33	Silnoproud - realizace napájecích okruhů a zařízení provizorních zařízení, případně přeložky	71 dny	29.11. 21	07.03. 22									
34	montáž elektrorozvoden	46 dny	03.01. 22	07.03. 22									
35	Slaboproud - úpravy sdělovací místnosti, zřízení provizorních zařízení (především datových)	76 dny	29.11. 21	14.03. 22									
36	zařízení sdělovací místnosti	36 dny	24.01. 22	14.03. 22									
37	Vytápění - mnt otopných těles, rozvodů; montáže hlavního potrubí, demontáž stávajících a provizorních rozvodů, zprovoznění větví ÚT	71 dny	29.11. 21	07.03. 22									
38	ZTI - nové rozvody konenčné i provizorní; demontáže stávajících rozvodů	71 dny	29.11. 21	07.03. 22									
39	VZT a chlazení - demontáž stávajících rozvodů, montáž nových VZT rozvodů, příprava nových rozvodů chlazení a osazení nových vnitřních jednotek	76 dny	29.11. 21	14.03. 22									
40	Dokončení pracovního záběru 4, včetně provedení přejímky (počátek běhu záručních lhůt prací v rozsahu záběru 4)	1 den	21.03. 22	21.03. 22									
41	Rekonstrukce východní budovy včetně střechy - záběr 5	130 dny	19.01. 22	19.07. 22									
42	Architektonicko-stavební část rekonstrukce východní budovy	130 dny	19.01. 22	19.07. 22									
43	stavba lešení	15 dny	21.02. 22	11.03. 22									
44	fasáda východní budovy	49 dny	12.04. 22	17.06. 22									
45	demontáž lešení	11 dny	17.06. 22	01.07. 22									
46	Silnoproud - demontáž stávajících rozvodů, montáž nových	124 dny	19.01. 22	11.07. 22									
47	montáž elektrorozvoden	46 dny	09.05. 22	11.07. 22									
48	Slaboproud - demontáž stávajících rozvodů, montáž nových	124 dny	19.01. 22	11.07. 22									
49	Vytápění - demon. Stáv. Otopné soustavy, provizorní propojení R/S v technické místnosti s novým KPS, zprovoznění předávací stanice, nové rozvody a otopná tělesa, napojení na nově osazenou VZT, demontáž stávající plynové kotelny, regul.sestavy na stáv.st	111 dny	31.01. 22	04.07. 22									

Harmonogram výstavby
18.1.2021
Pozn.: "Doba trvání" - v pracovních dnech


Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

Harmonogram výstavby - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň Hl. n.


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	září	21. březen	11. říjen	01. květen	21. listopad	11. červen	01. leden
							05.10.	11.01.	19.04.	26.07.	01.11.	07.02.	16.05.
50	ZTI - demontáž kotelny a stávajících rozvodů plynových, vodovodních a kanalizačních, nový HUP, nové měření	111 dny	31.01. 22	04.07. 22									
51	VZT a chlazení - demontáž stávajících rozvodů, montáž nových VZT rozvodů, příprava nových rozvodů chlazení a osazení nových vnitřních jednotek	116 dny	31.01. 22	11.07. 22									
52	Dokončení pracovního záběru 5, včetně provedení přejímky (počátek běhu záručních lhůt prací v rozsahu záběru 5)	1 den	19.07. 22	19.07. 22									
53	Rekonstrukce západní části 1.PP západní budovy - záběr 6	44 dny	20.06. 22	18.08. 22									
54	rekonstrukce západní poloviny 1.PP, rekonstrukce jižního bočního vstupu (z přednádraží k tunelu) - arch.stavební	44 dny	20.06. 22	18.08. 22									
55	Provizorní orientační systém	43 dny	21.06. 22	18.08. 22									
56	Silnoproud - montáž rozvodů	31 dny	04.07. 22	15.08. 22									
57	Slaboproud - montáž rozvodů	31 dny	04.07. 22	15.08. 22									
58	Vytápění - montáž rozvodů a OT	26 dny	04.07. 22	08.08. 22									
59	ZTI - napojení na rekonstruované části, demontáže stávajících rozvodů, montáže nových	26 dny	04.07. 22	08.08. 22									
60	VZT a chlazení - montáže rozvodů, napojení na Et a ÚT	31 dny	30.06. 22	11.08. 22									
61	Dokončení pracovního záběru 6, včetně provedení přejímky (počátek běhu záručních lhůt prací v rozsahu záběru 6)	1 den	18.08. 22	18.08. 22									
62	Rekonstrukce hlavního vchodu - záběr 7	44 dny	19.08. 22	19.10. 22									
63	architektonicko-stavební část	44 dny	19.08. 22	19.10. 22									
64	Provizorní orientační systém	44 dny	19.08. 22	19.10. 22									
65	realizace čerpací šachty lapolu	26 dny	30.08. 22	04.10. 22									
66	rekonstrukce bočního vstupu z přednádraží	37 dny	19.08. 22	10.10. 22									
67	realizace dojezdu nové výtahové šachty	26 dny	30.08. 22	04.10. 22									
68	Silnoproud - montáž rozvodů	29 dny	05.09. 22	13.10. 22									
69	Slaboproud - montáž rozvodů	29 dny	05.09. 22	13.10. 22									
70	Vytápění - montáž rozvodů a OT	26 dny	05.09. 22	10.10. 22									
71	ZTI - napojení na rekonstruované části, demontáže stávajících rozvodů, montáže nových	31 dny	30.08. 22	11.10. 22									
72	VZT a chlazení - montáže rozvodů VZT, montáže vnitřních rozvodů chlazení	31 dny	05.09. 22	17.10. 22									
73	Dokončení pracovního záběru 7, včetně provedení přejímky (počátek běhu záručních lhůt prací v rozsahu záběru 7)	1 den	19.10. 22	19.10. 22									
74	Rekonstrukce horních pater západní budovy včetně střechy - záběr 8	152 dny	19.09. 22	18.04. 23									
75	stavba lešení	20 dny	03.10. 22	28.10. 22									
76	fasáda západní budovy a vnitřních prostor haly	76 dny	19.12. 22	03.04. 23									

Harmonogram výstavby 18.1.2021 Pozn.: "Doba trvání" - v pracovních dnech	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

Harmonogram výstavby - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň Hl. n.

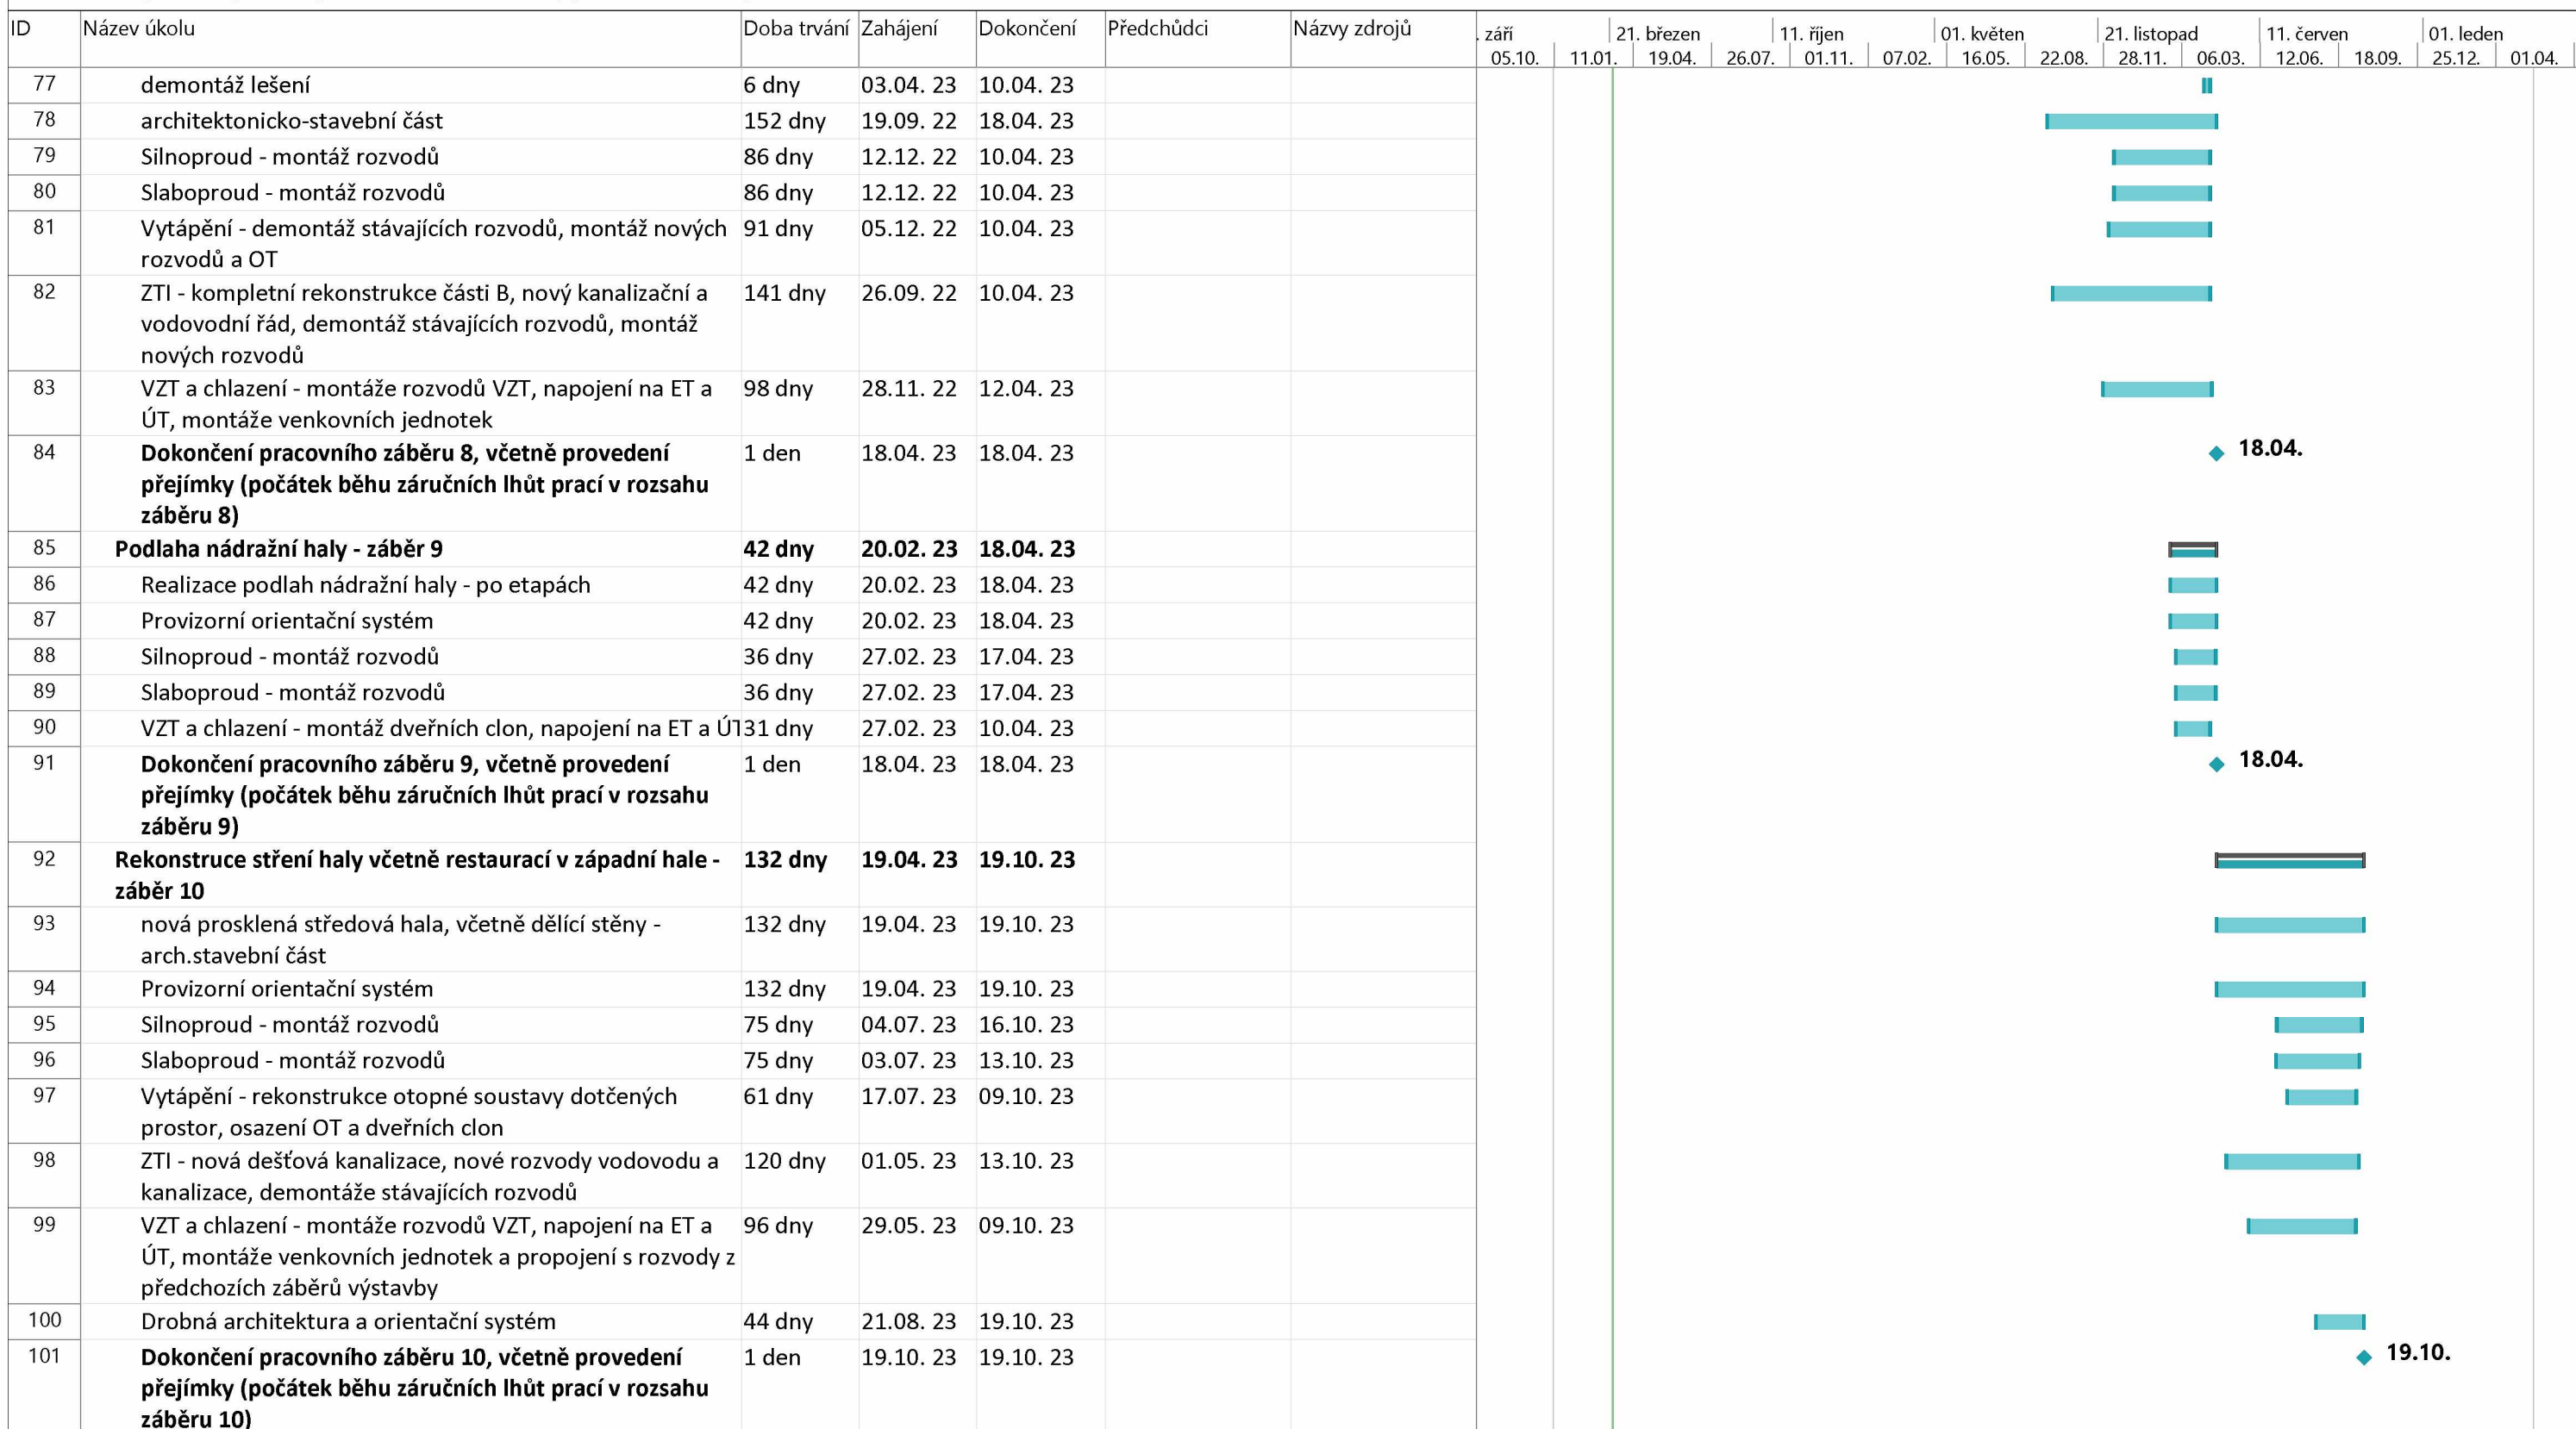

Harmonogram výstavby
18.1.2021
Pozn.: "Doba trvání" - v pracovních dnech



Harmonogram výstavby - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň Hl. n.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	září		21. březen		11. říjen		01. květen		21. listopad		11. červen		01. leden	
							05.10.	11.01.	19.04.	26.07.	01.11.	07.02.	16.05.	22.08.	28.11.	06.03.	12.06.	18.09.	25.12.	01.04.
102	rekonstrukce v přednádraží a dokončovací práce - záběr 11	67 dny	19.08. 23	18.11. 23																
103	rekonstrukce zbývajících prostor - arch.stavební část	67 dny	19.08. 23	18.11. 23																
104	výměna stávající provizorní betoné dlažby a venkovní prác	51 dny	28.08. 23	06.11. 23																
105	Silnoproud - montáž rozvodů	36 dny	25.09. 23	13.11. 23																
106	Slaboproud - montáž rozvodů	36 dny	25.09. 23	13.11. 23																
107	Vytápění - rekonstrukce otopné soustavy dotčených prostor, osazení OT	56 dny	19.08. 23	03.11. 23																
108	ZTI - demontáže stávajících rozvodů, montáže nových rozvodů, dopojení rozvodů ZTI na předchozí záběry	61 dny	19.08. 23	10.11. 23																
109	VZT a chlazení - montáže rozvodů VZT, napojení na ET a Ú	51 dny	28.08. 23	06.11. 23																
110	Rekonstrukce zastřešení nástupiště	52 dny	19.08. 23	30.10. 23																
111	Oplocení stanoviště kontejnerů	30 dny	25.09. 23	03.11. 23																
112	Drobná architektura a orinateční systém	46 dny	04.09. 23	06.11. 23																
113	Dokončení pracovního záběru 11, včetně provedení přejímky (počátek běhu záručních lhůt prací v rozsahu záběru 11); Dokončení prací posledního záběru - uvedení do provozu 31 MĚSÍCŮ OD ZAHÁJENÍ STAVBY	1 den	18.11. 23	18.11. 23																
114	Kompletace dokumentace, zkušební provoz	132 dny	19.11. 23	18.05. 24																
115	Dokončení celého díla včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 37 MĚSÍCŮ OD ZAHÁJENÍ STAVBY	1 den	18.05. 24	18.05. 24																

Harmonogram výstavby

18.1.2021

Pozn.: "Doba trvání" - v pracovních dnech

Úkol		Neaktivní úkol
Rozdělení		Neaktivní milník
Milník		Neaktivní souhrn
Souhrnný		Ruční úkol
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání

	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
	Ruční souhrn
	Pouze zahájení
	Pouze s datem dokončení
	Vnější úkoly

	Vnější milník	
	Konečný termín	
	Průběh	
	Průběh ručně zadaného úkolu	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1475521

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f9584707-f20c-4ff4-9f9d-ef3b5c861846

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2021 13:16:01



cf839fb1-f519-4e62-b88b-743e4fa392e5
