


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IX	Čtvr. 4, 2021	X	XI	XII	Čtvr. 1, 2022	I	II	III	Čtvr. 2, 2022	IV	V	VI	Čtvr. 3, 2022	VII	VIII
1		DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA A																			
2		HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY																			
4		Předání a převzetí zařízení staveniště předpoklad 12.10.2021	0 dny	12.10. 21	12.10. 21																
5		Přípravné práce																			
6		Zřízení zařízení staveniště, oddělení staveniště od provozu školy	2 týdny	12.10. 21	25.10. 21																
7		Demontáže a bourací práce, zadržky	8 týdnů	15.10. 21	09.12. 21																
8		SO01.1 Přístavba ZŠ , SO 01.2 Stavební úpravy ve stávající ZŠ																			
9		Zemní práce, piloty	3 týdny	29.10. 21	18.11. 21																
10		Základy, spodní stavba, rozvody inž. sítí pod objektem	4 týdny	19.11. 21	16.12. 21																
11		Svislé a vodorovné nosné konstrukce	15 týdnů	17.12. 21	31.03. 22																
12		Střecha	5 týdnů	18.03. 22	21.04. 22																
13		Vnější výplně otvorů	4 týdny	01.04. 22	28.04. 22																
14		Hrubé rozvody instalací	5 týdnů	01.04. 22	05.05. 22																
15		Omítky, hrubé podlahy	5 týdnů	22.04. 22	26.05. 22																
16		Obklady a dlažby	4 týdny	27.05. 22	23.06. 22																
17		Fasáda	8 týdnů	29.04. 22	23.06. 22																
18		Konstrukce suché výstavby, podhledy	4 týdny	27.05. 22	23.06. 22																
19		Malby a nátěry,	4 týdny	27.05. 22	23.06. 22																
20		Zámečnické a truhlářské výrobky	3 týdny	17.06. 22	07.07. 22																
21		Kompletace instalací	4 týdny	10.06. 22	07.07. 22																
22		Plošina pro imobilní	2 týdny	24.06. 22	07.07. 22																
23		Povlakové podlahy, vnitřní výplně otvorů	4 týdny	10.06. 22	07.07. 22																
24		Venkovní rozvody inž. sítí																			
25		SO07 Areálové rozvody dešťové kanalizace	6 týdnů	11.03. 22	21.04. 22																
26		SO 08 Retenční a akumulací nádrž	4 týdny	18.03. 22	14.04. 22																
27		SO12 Rekonstrukce stávající kanalizace	4 týdny	15.04. 22	12.05. 22																
28		Terénní úpravy, komunikace, zpevněné plochy, zatravnění	6 týdnů	13.05. 22	23.06. 22																
29		Výměňníková stanice																			
30		Demontáž stávající technologie VS, stavební úpravy ve VS	4 týdny	29.04. 22	26.05. 22																
31		Nová technologie VS	4 týdny	27.05. 22	23.06. 22																
32		Dokončení stavby																			
33		Dokončovací práce, závěrečný úklid	4 týdny	17.06. 22	14.07. 22																
34		Závěrečné zkoušky a měření	4 týdny	14.06. 22	12.07. 22																
35		Předání a převzetí dokončené stavby předpoklad 15.7.2022	0 dny	15.07. 22	15.07. 22																
37		<u>Podmínky platnosti harmonogramu:</u>																			
38		a) Předání pravomocného stavebního povolení vč. všech platných dokladů nejpozději v den předání a převzetí staveniště.																			
39		a) Objednatel zajistí v dostatečném předstihu před dnem předání a převzetí staveniště pokácení a likvidaci všech stromů a keřů v místě stavby.																			
40		c) Přerušení (omezení) prací z důvodů provádění archeolog. průzkumu není v HMG zohledněno.																			
41		d) V HMG není zohledněno přerušení (omezení) prací z důvodů přepracování PD vyvolané jak novými požadavky objednatele, tak změnami technického řešení z důvodů skutečností zjištěných během stavby.																			
42		e) Přerušení (omezení) prací z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech pro jednotlivé stavební práce, není v HMG zohledněno																			

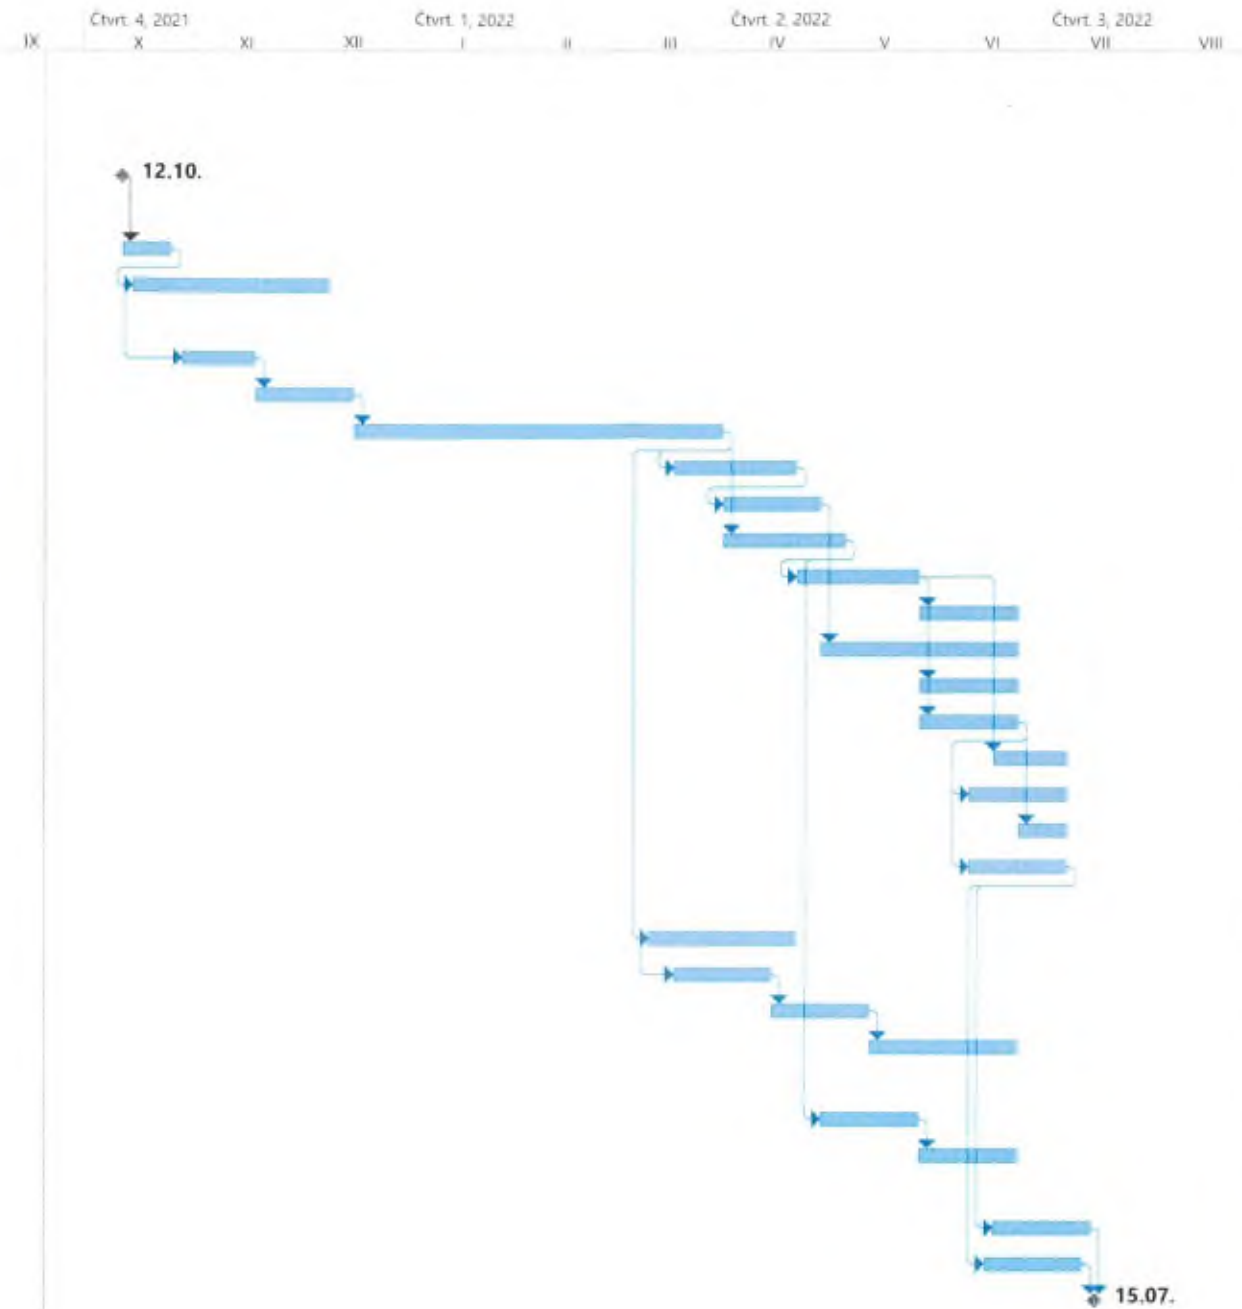

Projekt: HMG Dostavba ZŠ Čak Datum: 20.09. 21	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pauze zahájení		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pauze s dobou trvání		Pauze s datem dokončení		Průběh	
	Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadávaného úkolu	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			

Název VZ: Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice - Etapa A
Uchazeč: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CLEVANS, VISTORIA

FINANČNÍ PLNĚNÍ DÍLA

Měsíc	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	12.10.2021 - 15.7.2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
Finanční plnění v Kč bez DPH											

celková suma 72 788 245,00 Kč
