

Zápis z jednání

Stavba: Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - Dostavba kanalizační sítě, komunikace, včetně rekonstrukce vodovodu.

Předmět jednání: Finální zapravení krajské komunikace III/15275 ul. Ořechovská – skladba konstrukčních vrstev

Datum: 12.01.2021, 10.⁰⁰ hod

Místo konání: SÚS JMK, oblast Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno

Přítomní: viz prezentační listina z 12.01.2021

Na podnět správce předmětné komunikace č. III/15275 SÚS JMK, oblast Střed se uvedeného dne konalo jednání týkající se konečného zapravení vozovky po výstavbě kanalizace a vodovodu na ul. Ořechovská v obci Brno-Horní Heršpice.

Stavba kanalizace je provedena. Stavbou byla dotčena krajská komunikace v jednom jízdním pruhu (spodní a horní úsek) i v obou jízdnicích pruzích (střední úsek). Konečné zapravení vozovky bude provedeno v první polovině roku 2021.

Správce komunikace požaduje ve středním úseku, kde byla stavbou kanalizace dotčena krajská komunikace v obou jízdnicích pruzích v celé šíři vozovky v délce cca 400m, celoplošné zapravení obrusnou (50 mm) a podkladní (150 mm) vrstvou asfaltu a 150 mm vrstvou kameniva zpevněného cementem. Dle mínění SÚS JMK byly všechny tyto vrstvy stavbou kanalizace dotčeny a poškozeny a to i v místech mimo rýhy kanalizačních výkopů.


Ve spodním a horním úseku (stavbou kanalizace dotčen pouze jeden jízdnicí pruh) postačuje zapravení vozovky v šíři dotčeného jízdnicího pruhu.

Bylo dohodnuto:

zhotovitel stavby předloží k odsouhlasení nový návrh řešení skladby konstrukčních vrstev krajské komunikace III/15275 ul. Ořechovská včetně cenových nákladů do 29.01.2021. Na základě těchto informací bude potom dohodnutý další postup mezi investorem, Správou a údržbou silnic a zhotovitelem stavby.

V Brně 12.01.2021

Zaznamenal: za Správu a údržbu silnic, Oblast střed, p.o.k.



Ž.

Prezentační listina

Stavba: Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - Dostavba
kanalizační sítě, komunikace, včetně rekonstrukce vodovodu.

Předmět jednání: Finální zapravení krajské komunikace III/15275 ul. Ořechovská –
skladba konstrukčních vrstev

Datum: 12.01.2021, 10.⁰⁰ hod

Místo konání: SÚS JMK, oblast Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno

Magistrát města Brna

Odbor investiční

Brněnské komunikace

HOCHTIRF CZ a.s.,

SÚS JMK p.o.



Sdružení „Garnets – VRV“
Československých legií 445/4
415 10 Teplice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
21_036VYŘIZUJE
Ostrava
14.04.2021**Věc: Dostavba kanalizace v Brně II**

Stanovisko Zpracovatele PDPS sdružení „KONEKO-DPOVA“ ke změnovému list č. 02/JIH – KO/2020 – Obnova komunikace ul. Ořečovská, ze dne 26.2.2021.

V rámci PDPS byla oprava vozovky v ul. Ořečovská rozložena do tří stavebních objektů: TZ01 splašková kanalizace, TZ03.2 Výtlak, TZ06 vodovod.

V PDPS bylo navrženo odstranění stávajících asfaltových vrstev o mocnosti 50 mm a celoplošná obnova živičných vrstev o celkové tl. 50 mm.

V rýhách po výkopu pro kanalizaci, výtlačku a vodovodu byla navržena 50 mm obrusná vrstva ACO 11+ a podkladní vrstva ACP 22+ tl. 100 mm + stmelená vrstva cementem SC 8/10 tl. 150 mm + nestmelená vrstva ze štěrkodrti 0-63 tl. 200 mm.

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že tloušťka stávajících asfaltových vrstev oproti předpokladu PD je větší, a to v rozmezí od 150 mm po 400 mm.

Na základě požadavku správce komunikace SÚS JMK bylo rozhodnuto, že konečná obnova komunikace v ul. Ořečovské bude provedena tak, aby podkladní stmelené i nestmelené vrstvy a podkladní a obrusná asfaltová vrstva byly provedeny celoplošně v části, kde jsou v souběhu vybudovány inženýrské sítě.


Z uvedeného důvodu byly projektantem stavby vypracovány vzorové příčné řezy obou částí opravy.

S návrhem změnového listu souhlasíme.


S pozdravem



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ UL. OŘECHOVSKÁ
DOLNÍ ÚSEK - POLOVINA ZAMĚŘENÍ

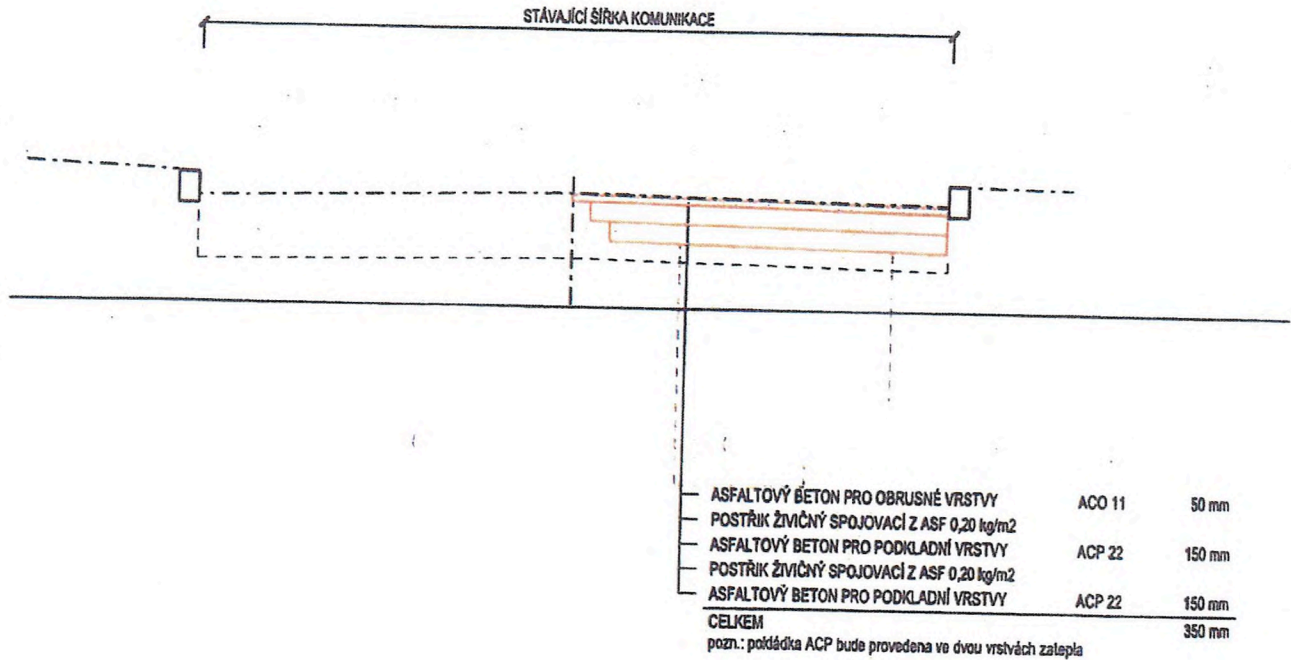

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ UL. OŘECHOVSKÁ
STŘEDNÍ ÚSEK - HORNÍ ÚSEK
CELOPLOŠNÁ OPRAVA PO POLOVINÁCH

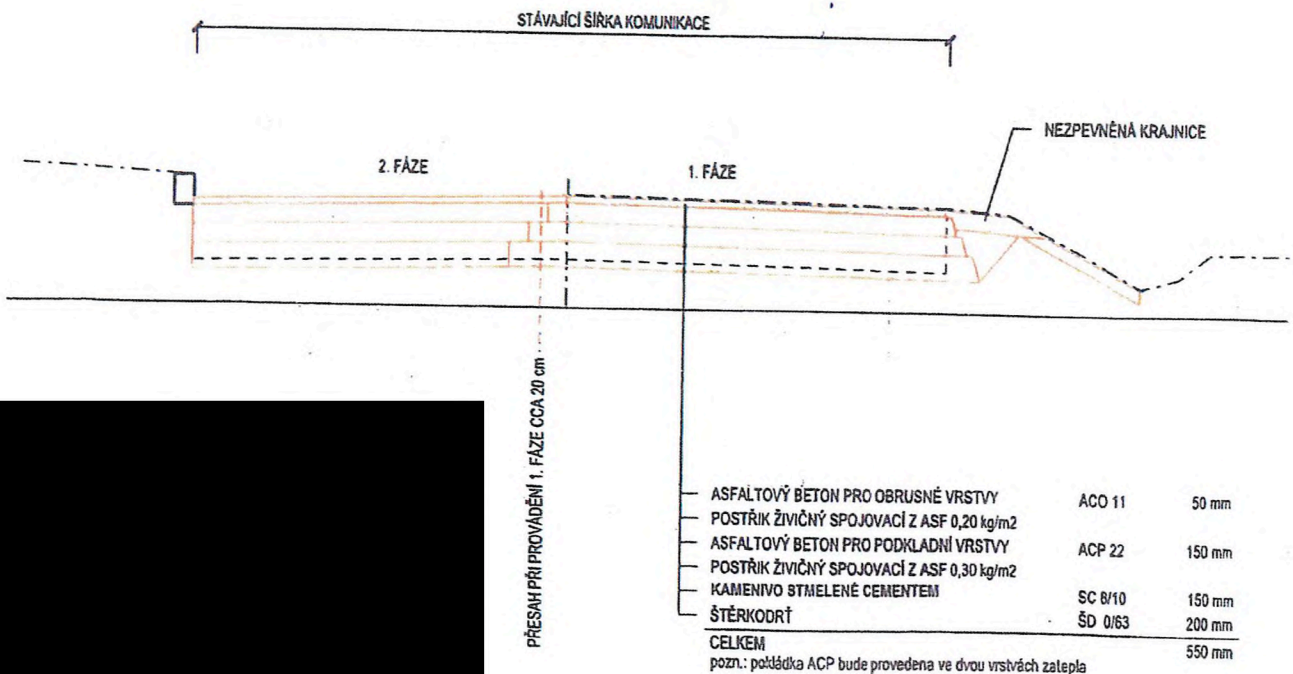

5e

adresát

Sdružení „Garnets – VRV“
[redacted]
Koordinační tým Správce stavby
Československých Legií 445/4
415 10 Teplice
ID DS: 3bcd78d

Společnost „Kanalizace Brno II“
OHL ŽS, a.s. – vedoucí společník
[redacted]
Vedoucí projektu
Burešova 938/17
602 00 Brno - Veverí
ID DS: xbcigdt

váš dopis značky / ze dne	naše značka	vyřizuje	místo odeslání / dne
DZ130/ 21.4.2021	112/21/4/2021	[redacted]	Teplice 21.4.2021

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 15.10.2019 mezi Zhotovitelem Společnost „Kanalizace Brno II.“ a Objednatelem Statutární město Brno; ev.č. Objednatele 5619054122, ev. č. Zhotovitele SOD00200389

Dílo: Brno-jih – dostavba kanalizační sítě

Věc: Pokyn k variaci 16 – ul. Ořechovská

Vážený pane inženýre,

Správce stavby (dále SpSt) obdržel dopis Zhotovitele č. DZ129 ze dne 21.4.2021 – „Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek“ v ul. Ořechovská - sjednocení konstrukčních vrstev a povrchů komunikace, větší tl. frézování stávajících asfaltových vrstev a s tím souvisejících položek (nakládání suti, doprava, poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů).

SpSt v rámci své kontrolní činnosti oznámení Zhotovitele ověřil a pokládá jej za odůvodněné.

Pro zachování plynulosti výstavby vydává tímto Správce stavby dle pod-čl. 13.1 Podmínek Smlouvy pokyn k provádění prací před podpisem změnového listu. Práce budou probíhat dle upravené projektové dokumentace – viz dopis projektanta KONEKO, spol. s r.o. zn. 21_036 ze dne 14.4.2021 a dále za dodržení všech souvisejících Podmínek Smlouvy a Zadávací dokumentace.

Změnový list bude zpracován v souladu s pod-čl. 12 a 13.1 Podmínek Smlouvy a v souladu s Pokynem Správce stavby č. 04, revize 2 – 21.8.2020, který je přílohou zápisu z kontrolního dne č. 12 ze dne 10.9.2020.

Níže uvádíme standardní rozsah příloh změnového listu. Rozsah příloh může být na základě pokynu SpSt upraven:

1. Popis změny
2. Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový rozpočet (v souladu s pod-čl. 12 Podmínek Smlouvy)
3. Stanovisko projektanta
4. Výkresová dokumentace pokud byla zpracována (seznam či popis)
5. Stanoviska dalších osob (znalec, geolog, nebo jiných) pokud byla zpracována - seznam




DOPIS Správce stavby

Dostavba kanalizace v Brně II

6. Další doklady, které umožní bližší dokumentaci změny (fotografie, nákresy, zápisy ze stavebního deníku, situace s vyznačením rozsahu, apod.)
7. Harmonogram provádění změny - dopad změny do harmonogramu

Správce stavby upozorňuje, že do uzavření a podpisu změnového listu nemohou být do vyúčtování zahrnuty položky, které jsou předmětem Variace. Do uzavření změnového listu je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze položky v množství dle platného výkazu výměr.



Brně II
RV
(1)

Na vědomí (elektronická kopie):



Společnost: **SONDEO s.r.o.**, Blatného 1885/36, 616 00 Brno

Kontaktní osoby:



Stavba/ SO: „Dostavba kanalizace Brno II, sekce 5, Brno-jih

Věc: dopis č. 47/2021 – Dostavba kan. Brno II – sanace zemní pláně na ulici Ořechovská

Aktuální situace:

Po odstranění stávající konstrukce komunikace na úroveň zemní pláně na ulici Ořechovská, byla provedena statická zatěžovací zkouška v místě mimo rýhy provedených inženýrských sítí – původní materiál. Zkouška, která byla provedena na jemnozrnné zemině (ojediněle byly zastiženy navážky), prokázala její nevhodnost – nebylo možné naměřit hodnoty.


Návrh sanace:

Provést odkop stávající zeminy v mocnosti 500 mm v šíři 1,0 až 1,2 m (od rýhy kanalizace až do kraje vozovky). Homogenitu paraplaně alespoň orientačně posoudit např. pojezdem. V případě výrazně nehomogenní paraplaně do nejhorších míst zatlačit/zavibrovat např. šterk 63-125. Paraplán zhutnit. Na tuto parapláň uložit filtračně-separační netkanou geotextilii min. 150 g/m², která zamezí mísení původní zeminy s materiálem sanace (geotextilii uložit s přesahem na zásyp rýhy).

Sanaci je možné provést výměnou původní zeminy za vhodný materiál (dle ČSN 73 6133), např. šterkodrť frakce 0/100 mm.

Na sanované části bude provedena nová statická zatěžovací zkouška, která musí prokázat, že sanace aktivní zóny vykazuje hodnoty dle ČSN 72 1006, nebo podle požadavku projektanta.

Skutečná plocha sanace bude doložena dle geodetického zaměření.



Zapsal dne 29. 04. 2021:

Příloha č. 6a - ZL 02/JIH-KOM/2020







Účel jednání	Technický den č. 25 – MČ Brno-Jih
Název zakázky	Dostavba kanalizace v Brně II
Objednatel	Statutární město Brno
Správce stavby	Sdružení „Garnets – VRV“
Zhotovitel	Společnost „Kanalizace Brno II.“ - vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.
Místo konání	Zařízení staveniště ulice Osamělá
Datum a čas	25.1. 2021, 10:00 hod
Rozdělovník	Elektronická kopie všem účastníkům, originál v archivu správce stavby
Účast a omluvy	viz prezenční listina v příloze

<i>bod</i>	<i>zápis</i>	<i>vyřizuje</i>	<i>termín</i>
1.	Přehled prováděných prací	SpSt	

POLOŽENÉ ÚSEKY:

Zahájení prací 19.1.

TZ01 – Stoka S1.1 Š13-24

PLÁNOVANÉ PRÁCE:

Ulice blízka Stoka S1.1.

Větev B úsek Š9 – Š10

Větev A úsek SŠ – Š1

TD. č13 – Čerpání vody probíhá na stavbě od 5.5.2020 podle přítoku vody do rýhy.

2.	Harmonogram (čl. 8.3)	SpSt	
----	-----------------------	------	--

TD č.11 – Dle zápisu z KD č.8, bod 3.1 neběží od 1.4.2020 do 24.4.2020 lhůta milníku T4.

TD č.12 – Harmonogram bude opraven do pondělí 8.6.2020

TD č. 13 – Harmonogram předán, SpSt zašle připomínky.

TD č. 14 – SpSt bez připomínek

TD č.16 – Zhotovitel je vůči harmonogramu ve skluzu - projedná posílení stavby.

TD č. 17: Zhotovitel předpokládá nástup další čety od 09/20, 5 pracovišť

TD č.18 – potvrzena 5 četa od září.

TD č.19 – splněno.

TD č.20 – průměrný počet pracovníků 34-38

TD č.21 – 4 čety, průměrný počet pracovníků 27-30

TD č.24 – 4 čety, průměrný počet pracovníků 27-30, přes období vánoce je pohotovostní kontakt Ing. Zapletal a Ing.

Kvapil.

TD č.25 – 3 čety od 1.2.2021, od 15.2.2021 nastoupí 4. četa

3.	Dokumentace Zhotovitele	Zhot./SpSt	
----	-------------------------	------------	--

TD č.10: - Odsouhlasování změn na přípojkách :

- V případě posunu v rámci povoleného pozemku bude změna zapsána v přípojkovém listu. Pokud bude požadována úprava spádu veřejné části přípojek do max. min. spádu 2 % bude změna projednána s provozem BVaK. V případě nových přípojek má buď vlastník územ. rozhodnutí – pak se přípojka zahrne do stavby nebo nemá povolení a pak lze max. vsadit odbočku na náklady vlastníka, ale pouze se souhlasem provozu BVaK.

TD č.11 – Z důvodu změny průměru stávajícího potrubí ve staničení 0,0, bude vynechána redukce 400/350 a bude provedeno napojení na potrubí DN 400.

TD č. 13 – zhotovitel zašle na vodoprávní úřad podklady pro vydání protokolu o změně stavby.

TD č.14 – dne 22,6,2020 bylo zahájeno řízení ve věci změny územního rozhodnutí.

TD č. 17: SpSt žádá projektanta o vypracování projektové dokumentace změny trasy, podkladu pro změnu stavby před dokončením pro VH orgán do 31.8 2020.

- TD č.18: – Dokumentace na změnu trasy Vídeňská pro SP - zašle projektant zítra ve formátu pdf na odbor investic ke schválení. V týdnu po 7.9.2020 zašle dokumentaci v tištěné podobě (2x potvrzenou autorizačním razítkem, 1x bez razítka).
- TD č.19 – Na špláškové kanalizaci – stoka S1 byla odsouhlasena změna polohy šachty Š1 a Š2 z důvodu kolize s optickým kabelem. Dále byla na stoce S1 schválena úprava spádů od šachty Š2 po SŠ z důvodu, že stávající šachta SŠ je výše než předpokládala PD. Dokumentace na změnu trasy Vídeňská pro SP byla ve formátu pdf předána.
- TD č. 20 – PD Vídeňská předána v tištěné podobě, 15.9. podána žádost o změnu stavby před jejím dokončením
- TD č. 21 – k žádosti o změnu stavby je možné se vyjádřit do 27.10.
- TD č..22 – rozhodnutí o změně stavby bude vydáno v 45. Týdnu.
- TD č..23 – Rozhodnutí o změně stavby vydáno dne 29.10.2020.
- TD č. 24 – Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.12.2020
- TD č. 25 – Zhotovitel zajistí geodetické zaměření vtoku a terénu u ČOV SÚS.(šachta před ČOV).**

4. Fakturace	Zhot./SpSt	
---------------------	------------	--

- TD č.16 - Fakturace za období 15.6 až 14.7. činí 3 104 135,33 Kč, celkem od začátku 13 655 863,73 Kč.
- TD č. 17: beze změn
- TD č. 18: Fakturace za období 15.7. až 14.8. činí 3 687 367,22 Kč, celkem od počátku 17 343 230,95 Kč bez DPH.
- TD č. 19: beze změn
- TD č. 20: probíhá kontrola fakturace 15.8.-14.9.
- TD č. 21: Fakturace za období 15.8.-14.9. činí 4,442.964,29 Kč, celkem od počátku 21,786.195,24 Kč a probíhá kontrola fakturace 15.9.-14.10.
- TD č. 22: beze změn
- TD č. 23: Fakturace za období 15.10 až 14.11. činí 3 939 980,74 Kč, celkem do počátku období 28 410 404, 09 Kč
- TD č. 24: Fakturace za období 15.11. 14.12. nebude.
- TD č. 25: Fakturace za období 15.12. až 14.1. činí 240 904,00 Kč.**

5. Jednání s radnicí místní části, jednání s občany	Zhot./SpSt	
--	------------	--

- TD č.16 – Stížnost [redacted] na havarijní stav vozovky ul. Vídeňská a nárokování škodné události, zhotovitel dosypal vozovku v ul. Moravanské Lány a provedl v ul. Vídeňská provizorní balenou. Zhotovitel vstoupí do jednání s [redacted]
- TD č. 17: Jednání probíhá
- TD č.18 – beze změny
- TD č.19 – MČ JIH požaduje aktivovat jednání s Tech. Sítěmi – [redacted] phledně kabeláže osvětlení. MČ dále předala stížnost [redacted] a špatné značení objížďky na ulici Moravanské Lány. Zhotovitel předá na majetkový odbor MČ JIH termíny realizace prací na pozemku č. 493/1, rozsah dočasného záboru je dle PD 70 m2.
- TD č.20 - Ke stížnosti [redacted] MČ doporučuje nasměrovat objížďky s názvy ulic. S nájemcem probíhá komunikace na stavbě, zatím bez problémů. Diskutována otázka zimní údržby, MČ zašle kontakt na firmu, která tuto lokalitu zajišťovala.
- TD č.21 – směry objížďky s názvy ulic byly instalovány, zhotovitel avizuje větší rozsah uvedení oplocení do původního stavu u změny trasy kanalizace přes pozemek MČ a místo branky osazení jednoduché brány. Zhotovitel vyvolá jednání s firmou zajišťující zimní údržbu lokality.
- TD č.22 – Reklamacce SÚS na zapravené komunikace vyřeší zhotovitel do 15.11.2020 a zároveň k tomuto datu předá komunikace k zimní údržbě.
- TD č.23 – Nesplněno, zhotovitel komunikace předá do 4.12.2020.
- TD č.24 – Městská část Brno Jih upozorňuje zhotovitele, že ZUKy ulicí končí 20.12.2020
- Zhotovitel požádá o nový ZUK v termínech podle harmonogramu.
- TD č. 25 – Vyřízené ZUKy ulice Blízká, Osamělá, Rozhraní 1. část. Chybí ulice Rozhraní 2.část, Vzdálená a Ořechovská. Na zbývající části bude požádáno o ZUK v 5. týdnu.**

6. Oznámení	SpSt	
--------------------	------	--

- TD č. 16 – SpSt upozorňuje zhotovitele na konec ZUK (31.7.2020) na ul. Moravanské Lány a žádá zhotovitele o řešení problému.
- TD č. 17: ZUK Moravanské lány vydán do konce roku 2020.
- TD č.18: ZUK vydán 7.8.2020.
- TD č.21: Zhotovitel dodá negativní stanovisko SÚS k provádění povrchů na ul. Ořechovská v zimních měsících
- TD č.22: Vyjádření SÚS předáno – viz příloha. Vyjádření neřeší požadovaný problém a naopak přináší další požadavky SÚS nad rámec odsouhlaseného projektu. Zhotovitel zajistí opravu vyjádření.
- TD č.23: Zhotovitel zajistí vyjasnění požadavku SÚS na projednávání skladby komunikace.

7.12.2020 v 11 30 hod proběhne předání komunikace Moravanské Lány k zimní údržbě s MČ Brno Jih.
TD č.24: SÚS požaduje po stavbě realizaci vrstev komunikace v celé šíři komunikace. Z tohoto důvodu svolá SÚS jednání týkající se komunikace ulice Ořechovská s odborem investic za účasti správce stavby a PIU.
14.12. proběhne předání komunikace Moravanské Lány k zimní údržbě městské části.
Zimní údržbu bude zajišťovat firma Falky. Ostatní předané ulice bude zimní údržbu zajišťovat zhotovitel (f. Falky).
TD č.25: Jednání na SÚS proběhlo se závěrem, že v místě 1 rýhy bude oprava 1 pruh, v místě 2 rýh bude oprava celoplošná. Zhotovitel provede nacenění opravy podle jednání do konce týdne.

7.	Dokumentace	SpSt BKOM PIU
----	-------------	---------------

TD č.16 – Zhotovitel na základě vzorového řezu a situace ul. Moravanské Lány doplní nacenění prací komunikace. Územní rozhodnutí na změnu trasy nabyde právní mocí dne 7.8.2020.
Projektant zašle souřadnice 2 lomových bodů změny trasy a soupis prací zhotoviteli. Zhotovitel provede vytyčení a následně pochůzku po trase. Zhotovitel provede nacenění soupisu prací.
TD č. 17: podle průzkumu na místě nebude branka výkopem pravděpodobně zasažena. Stále chybí nacenění prací komunikace. Zhotovitel svolá technickou skupinu, předpokládá se po 18. TeD 24.8. za účasti projektanta.
[redacted] poslal rozpis míst, kde realita vjezdu k nemovitosti je odlišná od projektu (ul. Osamělá). SpSt žádá PIU o rozlišení těchto míst, případy změněné vývojem, zapomenuté vyřešení, chyba projektu a o určení, jak případy řešit, zda v rámci projektu, nebo samí investoři. První jednání se uskuteční po TeD v Obřanech 17.8.
TD č.18 – jednání se posouvá z důvodu dovolených po TD 7.9.2020.
TD č.19- Sporné případy vjezdů na pozemky byly projednány za účasti MČ a dohodnut způsob realizace. Projektant na příští TD nachystá opravenou dokumentaci a po odsouhlasení ji projedná s dotčenými orgány.
TD č. 20- Opravenou dokumentaci připraví projektant na příští TeD, dostal opožděně zaměření od geodeta.
V předstihu opravenou dokumentaci zašle účastníkům výstavby s analýzou, které změny přinesl vývoj lokality a co bylo pochybení projektanta.
TD č.21 – Projektant nedostal zpětnou vazbu a svoji analýzu pochybení x vývoj lokality. Zhotovitel vytipoval několik míst vjezdů, kdy vyžaduje rozhodnutí o dalším postupu. Místa označí v projektových výřezech a zašle SpSt.
Rozhodnutí bude konzultováno s BKOM
TD č.22 – Jednání k dořešení vjezdů svolá [redacted]
Přípojky přes pozemek města 1899/2 budou součástí projektu. PIU prověří zdaje pozemek v ÚR a SP. Projektant přeprojektuje spád přípojek dle předchozího do příštího TD.
Místní komunikace -předaný rozpočet prověří stavba a SpSt do konce týdne.
Informace k opravě ul. Ořechovská budou prověřeny do příštího TD – všichni , (stanovisko SÚS).
PIU souhlasí s prodloužením vodovodu řad 5 tak, aby mohl být napojen pozemek č.1904/1.
TD č.23 - Jednání k dořešení vjezdů proběhlo, následný postup řešení problému - projektant opraví dokumentaci a projedná nově řešení s PČR. K zápisu projektanta zašle připomínky [redacted] o 4.12. 2020.
Zhotovitel zašle zaměření SŠ Dešťové stoky na ulici Ořechovské projektantovi do 1.12. Způsob opravy šachty bude zaslán provozovateli ke schválení do 4.12.
Projekt přípojek přes pozemek 1899/2 byl předán.
TD č.24: Dokumentace nepředána, zaměření dna šachty SŠ zasláno, za vhodných klimatických podmínek bude otevřena šachta SŠ a dokončeno zaměření. Následně projektant zpracuje projekt opravy SŠ.
TD č.25: V týdnu od 1.2. proběhne zaměření dna šachty SŠ. Bude předáno projektantovi. Projektant dořeší technické dotazy stavby – viz samostatný mail ze dne 26.1.2021.

8.	Stavební deník (čl. 1.13 PO)	Zhot.	16.1.2020
----	------------------------------	-------	-----------

Správu a archivaci SD zajišťuje [redacted]. Vedení deníku zajišťuje stavba. SD je uložen na staveništi.

9.	Další	
----	-------	--

TD č. 16 – Do příštího TD se všichni podívají na možnost změny prolévaných štěrků na SC v rámci komunikací – sjednocení standardů. Nahradit prolévané štěrky vrstvou SC.
TD č. 17: Do příštího 18. TeD bude na stavbě založen deník změn. Kamerové prohlídky probíhají, zatím nezjištěny žádné nedostatky. Zhotovitel zajistí předání protokolů a videi na DVD pro ucelené úseky SpSt a PIU.
Zkoušky vodotěsnosti šachet – Zhotovitel prověří možnost realizovat zkoušky šachet před ukončením ZUK a bude informovat 24.8.
TD č.18- Deník změn založen. Zhotovitel předal protokoly a videa kamerových prohlídek do 31.7.2020. Pro zkoušky vodotěsnosti šachet zkoumá zhotovitel možnosti.
TD č.19 – beze změny

TD č.20 – [redacted] podal informaci, že soukromník chce na Moravských lánech budovat vodovod. [redacted] provede koordinaci, když od stavby dostane podklad. Stavba si vyžádá stavební povolení včetně dokladové části. ZUK platí do konce roku 2020. K realizaci vodovodu vymezen úsek během října.

Projektant připraví kvalifikovaný rozpočet pro komunikaci Moravské lány do příštího TeD. V projektu provede sjednocení konstrukčních vrstev místo štěrkodrti X KSC

TSB [redacted] projekt VO připraven jen v ul. Rozhraní od Ořech. po Vzdálenou (nové sloupy). E-on má nové betonové sloupy, nebude nic nově realizovat. [redacted] prověří údajnou pokládku optických kabelů do země.

BVK provoz [redacted]: SÚS má areálovou ČOV, její vypust' bude dle projektu zaústěna do nové dešťové kanalizace do doby realizace kanalizační přípojky a ČS. SÚS požadují údajně právo stavby, Gorbunov prověří, kdo v době přípravy projektu za SÚS jednal, do kdy může SÚS vypouštět do dešťové kanalizace.

TD č.21: Vodovod na Moravských lánech položen bez problémů. Předaný rozpočet pro komunikaci Moravské lány není použitelný (jiné položky než v příčných řezech dokumentace). Dohodnuto, že se bude postupovat dle projektové části, zahájení od 26.10. Po zaměření skutečného provedení se dopravuje ZL. Stavba zajistí zátěžové zkoušky podloží v tomto týdnu. Vodítkem prostorového umístění komunikace bude poloha telefonního kabelu.

TD č.22: Zátěžová zkouška podloží bez podkladních vrstev nevyhověla. Zkouška s podkl. vrstvami se uskuteční 3.11. v 10 00 hod.

TD č.23: Zátěžová zkouška na pokladních vrstvách vyhověla, byla ověřena nutnost provedení podkladních vrstev. Zhotovitel aktualizuje bilanci plnění milníku na ulici Ořechovská do 4.12.2020.

TD č.24: Aktualizace zaslána, vyjasnění termínů týkající se bilance plnění milníků bylo dne. 15.12. 2020, VRV Podsedky 3.

TD č.25:

10. Termín dalšího jednání		
----------------------------	--	--

TD č. 26, Sekce MČ Brno - Jih bude: 8.2. 2021 v 10 00 hod na zařízení staveniště ul. Osamělá.


11. Přílohy zápisu: prezenční listina		
---------------------------------------	--	--

1. Prezenční listina


Dle průběhu jednání zapsal: [redacted]

Podpisy:

Objednatel :



Zhotovitel :



PREZENČNÍ LISTINA
Správce stavby



Dostavba kanalizace v Brně II
- MČ Jih

Účel jednání	Technický den č.25 - MČ Jih
Název zakázky	Dostavba kanalizace v Brně II - výběr zhotovitele dostavby kanalizace
Objednatel	Statutární město Brno
Správce stavby	Sdružení „Garnets – VRV“
Zhotovitel	Společnost „Kanalizace Brno II.“ - vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.
Místo konání	Zařízení staveniště ul. Osamělá
Datum a čas	15.1.2021, 10:00 hod

Účastník	Jméno	Telefon	Mail	Podpis
Objednatel				
Správce stavby				
Zhotovitel				
Další účastníci				

Účel jednání	Technický den č. 27 – MČ Brno-Jih
Název zakázky	Dostavba kanalizace v Brně II
Objednatel	Statutární město Brno
Správce stavby	Sdružení „Garnets – VRV“
Zhotovitel	Společnost „Kanalizace Brno II.“ - vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.
Místo konání	Zařízení staveniště ulice Osamělá
Datum a čas	22.2. 2021, 10:00 hod
Rozdělovník	Elektronická kopie všem účastníkům, originál v archivu správce stavby
Účast a omluvy	viz prezenční listina v příloze

<i>bod</i>	<i>zápis</i>	<i>vyřizuje</i>	<i>termín</i>
1.	Přehled prováděných prací	SpSt	

POLOŽENÉ ÚSEKY:

TZ01 – Stoka S1.1 Š24-Š25

TZ04 – Větev B Š11-Š12, Větev A Š1-Š2

PLÁNOVANÉ PRÁCE:

Stoka S1.1. Š25-Š26

Větev B úsek Š12-Š13

Větev A úsek Š2-Š3

TD. č13 – Čerpání vody probíhá na stavbě od 5.5.2020 podle přítoku vody do rýhy.

2.	Harmonogram (čl. 8.3)	SpSt	
----	-----------------------	------	--

TD č.11 – Dle zápisu z KD č.8, bod 3.1 neběží od 1.4.2020 do 24.4.2020 lhůta milníku T4.

TD č.12 – Harmonogram bude opraven do pondělí 8.6.2020

TD č. 13 – Harmonogram předán, SpSt zašle připomínky.

TD č. 14 – SpSt bez připomínek

TD č.16 – Zhotovitel je vůči harmonogramu ve skluzu – projedná posílení stavby.

TD č. 17: Zhotovitel předpokládá nástup další čety od 09/20, 5 pracovišť

TD č.18 – potvrzena 5 četa od září.

TD č.19 – splněno.

TD č.20 – průměrný počet pracovníků 34-38

TD č.21 – 4 čety, průměrný počet pracovníků 27-30

TD č.24 – 4 čety, průměrný počet pracovníků 27-30, přes období vánoc je pohotovostní kontakt Ing. Zapletal a Ing.

Kvapil.

TD č.25 – 3 čety od 1.2.2021, od 15.2.2021 nastoupí 4. četa

TD č.26 – Dle počasí plánovaný nástup 4. čety

TD č.27 – 4. četa pro realizaci přípojek je stále v plánu

3.	Dokumentace Zhotovitele	Zhot./SpSt	
----	-------------------------	------------	--

TD č.10: - Odsouhlasování změn na přípojkách:

- V případě posunu v rámci povoleného pozemku bude změna zapsána v přípojkovém listu. Pokud bude požadována úprava spádu veřejné části přípojek do max. min. spádu 2 % bude změna projednána s provozem BVaK. V případě nových přípojek má buď vlastník územ. rozhodnutí – pak se přípojka zahrne do stavby nebo nemá povolení a pak lze max. vsadit odbočku na náklady vlastníka, ale pouze se souhlasem provozu BVaK.

TD č.11 – Z důvodu změny průměru stávajícího potrubí ve staničení 0,0, bude vynechána redukce 400/350 a bude provedeno napojení na potrubí DN 400.

TD č. 13 – zhotovitel zašle na vodoprávní úřad podklady pro vydání protokolu o změně stavby.

TD č.14 – dne 22,6,2020 bylo zahájeno řízení ve věci změny územního rozhodnutí.

- TD č. 17: SpSt žádá projektanta o vypracování projektové dokumentace změny trasy, podkladu pro změnu stavby před dokončením pro VH orgán do 31.8.2020.
- TD č.18: – Dokumentace na změnu trasy Vídeňská pro SP - zašle projektant zítra ve formátu pdf na odbor investic ke schválení. V týdnu po 7.9.2020 zašle dokumentaci v tištěné podobě (2x potvrzenou autorizačním razítkem, 1x bez razítka).
- TD č.19 – Na splaškové kanalizaci – stoka S1 byla odsouhlasena změna polohy šachty Š1 a Š2 z důvodu kolize s optickým kabelem. Dále byla na stoce S1 schválena úprava spádů od šachty Š2 po SŠ z důvodu, že stávající šachta SŠ je výše než předpokládala PD. Dokumentace na změnu trasy Vídeňská pro SP byla ve formátu pdf předána.
- TD č. 20 – PD Vídeňská předána v tištěné podobě, 15.9. podána žádost o změnu stavby před jejím dokončením
- TD č. 21 – k žádosti o změnu stavby je možné se vyjádřit do 27.10.
- TD č.22 – rozhodnutí o změně stavby bude vydáno v 45. Týdnu.
- TD č.23 – Rozhodnutí o změně stavby vydáno dne 29.10.2020.
- TD č. 24 – Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.12.2020
- TD č. 25 – Zhotovitel zajistí geodetické zaměření vtoku a terénu u ČOV SÚS.(šachta před ČOV).
- TD č. 26 – Zhotovitel zaměřil vtok a terén u ČOV, projekt zpracován.
- TD č. 27 – Napojení areálu SÚS vyřešeno na samostatném jednání dne 10.2.2021, zápis – viz mail [redacted] 11.2.**

4. Fakturace	Zhot./SpSt	
---------------------	------------	--

- TD č.16 - Fakturace za období 15.6 až 14.7. činí 3 104 135,33 Kč, celkem od začátku 13 655 863,73 Kč.
- TD č. 17: beze změn
- TD č. 18: Fakturace za období 15.7. až 14.8. činí 3 687 367,22 Kč, celkem od počátku 17 343 230,95 Kč bez DPH.
- TD č. 19: beze změn
- TD č. 20: probíhá kontrola fakturace 15.8.-14.9.
- TD č. 21: Fakturace za období 15.8.-14.9. činí 4,442.964,29 Kč, celkem od počátku 21,786.195,24 Kč a probíhá kontrola fakturace 15.9.-14.10.
- TD č. 22: beze změn
- TD č. 23: Fakturace za období 15.10 až 14.11. činí 3 939 980,74 Kč, celkem do počátku období 28 410 404, 09 Kč
- TD č. 24: Fakturace za období 15.11. 14.12. nebude.
- TD č. 25: Fakturace za období 15.12. až 14.1. činí 240 904,00 Kč.
- TD č. 26: Beze změn.
- TD č. 27: Fakturace za období 15.1. až 14.2. činí 1 247 210,59 Kč, celkem od začátku 42 729 384,13 Kč**

5. Jednání s radnicí místní části, jednání s občany	Zhot./SpSt	
--	------------	--

- TD č.16 – Stížnost [redacted] na havarijní stav vozovky ul. Vídeňská a nárokování škodné události, zhotovitel dosypal vozovku v ul. Moravanské Lány a provedl v ul. Vídeňská provizorní balenou. Zhotovitel vstoupí do jednání s [redacted]
- TD č. 17: Jednání probíhá
- TD č.18 – beze změny
- TD č.19 – MČ JIH požaduje aktivovat jednání s Tech. Sítěmi – [redacted] ohledně kabeláže osvětlení. MČ dále předala stížnos [redacted] na špatné značení objížďky na ulici Moravanské Lány. Zhotovitel předá na majetkový odbor MČ JIH termíny realizace prací na pozemku č. 493/1, rozsah dočasného záboru je dle PD 70 m2.
- TD č.20 - Ke stížnosti [redacted] MČ doporučuje nasměrovat objížďky s názvy ulic. S nájemcem probíhá komunikace na stavbě, zatím bez problémů. Diskutována otázka zimní údržby, MČ zašle kontakt na firmu, která tuto lokalitu zajišťovala.
- TD č.21 – směry objížďky s názvy ulic byly instalovány, zhotovitel avizuje větší rozsah uvedení oplocení do původního stavu u změny trasy kanalizace přes pozemek MČ a místo branky osazení jednoduché brány. Zhotovitel vyvolá jednání s firmou zajišťující zimní údržbu lokality.
- TD č.22 – Reklamace SÚS na zapravené komunikace vyřeší zhotovitel do 15.11.2020 a zároveň k tomuto datu předá komunikace k zimní údržbě.
- TD č.23 – Nesplněno, zhotovitel komunikace předá do 4.12.2020.
- TD č.24 – Městská část Brno Jih upozorňuje zhotovitele, že ZUKy ulicí končí 20.12.2020
- Zhotovitel požádá o nový ZUK v termínech podle harmonogramu.
- TD č. 25 – Vyřízené ZUKy ulice Blízká, Osamělá, Rozhraní 1. část. Chybí ulice Rozhraní 2.část, Vzdálená a Ořechovská. Na zbývající části bude požádáno o ZUK v 5. týdnu.
- TD č. 26 – Zhotovitel zašle na MČ Brno – Jih harmonogram plánovaných prací do období 30.6.2021 pro zveřejnění ve zpravodaji.
- TD č. 27 – Splněno viz mail [redacted]**

6.	Oznámení	SpSt	
----	----------	------	--

TD č. 16 – SpSt upozorňuje zhotovitele na konec ZUK (31.7.2020) na ul. Moravanské Lány a žádá zhotovitele o řešení problému.
 TD č. 17: ZUK Moravanské lány vydán do konce roku 2020.
 TD č.18: ZUK vydán 7.8.2020.
 TD č.21: Zhotovitel dodá negativní stanovisko SÚS k provádění povrchů na ul. Ořechovská v zimních měsících
 TD č.22: Vyjádření SÚS předáno – viz příloha. Vyjádření neřeší požadovaný problém a naopak přináší další požadavky SÚS nad rámec odsouhlaseného projektu. Zhotovitel zajistí opravu vyjádření.
 TD č.23: Zhotovitel zajistí vyjasnění požadavku SÚS na projednávání skladby komunikace.
 7.12.2020 v 11 30 hod proběhne předání komunikace Moravanské Lány k zimní údržbě s MČ Brno Jih.
 TD č.24: SÚS požaduje po stavbě realizaci vrstev komunikace v celé šíři komunikace. Z tohoto důvodu svolá SÚS jednání týkající se komunikace ulice Ořechovská s odborem investic za účasti správce stavby a PIU.
 14.12. proběhne předání komunikace Moravanské Lány k zimní údržbě městské části.
 Zimní údržbu bude zajišťovat firma Falky. Ostatní předané ulice bude zimní údržbu zajišťovat zhotovitel (f. Falky).
 TD č.25: Jednání na SÚS proběhlo se závěrem, že v místě 1 rýhy bude oprava 1 pruh, v místě 2 rýh bude oprava celoplošná. Zhotovitel provede nacenění opravy podle jednání do konce týdne.
 TD č. 26: Zhotovitel zaslal nacenění variant 1 až 3 (mail [redacted]) úpravy vozovek na ulici Ořechovská.
 Žádáme objednatele do příštího TD o zvolení varianty k realizaci úpravy vozovek na ulici Ořechovská
TD č. 27: SMB na doporučení SpSt preferuje variantu 3 a žádá zhotovitele o zpracování ZL – viz mail [redacted] 19.2 2021

7.	Dokumentace	SpSt BKOM PIU	
----	-------------	---------------	--

TD č.16 – Zhotovitel na základě vzorového řezu a situace ul. Moravanské Lány doplní nacenění prací komunikace. Územní rozhodnutí na změnu trasy nabyde právní moci dne 7.8.2020.
 Projektant zašle souřadnice 2 lomových bodů změny trasy a soupis prací zhotoviteli. Zhotovitel provede vytyčení a následně pochůzku po trase. Zhotovitel provede nacenění soupisu prací.
 TD č. 17: podle průzkumu na místě nebude branka výkopem pravděpodobně zasažena. Stále chybí nacenění prací komunikace. Zhotovitel svolá technickou skupinu, předpokládá se po 18. TeD 24.8. za účasti projektanta.
 [redacted] poslal rozpis míst, kde realita vjezdu k nemovitosti je odlišná od projektu (ul. Osamělá). SpSt žádá PIU o rozlišení těchto míst, případy změněné vývojem, zapomenuté vyřešení, chyba projektu a o určení, jak případy řešit, zda v rámci projektu, nebo sami investoři. První jednání se uskuteční po TeD v Obřanech 17.8.
 TD č.18 – jednání se posouvá z důvodu dovolených po TD 7.9.2020.
 TD č.19- Sporné případy vjezdů na pozemky byly projednány za účasti MČ a dohodnut způsob realizace. Projektant na příští TD nachystá opravenou dokumentaci a po odsouhlasení ji projedná s dotčenými orgány.
 TD č. 20- Opravenou dokumentaci připraví projektant na příští TeD, dostal opožděně zaměření od geodeta. V předstihu opravenou dokumentaci zašle účastníkům výstavby s analýzou, které změny přinesl vývoj lokality a co bylo pochybení projektanta.
 TD č.21 – Projektant nedostal zpětnou vazbu a svoji analýzu pochybení x vývoj lokality. Zhotovitel vytypoval několik míst vjezdů, kdy vyžaduje rozhodnutí o dalším postupu. Místa označí v projektových výřezech a zašle SpSt. Rozhodnutí bude konzultováno s BKOM
 TD č.22 – Jednání k dořešení vjezdů svolá [redacted]
 Přípojky přes pozemek města 1899/2 budou součástí projektu. PIU prověří zdaje pozemek v ÚR a SP. Projektant přeprojektuje spád přípojek dle předchozího do příštího TD.
 Místní komunikace -předaný rozpočet prověří stavba a SpSt do konce týdne.
 Informace k opravě ul. Ořechovská budou prověřeny do příštího TD – všichni , (stanovisko SÚS).
 PIU souhlasí s prodloužením vodovodu řad 5 tak, aby mohl být napojen pozemek č.1904/1.
 TD č.23 - Jednání k dořešení vjezdů proběhlo, následný postup řešení problému - projektant opraví dokumentaci a projedná nové řešení s PČR. K zápisu projektanta zašle připomínky [redacted] do 4.12. 2020.
 Zhotovitel zašle zaměření SŠ Dešťové stoky na ulici Ořechovské projektantovi do 1.12. Způsob opravy šachty bude zaslán provozovateli ke schválení do 4.12.
 Projekt přípojek přes pozemek 1899/2 byl předán.
 TD č.24: Dokumentace nepředána, zaměření dna šachty SŠ zasláno, za vhodných klimatických podmínek bude otevřena šachta SŠ a dokončeno zaměření. Následně projektant zpracuje projekt opravy SŠ.
 TD č.25: V týdnu od 1.2. proběhne zaměření dna šachty SŠ. Bude předáno projektantovi. Projektant dořeší technické dotazy stavby – viz samostatný mail ze dne 26.1.2021.
 TD č.26: Zaměření předá zhotovitel, stávající dno je monolitické – bude nutná nová monolitická šachta. Projektant předá návrh nové šachty.
TD č.27: Stávající šachta bude vybourána, bude vybudováno nové monolitické dno a osazena šachta nová. Do ní bude zaústěna dešťová vpust.

8.	Stavební deník (čl. 1.13 PO)	Zhot.	16.1.2020
----	------------------------------	-------	-----------

Správu a archivaci SD zajišťuje ing. [redacted] Vedení deníku zajišťuje stavba. SD je uložen na staveništi.

9.	Další		
----	-------	--	--

TD č. 16 – Do příštího TD se všichni podívají na možnost změny prolévaných štěrků na SC v rámci komunikací – sjednocení standardů. Nahradit prolévané štěrky vrstvou SC.
TD č. 17: Do příštího 18. TeD bude na stavbě založen deník změn. Kamerové prohlídky probíhají, zatím nezjištěny žádné nedostatky. Zhotovitel zajistí předání protokolů a videí na DVD pro ucelené úseky SpSt a PIU.
Zkoušky vodotěsnosti šachet – Zhotovitel prověří možnost realizovat zkoušky šachet před ukončením ZUK a bude informovat 24.8.
TD č.18- Deník změn založen. Zhotovitel předal protokoly a videa kamerových prohlídek do 31.7.2020. Pro zkoušky vodotěsnosti šachet zkoumá zhotovitel možnosti.
TD č.19 – beze změny
TD č.20 – [redacted] podal informaci, že soukromník chce na Moravských lánech budovat vodovod. [redacted] provede koordinaci, když od stavby dostane podklad. Stavba si vyžádá stavební povolení včetně dokladové části. ZUK platí do konce roku 2020. K realizaci vodovodu vymezen úsek během října.
Projektant připraví kvalifikovaný rozpočet pro komunikaci Moravské lány do příštího TeD. V projektu provede sjednocení konstrukčních vrstev místo štěrkodrti X KSC
TSB [redacted] projekt VO připraven jen v ul. Rozhraní od Ořech. po Vzdálenou (nové sloupy). E-on má nové betonové sloupy, nebude nic nově realizovat. [redacted] prověří údajnou pokládku optických kabelů do země.
BVK provoz ([redacted]: SÚS má arealovou COV, její vypust' bude dle projektu zaústěna do nové dešťové kanalizace do doby realizace kanalizační přípojky a ČS. SÚS požadují údajně právo stavby, Gorbunov prověří, kdo v době přípravy projektu za SÚS jednal, do kdy může SÚS vypouštět do dešťové kanalizace.
TD č.21: Vodovod na Moravských lánech položen bez problémů. Předaný rozpočet pro komunikaci Moravské lány není použitelný (jiné položky než v příčných řezech dokumentace). Dohodnuto, že se bude postupovat dle projektové části, zahájení od 26.10. Po zaměření skutečného provedení se dopracuje ZL. Stavba zajistí zátěžové zkoušky podloží v tomto týdnu. Vodítkem prostorového umístění komunikace bude poloha telefonního kabelu.
TD č.22: Zátěžová zkouška podloží bez podkladních vrstev nevyhověla. Zkouška s podkl. vrstvami se uskuteční 3.11. v 10 00 hod.
TD č.23: Zátěžová zkouška na pokladních vrstvách vyhověla, byla ověřena nutnost provedení podkladních vrstev. Zhotovitel aktualizuje bilanci plnění milníku na ulici Ořechovská do 4.12.2020.
TD č.24: Aktualizace zaslána, vyjasnění termínů týkající se bilance plnění milníků bylo dne. 15.12. 2020, VRV Podsedky 3.
TD č.26: Formulář na dešťové vpusti bude přeposlán mailem dle požadavků [redacted]
TD č.27: Splněno – viz mail [redacted].
[redacted] se omlouvá z příštího TeD, nově představen [redacted] (Strabag), diskutována kolize TZ 01, větev B v úseku Š 11 – Š 12 s vodovodními přípojkami. [redacted] bude kontaktovat BVK p [redacted]

10.	Termín dalšího jednání		
-----	------------------------	--	--

TD č. 28, Sekce MČ Brno - Jih bude: **8.3. 2021 v 10 00 hod** na zařízení staveniště ul. Osamělá.

11.	Přílohy zápisu: prezenční listina		
-----	-----------------------------------	--	--

1. Prezenční listina

Dle průběhu jednání zapsal: [redacted]

Podpisy:

Objednatel :

Zhotovitel :

Správce stavby :

PREZENČNÍ LISTINA
Správce stavby



Dostavba kanalizace v Brně II
- MČ Jih

Účel jednání	Technický den č.27 - MČ Jih
Název zakázky	Dostavba kanalizace v Brně II - výběr zhotovitele dostavby kanalizace
Objednatel	Statutární město Brno
Správce stavby	Sdružení „Garnets – VRV“
Zhotovitel	Společnost „Kanalizace Brno II.“ - vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.
Místo konání	Zařízení staveniště ul. Osamělá
Datum a čas	22.2.2021, 10:00 hod

Účastník	Jméno	Telefon	Mail	Podpis
Objednatel				
Správce stavby				
Zhotovitel				
Další účastníci				
