




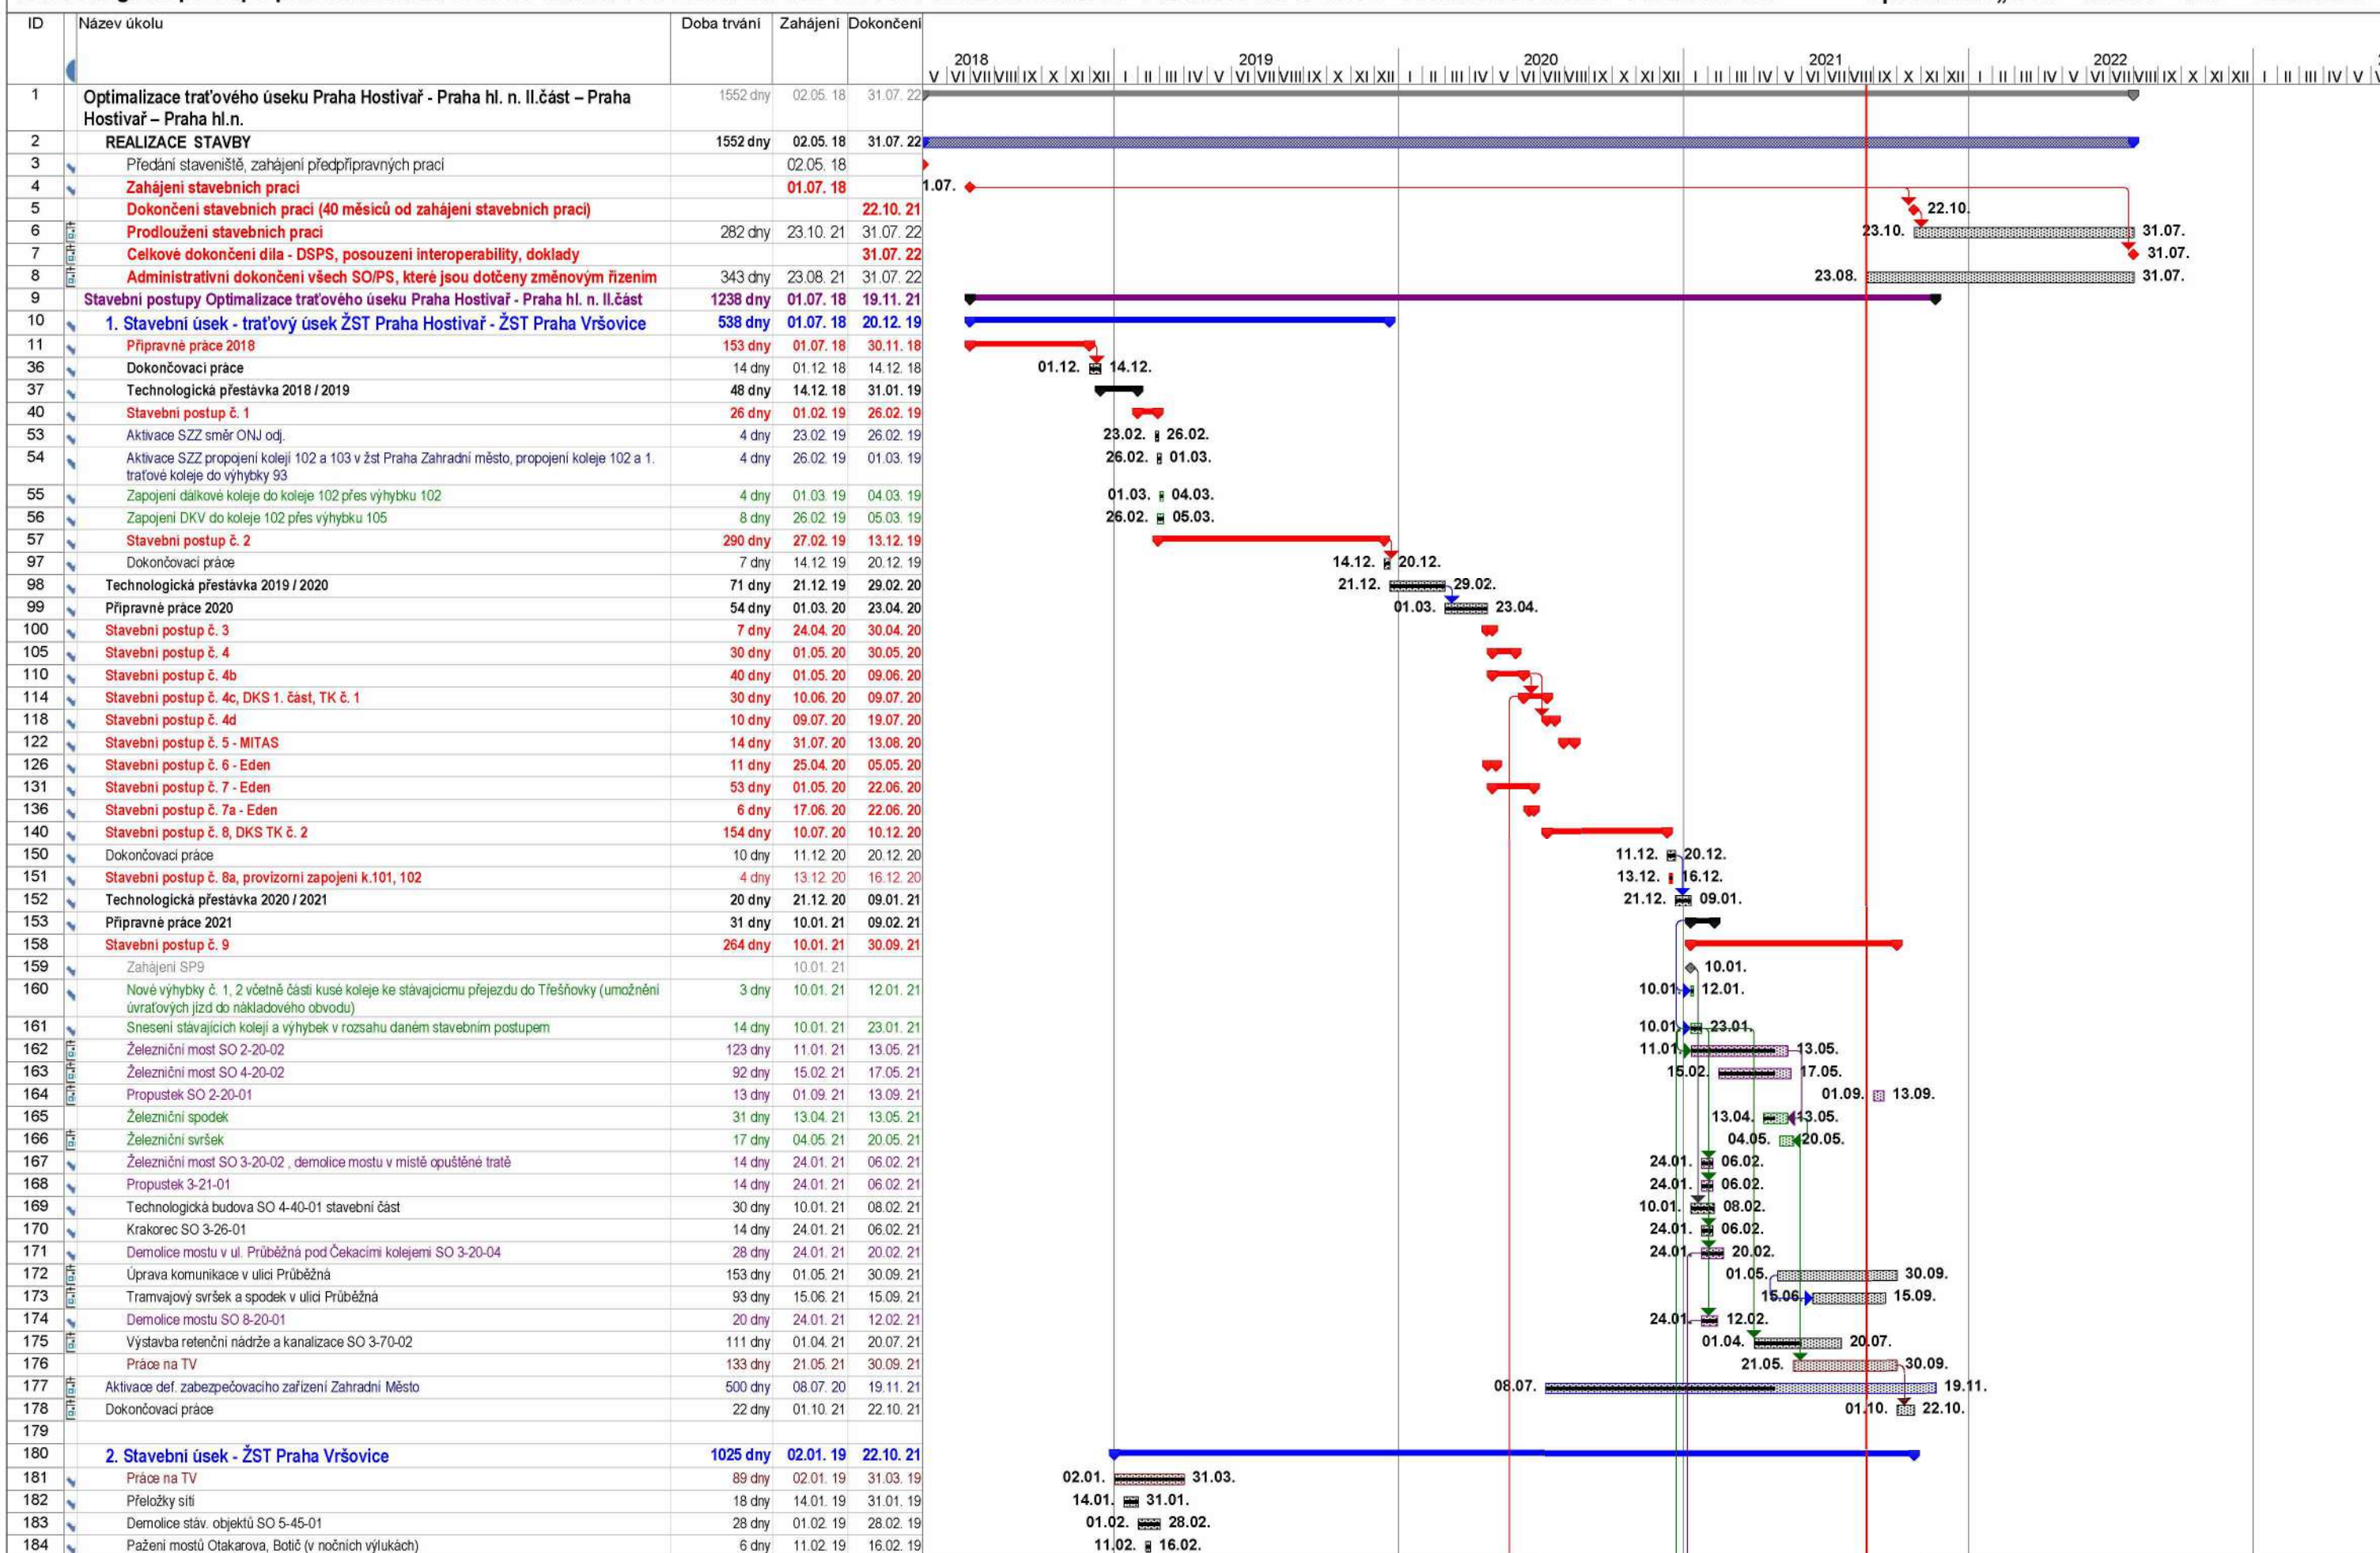

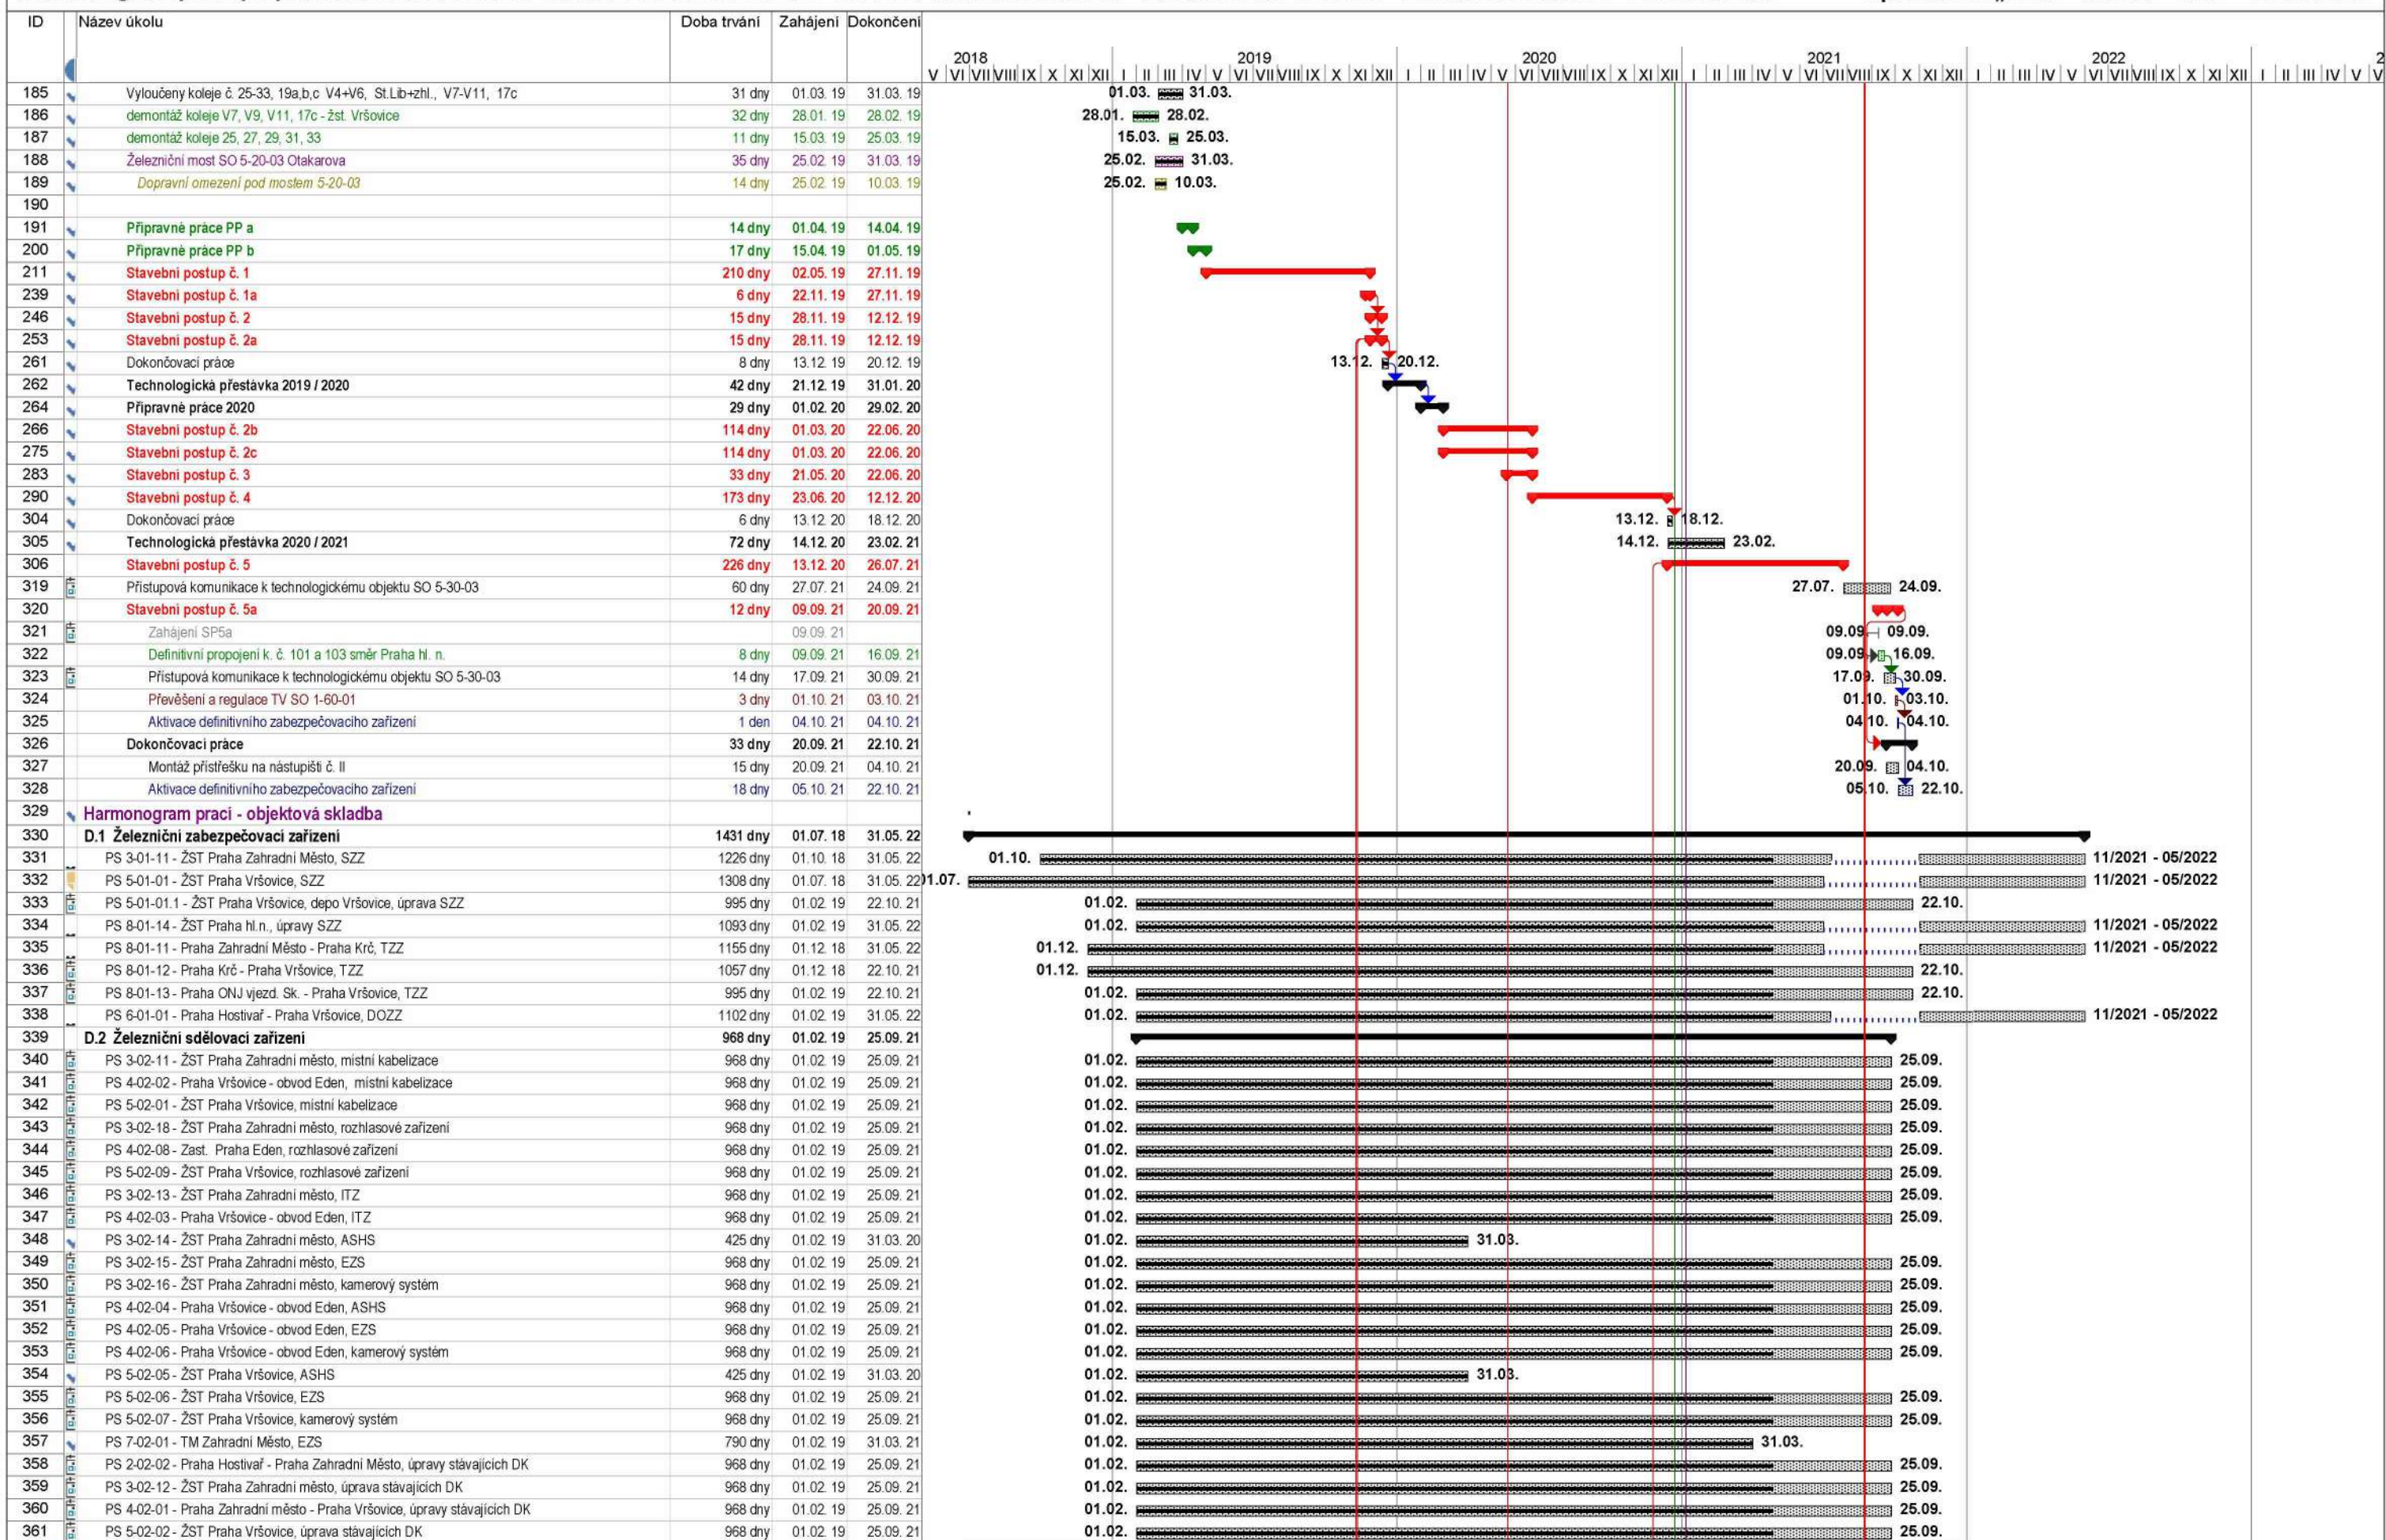

Společnost „MTS + SwieR + SMP – Hostivař II“

Strana 3 / 6

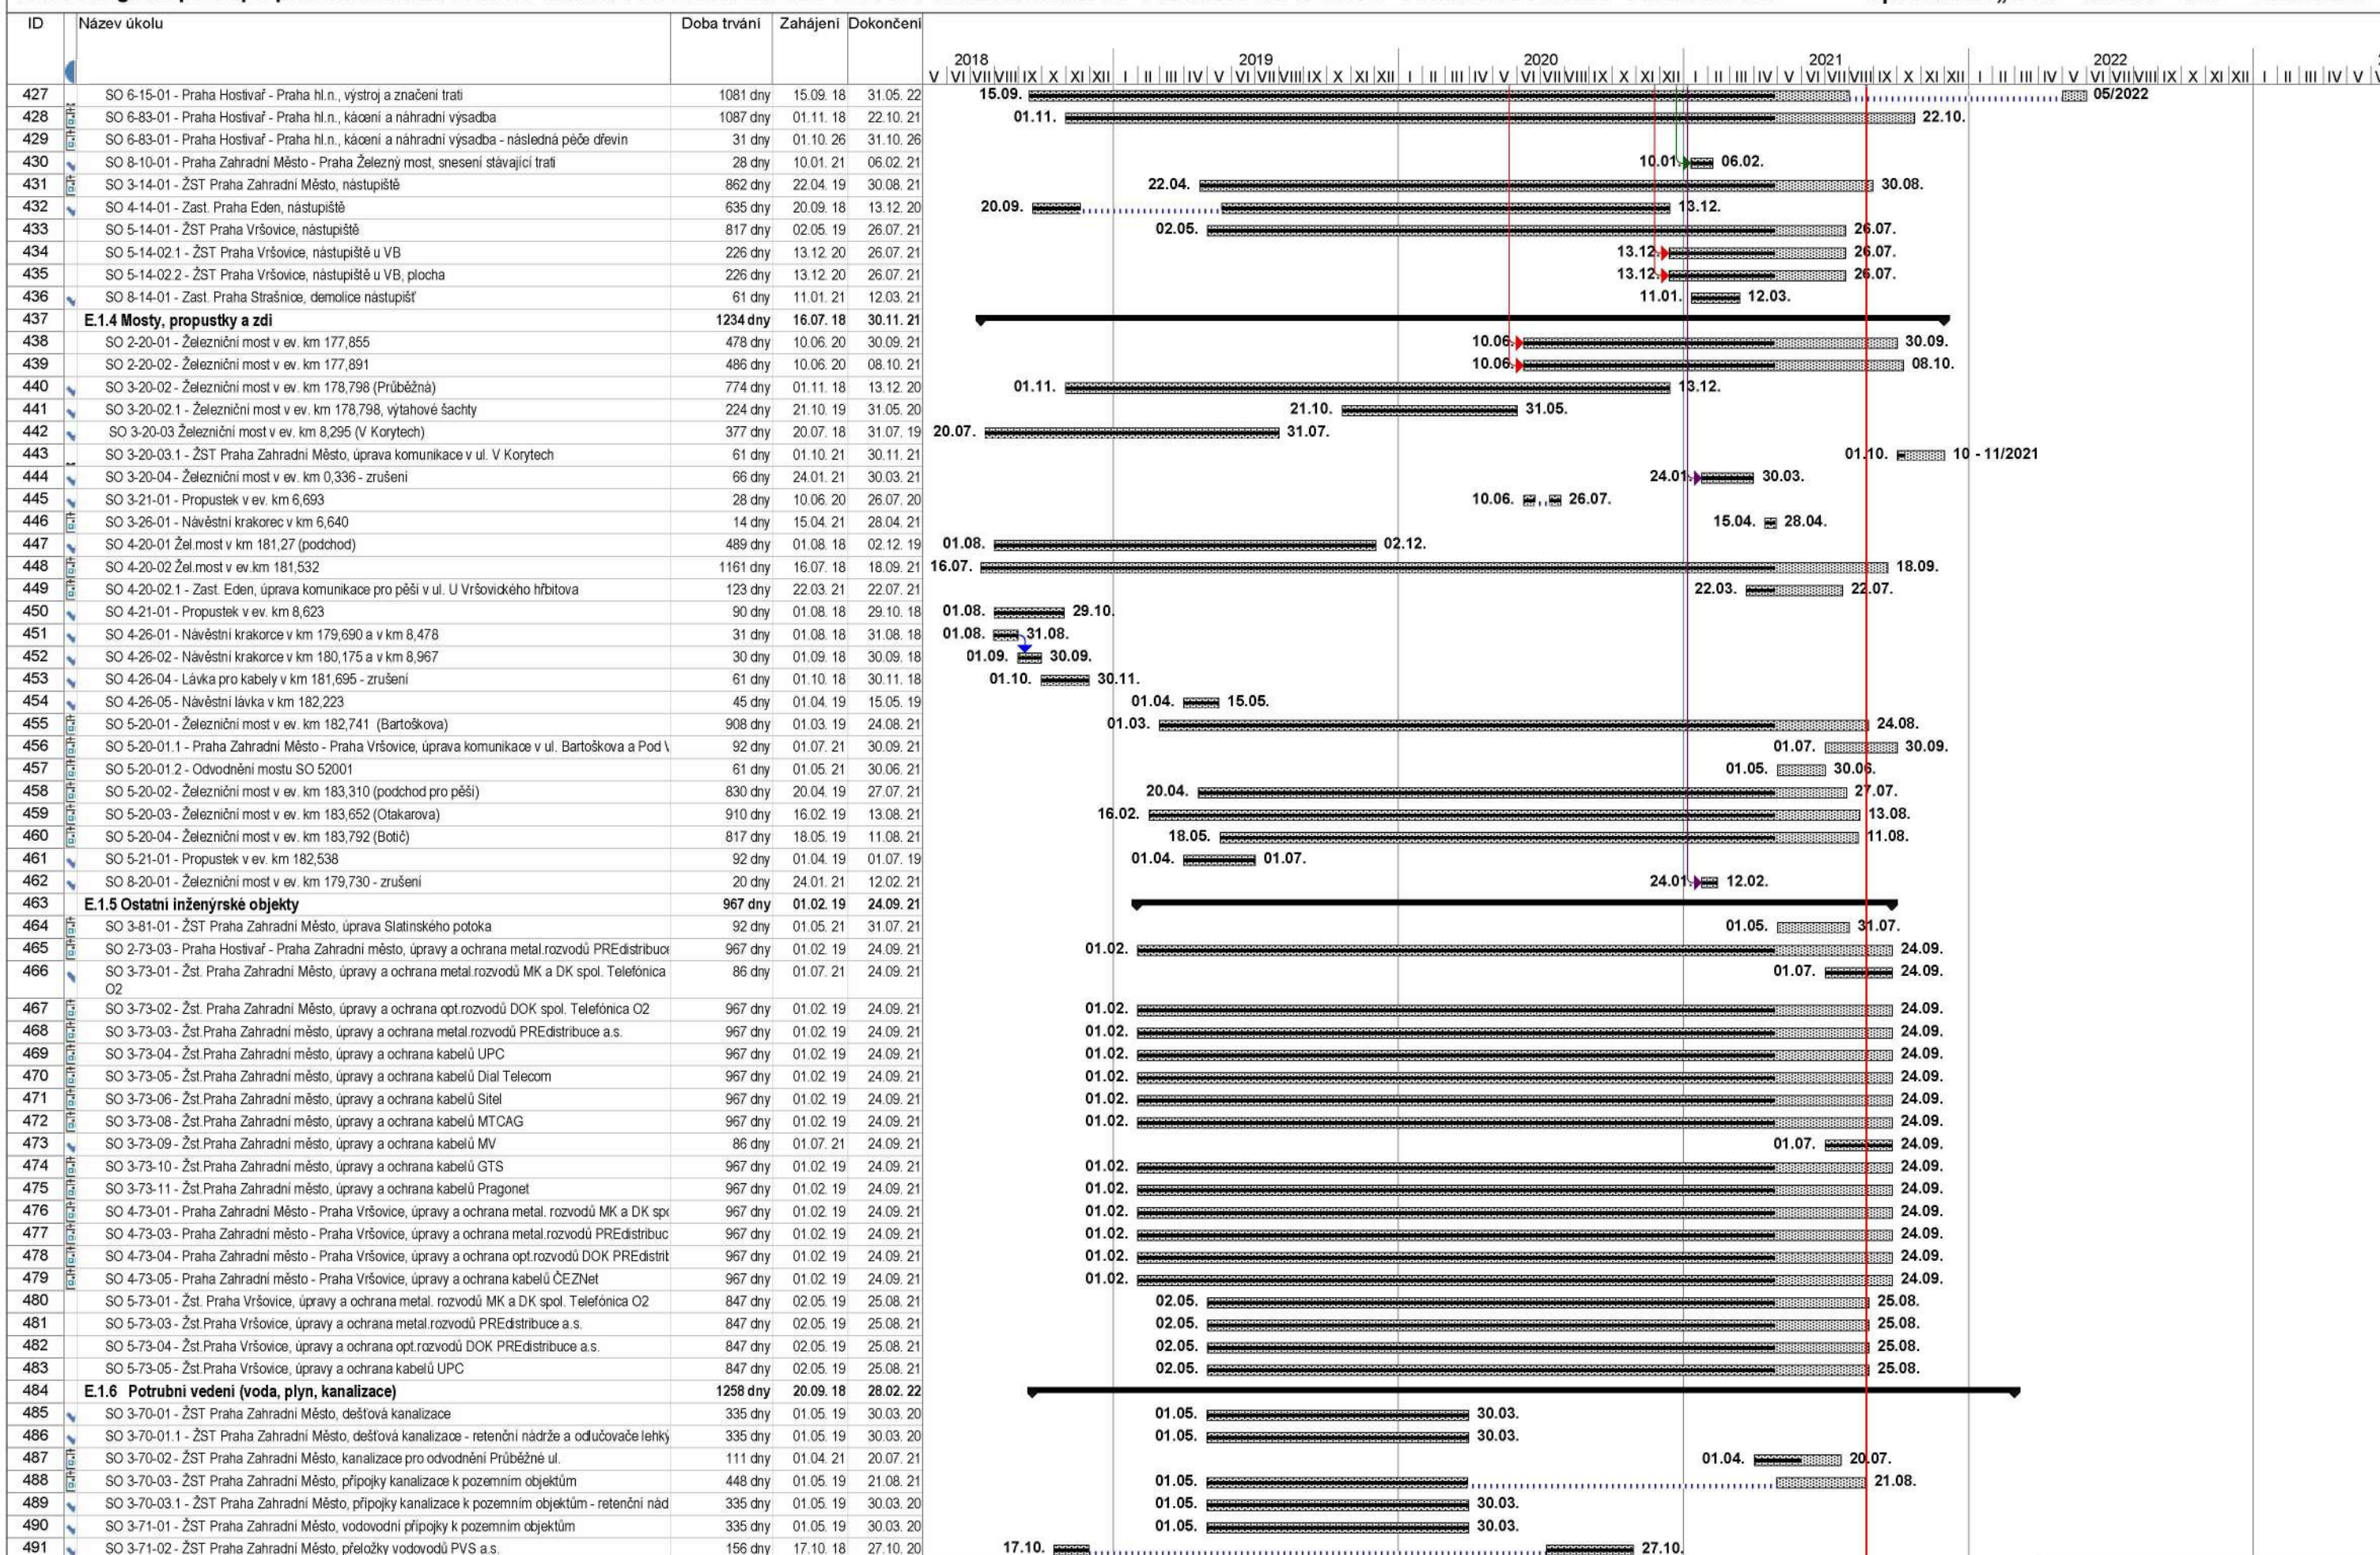

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					V VI VII VIII IX X XI XII	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
492	SO 3-72-01 - ŽST Praha Zahradní Město, přeložka plynovodu STL	70 dny	01.04. 19	09.06. 19		01.04. 09.06.				
493	SO 3-72-02 - ŽST Praha Zahradní Město, přeložka plynovodu NTL	70 dny	01.04. 19	09.06. 19		01.04. 09.06.				
494	SO 4-70-01 - ŽST Vršovice - obvod Eden, dešťová kanalizace	541 dny	20.09. 18	28.02. 22	20.09.				02/2022 napojení do ulice U Vršovického hřbitova	
495	SO 4-70-01.1 - ŽST Vršovice - obvod Eden, dešťová kanalizace - retenční nádrž	541 dny	20.09. 18	28.02. 22	20.09.				02/2022	
496	SO 4-70-02 - ŽST Vršovice - obvod Eden, přípojky kanalizace k pozemním objektům	823 dny	20.09. 18	20.12. 20	20.09.			20.12.		
497	SO 4-71-01 - ŽST Vršovice - obvod Eden, vodovodní přípojky k pozemním objektům	788 dny	20.09. 18	15.11. 20	20.09.			15.11.		
498	SO 5-70-01 - ŽST Vršovice, dešťová kanalizace	773 dny	02.05. 19	12.06. 21		02.05. 12.06.		12.06.		
499	SO 5-70-01.1 - ŽST Vršovice, dešťová kanalizace - retenční nádrže a odtučňovače lehkých kapalin	773 dny	02.05. 19	12.06. 21		02.05. 12.06.		12.06.		
500	SO 5-70-02 - ŽST Vršovice, přípojky kanalizace k pozemním objektům	599 dny	02.05. 19	20.12. 20		02.05. 20.12.		20.12.		
501	SO 5-71-01 - ŽST Vršovice, vodovodní přípojky k pozemním objektům	599 dny	02.05. 19	20.12. 20		02.05. 20.12.		20.12.		
502	SO 7-70-01 - TM Zahradní Město, přípojka kanalizace k provoznímu objektu	335 dny	01.05. 19	30.03. 20		01.05. 30.03.				
503	SO 7-71-01 - TM Zahradní Město, vodovodní přípojka k provoznímu objektu	335 dny	01.05. 19	30.03. 20		01.05. 30.03.				
504	E.1.8 Pozemní komunikace	1492 dny	01.07. 18	31.07. 22						
505	SO 3-30-01.1.1 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava komunikace v ul. Průběžná (hl.m. Praha)	175 dny	01.05. 21	22.10. 21				01.05. 22.10.		
506	SO 3-30-01.1.2 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava komunikace v ul. Průběžná (SŽDC s.o.)	175 dny	01.05. 21	22.10. 21				01.05. 22.10.		
507	SO 3-30-01.2 - Náhradní oplocení areálu AQUA	509 dny	01.06. 20	22.10. 21			01.06. 22.10.			
508	SO 3-30-03 - ŽST Praha Zahradní Město, přístupová komunikace k technologickému objektu	151 dny	01.03. 21	31.05. 22				01.03. 31.05.		
509	SO 3-33-01 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava tramvajové trati v ul. Průběžná	93 dny	15.06. 21	15.09. 21				15.06. 15.09.		
510	SO 3-34-01 - ŽST Praha Zahradní Město, úprava TV TT v ul. Průběžná	275 dny	18.02. 19	31.08. 21	18.02.				31.08.	
511	SO 3-35-01 - ŽST Praha Zahradní Město, SZZ přechod v ul. Průběžná	111 dny	28.05. 21	15.09. 21				28.05. 15.09.		
512	SO 3-35-02 - ŽST Praha Zahradní Město, SZZ Průběžná x Na Padesátém	111 dny	28.05. 21	15.09. 21				28.05. 15.09.		
513	SO 3-35-03 - ŽST Praha Zahradní Město, SZZ Průběžná x Švehlova	111 dny	28.05. 21	15.09. 21				28.05. 15.09.		
514	SO 4-30-01 - Zast. Eden, přístupová komunikace k tech. objektu	152 dny	01.05. 21	30.04. 22				01.05. 30.04.		
515	SO 4-30-02.1 - Zast. Eden, přístupové komunikace pro pěši (hl.m. Praha)	212 dny	01.10. 21	30.04. 22				01.10. 04/2022		
516	SO 4-30-02.2 - Zast. Eden, přístupové komunikace pro pěši (SŽDC s.o.)	153 dny	15.03. 21	14.08. 21				15.03. 14.08.		
517	SO 5-30-01 - ŽST Praha Vršovice, komunikace a zpevněné plochy	820 dny	02.05. 19	29.07. 21		02.05. 29.07.				
518	SO 5-30-02 - ŽST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškovy	678 dny	13.09. 19	21.07. 21		13.09. 21.07.				
519	SO 5-30-03 - ŽST Praha Vršovice, přístupová komunikace k technologickému objektu	390 dny	01.02. 19	22.10. 21	01.02.				22.10.	
520	SO 5-34-01 - ŽST Praha Vršovice, úprava TV TT v ul. Otakarova	973 dny	18.02. 19	17.10. 21	18.02.				17.10.	
521	SO 7-30-01 - TM Zahradní Město, přístupová komunikace a komunikace v areálu	156 dny	22.02. 21	31.05. 22			22.02.		31.05.	
522	SO 6-84-01 - Praha Hostivař - Praha hl.n., dopravní opatření	1492 dny	01.07. 18	31.07. 22	1.07.					07/2022
523	E.1.9 Kabelovody, kolektory	1000 dny	10.09. 18	05.06. 21						
524	SO 3-44-01 - ŽST Praha Zahradní Město, kabelovod	924 dny	15.10. 18	25.04. 21	15.10.				25.04.	
525	SO 4-44-01 - Zast. Praha Eden, kabelovod	805 dny	10.09. 18	22.11. 20	10.09.			22.11.		
526	SO 5-44-01 - ŽST Praha Vršovice, kabelovod	910 dny	09.12. 18	05.06. 21	09.12.			05.06.		
527	E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů	1395 dny	06.08. 18	31.05. 22						
528	SO 3-40-01 - ŽST Praha Zahradní Město, technologická budova	343 dny	01.04. 19	08.03. 20		01.04. 08.03.				
529	SO 3-40-02 - ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující	842 dny	04.07. 19	22.10. 21		04.07. 22.10.				
530	SO 3-42-01 - ŽST Praha Zahradní Město, drobná architektura, oplocení	336 dny	06.08. 18	30.11. 21	06.08.				30.11.	
531	SO 4-40-01 - Zast. Praha Eden, technologická budova	367 dny	01.10. 20	22.10. 21			01.10. 22.10.			
532	SO 4-42-01 - Zast. Praha Eden, drobná architektura, oplocení	493 dny	02.11. 20	30.04. 22			02.11. 04/2022			
533	SO 5-40-01 - ŽST Praha Vršovice, technologická budova	469 dny	01.04. 19	31.05. 22		01.04.			01 - 05/2022 úpravy stávající TB	
534	SO 5-42-01 - ŽST Praha Vršovice, drobná architektura, oplocení	643 dny	18.11. 19	30.11. 21		18.11.		11/2021		
535	SO 5-42-01.1 - ŽST Praha Vršovice, drobná architektura, oplocení - Oplocení pozemků p.č. 2035, 2039/1 a 2309/2	336 dny	11.01. 21	12.12. 21			11.01. 12.12.			
536	SO 5-42-01.2 - ŽST Praha Vršovice, drobná architektura, oplocení - Náhradní oplocení areálu PROIMO	167 dny	01.05. 21	28.02. 22				01.05. 02/2022...		
537	SO 3-41-01 - ŽST Praha Zahradní Město, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu	623 dny	16.12. 19	29.08. 21		16.12. 29.08.				
538	SO 4-41-01 - Zast. Praha Eden, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu	801 dny	01.10. 18	09.12. 20	01.10.		09.12.			
539	SO 5-41-01 - ŽST Praha Vršovice, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu	724 dny	01.09. 19	24.08. 21		01.09. 24.08.				
540	SO 3-43-01 - ŽST Praha Zahradní Město, orientační systém	64 dny	01.07. 21	30.11. 21			01.07. 30.11.			
541	SO 4-43-01 - Zast. Praha Eden, orientační systém	175 dny	03.08. 20	24.01. 21			03.08. 24.01.			
542	SO 5-43-01 - ŽST Praha Vršovice, orientační systém	637 dny	25.11. 19	22.08. 21		25.11. 22.08.				
543	SO 3-45-01 - ŽST Praha Zahradní Město, demolice	230 dny	15.10. 18	28.02. 22	15.10.				12/2021 - 02/2022 stavědlo, TS	
544	SO 4-45-01 - Zast. Praha Eden, demolice	414 dny	01.02. 19	28.02. 22	01.02.				12/2021 - 02/2022 TS	
545	SO 5-45-01 - ŽST Praha Vršovice, demolice	58 dny	02.01. 19	28.02. 19	02.01.	28.02.				
546	E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí	1493 dny	01.07. 18	01.08. 22						
547	SO 2-60-01 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV	1157 dny	01.07. 18	31.07. 22	1.07.				04 - 07/2022 regulace TV, laničkov	
548	SO 2-60-01.1 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV (ČD a.s.)	1157 dny	01.07. 18	01.08. 22	1.07.				04 - 07/2022 regulace TV, laničkov	
549	SO 2-60-01.2 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV - "Eden"	1157 dny	01.07. 18	31.07. 22	1.07.				04 - 07/2022 regulace TV, laničkov	
550	SO 2-60-02 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, úpravy stávajícího TV	1158 dny	01.07. 18	31.08. 21	1.07.			31.08.		
551	SO 5-60-01 - ŽST Praha Vršovice, úprava TV	1157 dny	01.07. 18	31.07. 22	1.07.				04 - 07/2022 regulace TV, laničkov	
552	SO 5-60-01.1 - ŽST Praha Vršovice, úprava TV (ČD a.s.)	1157 dny	01.07. 18	31.07. 22	1.07.				04 - 07/2022 regulace TV, laničkov	
553	SO 6-60-01 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, převěšení optického kabelu - SŽDC	1157 dny	01.07. 18	31.07. 22	1.07.				07/2022	
554	SO 6-60-02 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, převěšení optického kabelu - ČD Telematika	1156 dny	01.07. 18	31.07. 22	1.07.				07/2022	
555	SO 7-60-01 - Připojení napájecího vedení TM Zahradní Město na TV	1157 dny	01.07. 18	31.07. 22	1.07.				04 - 07/2022	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018	2019	2020	2021	2022	2023
556	SO 7-60-02 - Připojení zpětného vedení TM Zahradní Město	1158 dny	01.07. 18	31.08. 21	1.07.				31.08.	
557	SO 2-61-01 - Praha Hostivař - Praha Vršovice, ukolejnění vodivých konstrukcí	1157 dny	01.07. 18	31.07. 22	1.07.					04 - 07/2022
558	SO 5-61-01 - ŽST Praha Vršovice, ukolejnění vodivých konstrukcí	1157 dny	01.07. 18	31.07. 22	1.07.					04 - 07/2022
559	E.3.2 Napájecí stanice (měnirna, trakční transformovna) – stavební část	1431 dny	01.07. 18	31.05. 22						
560	SO 7-40-01 - TM Zahradní Město, provozní budova	670 dny	01.07. 18	30.04. 20	1.07.		30.04.			
561	SO 7-42-01 - TM Zahradní Město, oplocení	100 dny	30.08. 21	31.05. 22				30.08.		31.05.
562	SO 7-45-01 - TM Třešňovka, demolice	92 dny	01.03. 22	31.05. 22					01.03.	31.05.
563	E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, E.3.8 Vnější uzemnění	1185 dny	01.02. 19	30.04. 22						
564	SO 3-64-01 - ŽST Praha Zahradní Město, elektrický ohřev výhybek	939 dny	01.03. 19	24.09. 21	01.03.				24.09.	
565	SO 4-64-01 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek	939 dny	01.03. 19	24.09. 21	01.03.				24.09.	
566	SO 5-64-01 - ŽST Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek	777 dny	02.05. 19	16.06. 21	02.05.			16.06.		
567	SO 2-62-01 - Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, km177,962 - úprava rozvodu vn 22kV PRE dis	336 dny	01.05. 20	01.04. 21			01.05.	01.04.		
568	SO 3-62-01 - ŽST Praha Zahradní Město, venkovní osvětlení	939 dny	01.03. 19	24.09. 21	01.03.				24.09.	
569	SO 3-62-02 - ŽST Praha Zahradní Město, venkovní rozvody nn	939 dny	01.03. 19	24.09. 21	01.03.				24.09.	
570	SO 3-62-03 - ŽST Praha Zahradní Město, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	939 dny	01.03. 19	24.09. 21	01.03.				24.09.	
571	SO 3-62-04 - ZST Praha Zahradní Město, úprava rozvodu vn 22kV	939 dny	01.03. 19	24.09. 21	01.03.				24.09.	
572	SO 3-62-06 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km178,798, ulice Průběžná - úprava kabelů DP Tra	61 dny	23.08. 21	22.10. 21				23.08.	22.10.	
573	SO 3-62-07 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km178,798, ulice Průběžná - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	61 dny	23.08. 21	22.10. 21				23.08.	22.10.	
574	SO 3-62-09 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km8,295, ulice V Korytech - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	61 dny	01.10. 21	30.11. 21				01.10.	30.11.	
575	SO 3-62-10 - ŽST Praha Zahradní Město, km6,820 - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	30 dny	23.08. 21	21.09. 21				23.08.	21.09.	
576	SO 3-62-11 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km178,798, ulice Průběžná - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	61 dny	23.08. 21	22.10. 21				23.08.	22.10.	
577	SO 3-62-12 - ŽST Praha Zahradní Město, most v km178,798, ulice Průběžná - úprava rozvodu nn PRE distribuce a.s.	61 dny	23.08. 21	22.10. 21				23.08.	22.10.	
578	SO 3-63-01 - ZST Praha Zahradní Město, úprava rozvodu vn 6kV	930 dny	01.02. 19	18.08. 21	01.02.				18.08.	
579	SO 4-62-01 - Praha Vršovice - obvod Eden, venkovní osvětlení	930 dny	01.02. 19	18.08. 21	01.02.				18.08.	
580	SO 4-62-02 - Praha Vršovice - obvod Eden, venkovní rozvody nn	930 dny	01.02. 19	18.08. 21	01.02.				18.08.	
581	SO 4-62-03 - Praha Vršovice - obvod Eden, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	930 dny	01.02. 19	18.08. 21	01.02.				18.08.	
582	SO 4-62-04 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 22kV	930 dny	01.02. 19	18.08. 21	01.02.				18.08.	
583	SO 4-62-05 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, demontáž rozvodu nn a osvětlení zast.Praha S	30 dny	01.05. 21	30.05. 21				01.05.	30.05.	
584	SO 4-62-06 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie - úprava kabelů DP Tramvaje	930 dny	01.02. 19	18.08. 21	01.02.				18.08.	
585	SO 4-62-07 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie, Nad Slavií, Pod Altánem - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	212 dny	01.10. 21	30.04. 22				01.10.	30.04.	
586	SO 4-62-08 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, km180,735 - úprava rozvodu vn 22kV PRE dis	930 dny	01.02. 19	18.08. 21	01.02.				18.08.	
587	SO 4-62-09 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie, Nad Slavií - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	930 dny	01.02. 19	18.08. 21	01.02.				18.08.	
588	SO 4-63-01 - Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 6kV	930 dny	01.02. 19	18.08. 21	01.02.				18.08.	
589	SO 5-62-01 - ŽST Praha Vršovice, venkovní osvětlení	816 dny	02.05. 19	25.07. 21	02.05.				25.07.	
590	SO 5-62-02 - ŽST Praha Vršovice, venkovní rozvody nn	816 dny	02.05. 19	25.07. 21	02.05.				25.07.	
591	SO 5-62-03 - ŽST Praha Vršovice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	816 dny	02.05. 19	25.07. 21	02.05.				25.07.	
592	SO 5-62-04 - ŽST Praha Vršovice, DKV - úprava venkovního rozvodu nn	816 dny	02.05. 19	25.07. 21	02.05.				25.07.	
593	SO 5-62-05 - ŽST Praha Vršovice, DKV - dálkové ovládání úsekových odpojovačů	816 dny	02.05. 19	25.07. 21	02.05.				25.07.	
594	SO 5-62-06 - ZST Praha Vršovice, most v km 182,741, ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	31 dny	01.07. 21	31.07. 21				01.07.	31.07.	
595	SO 5-62-07 - ZST Praha Vršovice, most v km 183,310, ulice Bartoškova, Ukrajinská - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	31 dny	01.07. 21	31.07. 21				01.07.	31.07.	
596	SO 5-62-08 - ZST Praha Vršovice, ulice Vršovická, Perucká - úprava veřejného osvětlení ELTODO a	31 dny	01.07. 21	31.07. 21				01.07.	31.07.	
597	SO 5-62-09 - ZST Praha Vršovice, most v km182,520, ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	31 dny	01.07. 21	31.07. 21				01.07.	31.07.	
598	SO 5-62-10 - ZST Praha Vršovice, most v km 183,310, ulice Bartoškova - úprava rozvodu nn PREdis	31 dny	01.07. 21	31.07. 21				01.07.	31.07.	
599	SO 5-63-01 - ŽST Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 6kV	773 dny	02.05. 19	12.06. 21	02.05.				12.06.	
600	SO 7-62-01 - TM Zahradní Město, úprava osvětlení areálu	31 dny	15.03. 21	14.04. 21			15.03.	14.04.		
601	SO 7-62-02 - TM Zahradní Město, dálkové ovládání úsekových odpojovačů a návěst 50	457 dny	30.09. 19	29.12. 20		30.09.		29.12.		
602	SO 7-62-03 - TM Třešňovka, provizorní úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů a návěstí	895 dny	01.02. 19	14.07. 21	01.02.				14.07.	
603	SO 7-65-01 - TM Zahradní Město, vnější uzemnění	380 dny	01.11. 19	15.11. 20		01.11.		15.11.		
604	Všeobecné objekty	1492 dny	01.07. 18	31.07. 22						
605	SO 9-89-82 - Všeobecný objekt	1492 dny	01.07. 18	31.07. 22	1.07.					31.07.
606	SO 9-89-92 - Publicita	62 dny	01.07. 18	22.10. 21	1.07.				22.10.	
