


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Převzetí staveniště - okamžik zahájení prací	0 dny	01.03.22	01.03.22
2	Zařízení staveniště.	3 dny	01.03.22	03.03.22
3				
4	SO 01 - Akumulační nádrž	148 dny	04.03.22	29.07.22
5	Dmtž a bourací práce (stávající rozvody, podlahy).	14 dny	04.03.22	17.03.22
6	Hrubé skladby podlah, základové desky - přípravné práce.	14 dny	18.03.22	31.03.22
7	Základ akumulární nádrže, základ APS, betonová podlahová deska.	14 dny	01.04.22	14.04.22
8	Akumulační nádrž - přípravné práce.	7 dny	15.04.22	21.04.22
9	Akumulační nádrž - monolitické kee.	28 dny	22.04.22	19.05.22
10	Hydroizolace mimo AN.	7 dny	20.05.22	26.05.22
11	Betonová mazanina.	5 dny	27.05.22	31.05.22
12	Potěr.	3 dny	01.06.22	03.06.22
13	Provedení hrubých rozvodů - elektro, ZTI, ÚT a VZT.	14 dny	04.06.22	17.06.22
14	Přípravné práce pro izolaci nádrže.	3 dny	04.06.22	06.06.22
15	Izolace nádrže.	14 dny	07.06.22	20.06.22
16	Zastřešení nádrže.	14 dny	18.06.22	01.07.22
17	Kompletace - elektro, ZTI, ÚT a VZT.	14 dny	02.07.22	15.07.22
18	Kompletační a dokončovací stavební práce.	7 dny	16.07.22	22.07.22
19	Bezprašný nátěr	3 dny	23.07.22	25.07.22
20	Seřízení, zaregulování	7 dny	23.07.22	29.07.22
21				
22	Předpoklad zahájení venkovních prací - přípojky	0 dny	25.04.22	25.04.22
23	SO 01 - Odvodnění dvora	42 dny	25.04.22	05.06.22
24	Vybourání stávajících zpevněných ploch a provedení prostupů v trase odvodnění.	7 dny	25.04.22	01.05.22
25	Odvodňovací žlaby a revizní šachta vč. dopojení do stávající kanalizace.	14 dny	02.05.22	15.05.22
26	Dozdívky a zacištění prostupů.	7 dny	16.05.22	22.05.22
27	Zpevněné plochy - uvedení do původního stavu.	14 dny	23.05.22	05.06.22
28				
29	SO 01 - Elektropřípojka	29 dny	25.04.22	23.05.22
30	Sejmutí svrchní vrstvy	2 dny	25.04.22	26.04.22
31	Rozebrání a vybourání stávajících zpevněných ploch.	3 dny	27.04.22	29.04.22
32	Zemní práce - výkopy, ...	7 dny	30.04.22	06.05.22
33	Elektropřípojka vč. napojení do stávajícího rozvaděče v oplacení.	7 dny	07.05.22	13.05.22
34	Zemní práce - zásypy, ...	7 dny	14.05.22	20.05.22
35	Zpevněné plochy - uvedení do původního stavu.	3 dny	21.05.22	23.05.22
36				
37	SO 01 - Vodovodní přípojka	39 dny	25.04.22	02.06.22
38	Sejmutí svrchní vrstvy	2 dny	25.04.22	26.04.22
39	Rozebrání a vybourání stávajících zpevněných ploch.	3 dny	27.04.22	29.04.22
40	Zemní práce - výkopy, ...	7 dny	30.04.22	06.05.22
41	Vodoměrná šachta.	7 dny	07.05.22	13.05.22
42	Napojení na vodovodní řad.	3 dny	14.05.22	16.05.22
43	Vodovodní přípojka vč. vodoměrné soustavy.	7 dny	17.05.22	23.05.22
44	Zemní práce - zásypy, ...	7 dny	24.05.22	30.05.22
45	Zpevněné plochy - uvedení do původního stavu.	3 dny	31.05.22	02.06.22
46				
47	SO 01 - Náhradní zdroj vč. přístřešku a větrací sloupky	84 dny	18.04.22	10.07.22
48	Odstranění venkovních vrstev v místě "křižovatky" a "zátáčky".	2 dny	18.04.22	19.04.22
49	Očištění stropních kci vč. zakrytí prostupů po výstupech PZD deskami.	7 dny	20.04.22	26.04.22
50	Stavební práce v místě "křižovatky" a "zátáčky" - spodní stavba.	21 dny	27.04.22	17.05.22
51	Větrací sloupky.	14 dny	18.05.22	31.05.22
52	Přístřešek pro náhradní zdroj elektřiny.	14 dny	01.06.22	14.06.22
53	Osazení náhradního zdroje.	21 dny	15.06.22	05.07.22
54	Zpevněné plochy - uvedení do původního stavu.	5 dny	06.07.22	10.07.22
55				
56	Předpoklad ukončení topné sezóny	0 dny	15.04.22	15.04.22
57	SO 07 - Kolektor	110 dny	12.04.22	30.07.22
58	Převzetí rozvodů médií k demontáži v koordinaci s uživatelem.	3 dny	12.04.22	14.04.22
59	Demontáž rozvodů médií, přepojení	14 dny	15.04.22	28.04.22
60	Demontáž stávajících nosných konzol.	7 dny	22.04.22	28.04.22
61	Bourání stavebních kci v kolektoru.	7 dny	26.04.22	02.05.22
62	Odstranění narušených vrstev povrchů stěna a stropu kolektoru.	14 dny	30.04.22	13.05.22
63	Stavební úpravy v kolektoru - příčky, zadržky otvorů, ...	10 dny	07.05.22	16.05.22
64	Čištění prosakujících spar a očištění a odmaštění povrchů.	7 dny	09.05.22	15.05.22
65	Odrezování obnažené výztuže a ošetření protikorozní ochranou.	14 dny	14.05.22	27.05.22
66	Těsnění spar a prasklin.	7 dny	16.05.22	22.05.22
67	Provedení adhezni mústek a oprav reprofilační maltou.	7 dny	21.05.22	27.05.22
68	Vodotěsný nátěr.	7 dny	25.05.22	31.05.22
69	Elektroinstalace - nové rozvody vč. osvětlení.	35 dny	01.06.22	05.07.22
70	Nosné konzole.	21 dny	01.06.22	21.06.22
71	ZTI a vytápění - nové rozvody.	44 dny	15.06.22	28.07.22
72	Drobné dokončovací stavební práce.	7 dny	24.07.22	30.07.22
73				
74	Příprava k převímce, zaškolení zástupců zadavatele.	3 dny	28.07.22	30.07.22
75	Termín dokončení prací	0 dny	30.07.22	30.07.22
76	Předání stavby - termín připravenosti k předání stavby	0 dny	31.07.22	31.07.22
77				
78	Termín vyklizení staveniště	0 dny	10.08.22	10.08.22

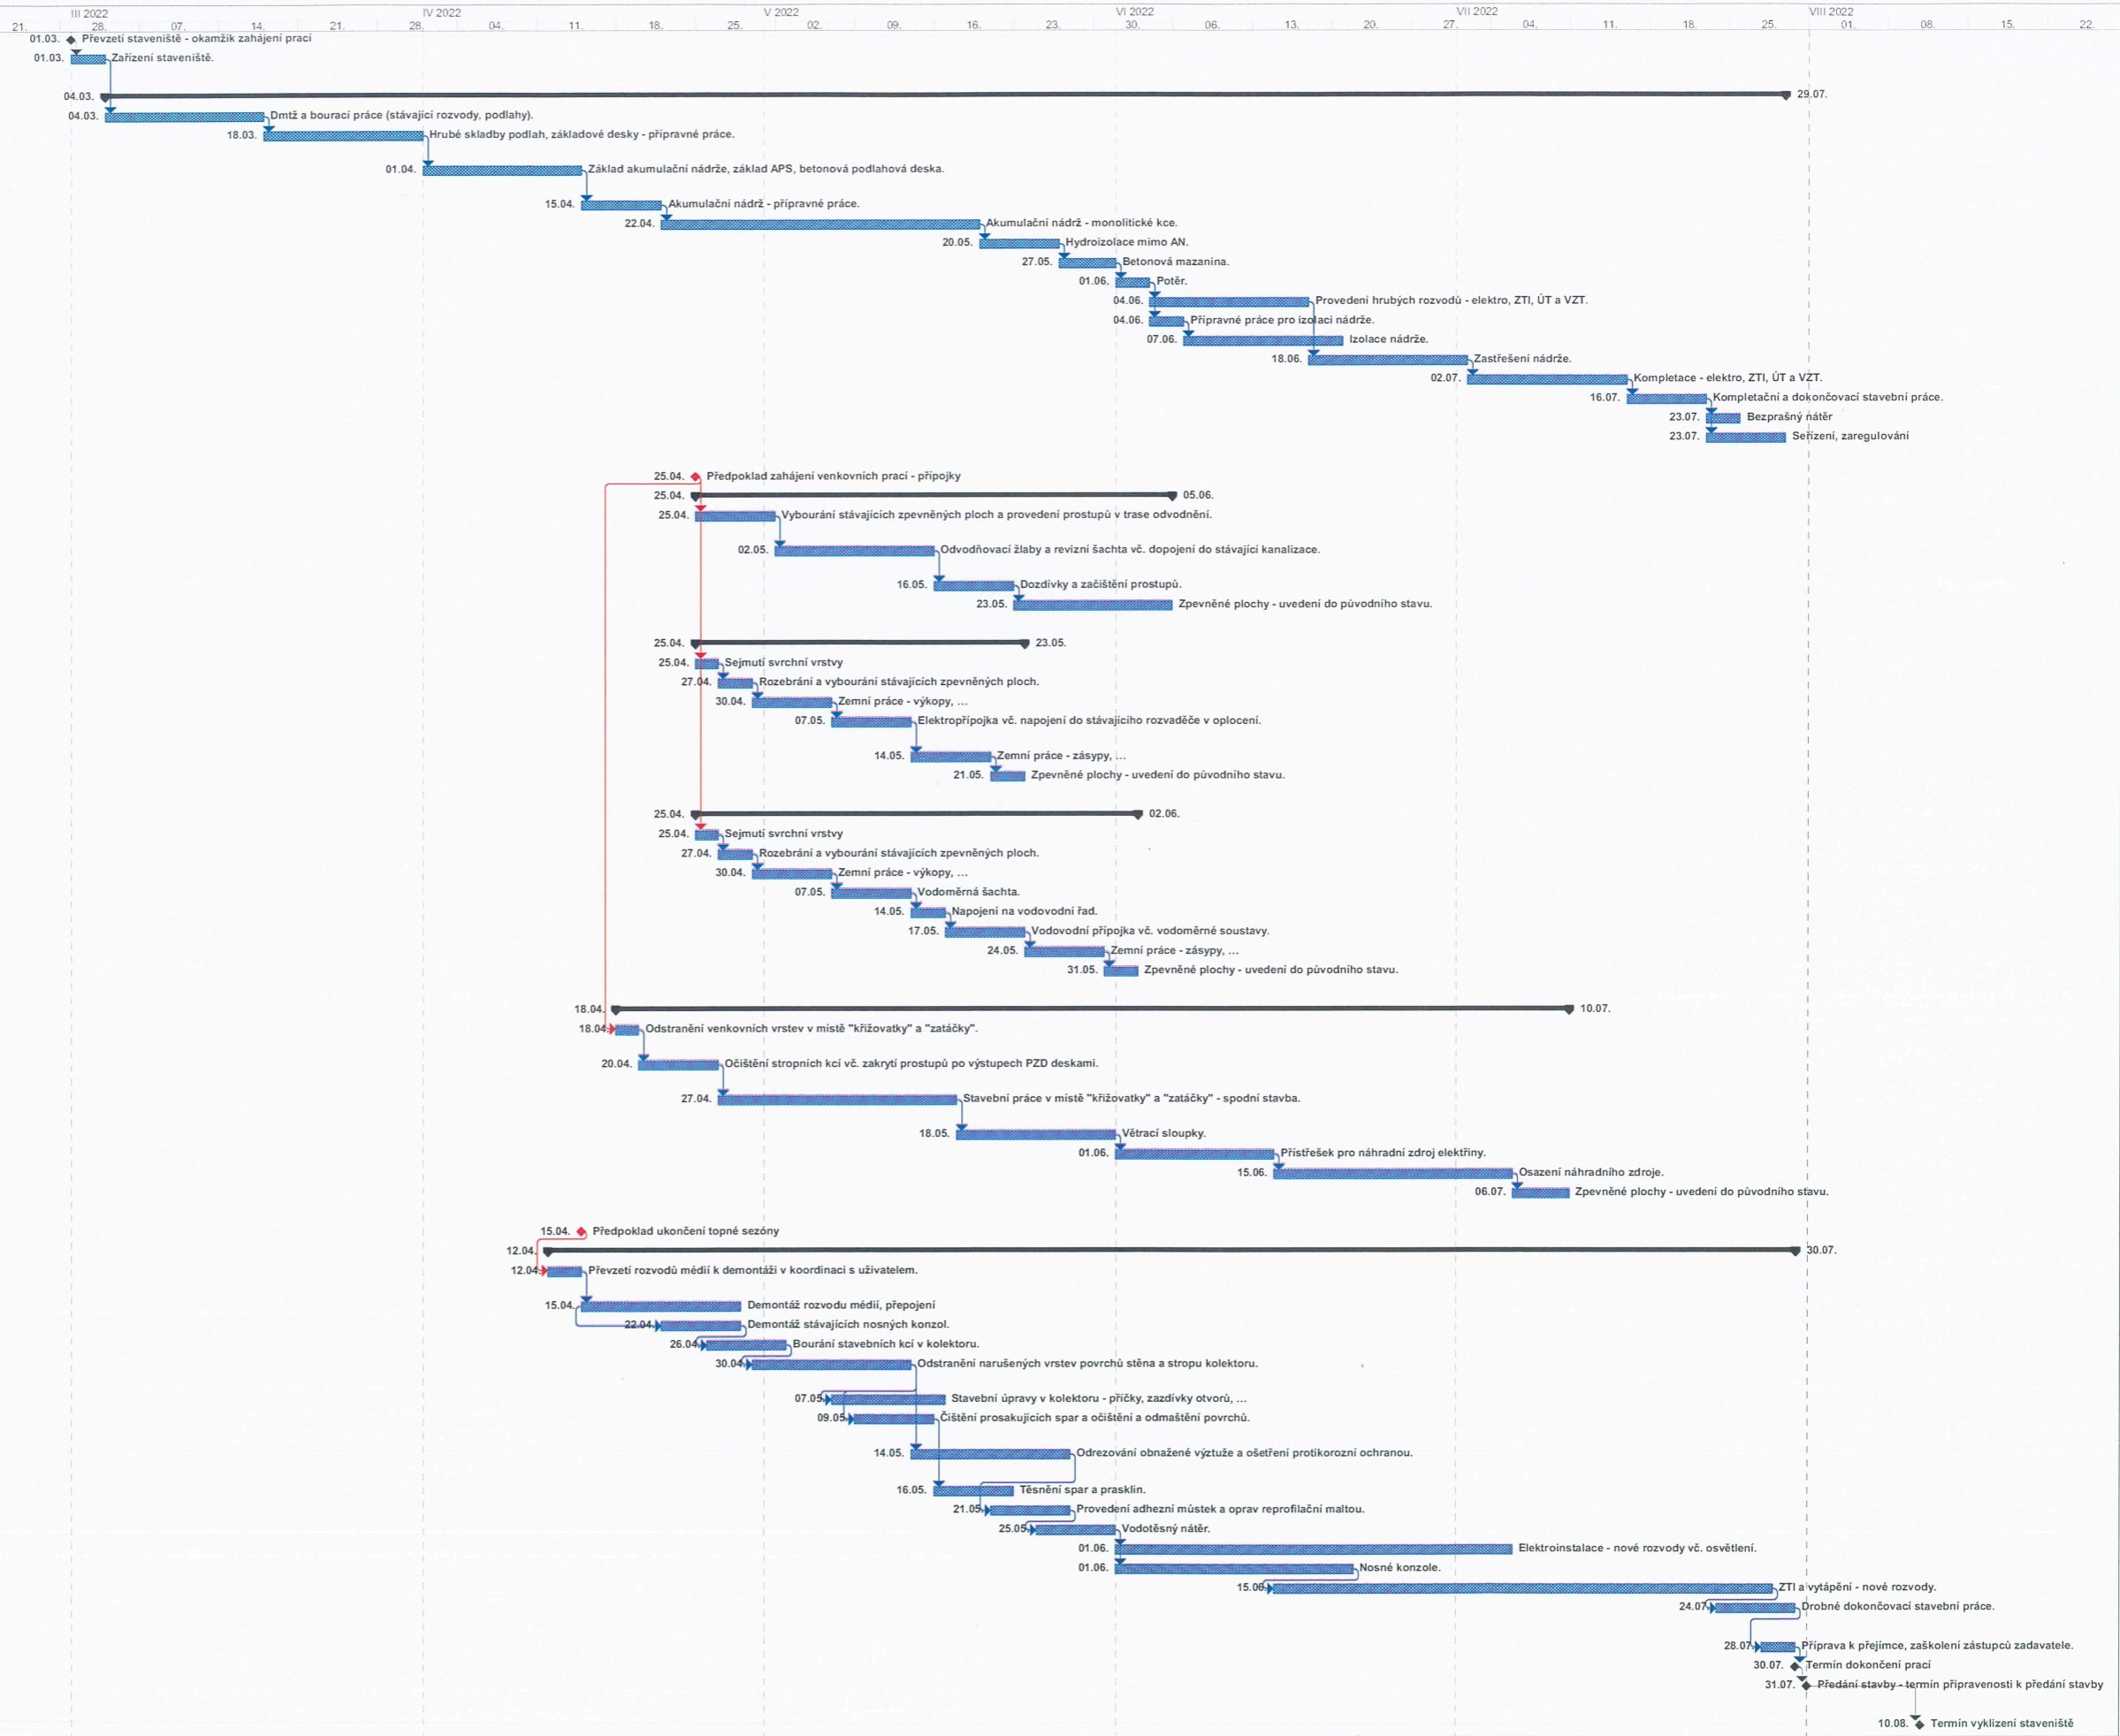

Rekonstrukce 5S CS Jiloviště II. etapa	Úkol Milník Souhrmný	Zahmutý úkol Zahmutý milník Zahmutý průběh	Rozdělení Vnější úkoly Souhrn projektu	Seskupit podle souhrnu Neaktivní úkol Neaktivní milník	Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání	Ruční úkoly zahrnuté v souhrmném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení	Pouze s datem dokončení Průběh
--	----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------
