

| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | dub | |
|----|---|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | 28.04.22 | 11.05.22 | 18.05.22 | 25.06.22 | 02.07.22 | 09.07.22 | 16.08.22 | 23.08.22 | 30.08.22 | 06.09.22 | 13.09.22 | 20.09.22 | 27.09.22 | 04.10.22 |
| 1 | Nábřežní cyklostezka Mladá Boleslav | 365 dny | 04.04. 22 | 03.04. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Výzva a předání staveniště | 0 dny | 04.04. 22 | 04.04. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Milníky stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Zahájení výroby OK - počet dnů od výzvy | 95 dny | 04.04. 22 | 07.07. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Zahájení montážních prací OK - počet dnů od výzvy | 158 dny | 04.04. 22 | 09.09. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Dokončení montáže OK - počet dnů od výzvy | 230 dny | 04.04. 22 | 19.11. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Uvedení do provozu | 365 dny | 04.04. 22 | 03.04. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Zřízení zařízení staveniště | 7 dny | 18.05. 22 | 25.05. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Přístupové komunikace | 7 dny | 25.05. 22 | 01.06. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Nábřežní cyklostezka - vlastní stavba | 362 dny | 04.04. 22 | 31.03. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | SO 101 - Cyklostezka část A1 | 30 dny | 05.02. 23 | 06.03. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | odkopávky + výměna AZ | 5 dny | 05.02. 23 | 09.02. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | násypové těleso | 5 dny | 07.02. 23 | 11.02. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | drenáže | 3 dny | 10.02. 23 | 12.02. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | podkladní vrstvy komunikace | 5 dny | 13.02. 23 | 17.02. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | obrubníky | 7 dny | 18.02. 23 | 24.02. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | konstrukční vrstvy komunikace | 5 dny | 25.02. 23 | 01.03. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | kamenné schodišťové stupně | 7 dny | 25.02. 23 | 03.03. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | vrchní vrstvy kom.-mlat | 5 dny | 02.03. 23 | 06.03. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | SO 102 - Cyklostezka část A2 | 52 dny | 01.06. 22 | 22.07. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | odkopávky + výměna AZ | 14 dny | 01.06. 22 | 14.06. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | drenáže | 7 dny | 15.06. 22 | 21.06. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | podkladní vrstvy komunikace | 7 dny | 22.06. 22 | 28.06. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | obrubníky + komun. Dlažba | 14 dny | 29.06. 22 | 12.07. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | konstrukční vrstvy komunikace | 5 dny | 13.07. 22 | 17.07. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | vrchní vrstvy kom.-mlat | 5 dny | 18.07. 22 | 22.07. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | SO 103 - Cyklostezka část A3 | 28 dny | 01.01. 23 | 28.01. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | odkopávky + výměna AZ | 10 dny | 01.01. 23 | 10.01. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | drenáže | 4 dny | 11.01. 23 | 14.01. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | podkladní vrstvy komunikace | 4 dny | 15.01. 23 | 18.01. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | obrubníky | 7 dny | 19.01. 23 | 25.01. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | konstrukční vrstvy komunikace | 3 dny | 26.01. 23 | 28.01. 23 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | SO 104 - Cyklostezka část A4 | 28 dny | 04.12. 22 | 31.12. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | odkopávky + výměna AZ | 10 dny | 04.12. 22 | 13.12. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | drenáže | 4 dny | 14.12. 22 | 17.12. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | podkladní vrstvy komunikace | 4 dny | 18.12. 22 | 21.12. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | obrubníky | 7 dny | 22.12. 22 | 28.12. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | konstrukční vrstvy komunikace | 3 dny | 29.12. 22 | 31.12. 22 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | |


Projekt: HMNG Cyklostezka MB
Datum: 11.02. 22

| | | |
|------------------------|------------|------------------------|
| Úkol | [Blue bar] | Zahrnutý milník |
| Kritický úkol | [Red bar] | Zahrnutý průběh |
| Milník | [Diamond] | Rozdělení |
| Souhrnný | [Arrow] | Vnější úkoly |
| Zahrnutý úkol | [Blue bar] | Souhrn projektu |
| Zahrnutý kritický úkol | [Red bar] | Seskupit podle souhrnu |

| | |
|---------------|--|
| [Diamond] | Neaktivní milník |
| [Line] | Neaktivní souhrn |
| [Dotted line] | Ruční úkol |
| [Grey bar] | Pouze s dobou trvání |
| [Arrow] | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu |
| [Arrow] | Ruční souhrn |

| | |
|---------------|-------------------------|
| [White bar] | Pouze zahájení |
| [Dotted line] | Pouze s datem dokončení |
| [Diamond] | Vnější úkoly |
| [Dotted line] | Vnější milník |
| [Diamond] | Průběh |
| [Diamond] | Konečný termín |

| | |
|-----------|--|
| [Arrow] | |
| [Diamond] | |
| [Bar] | |
| [Arrow] | |

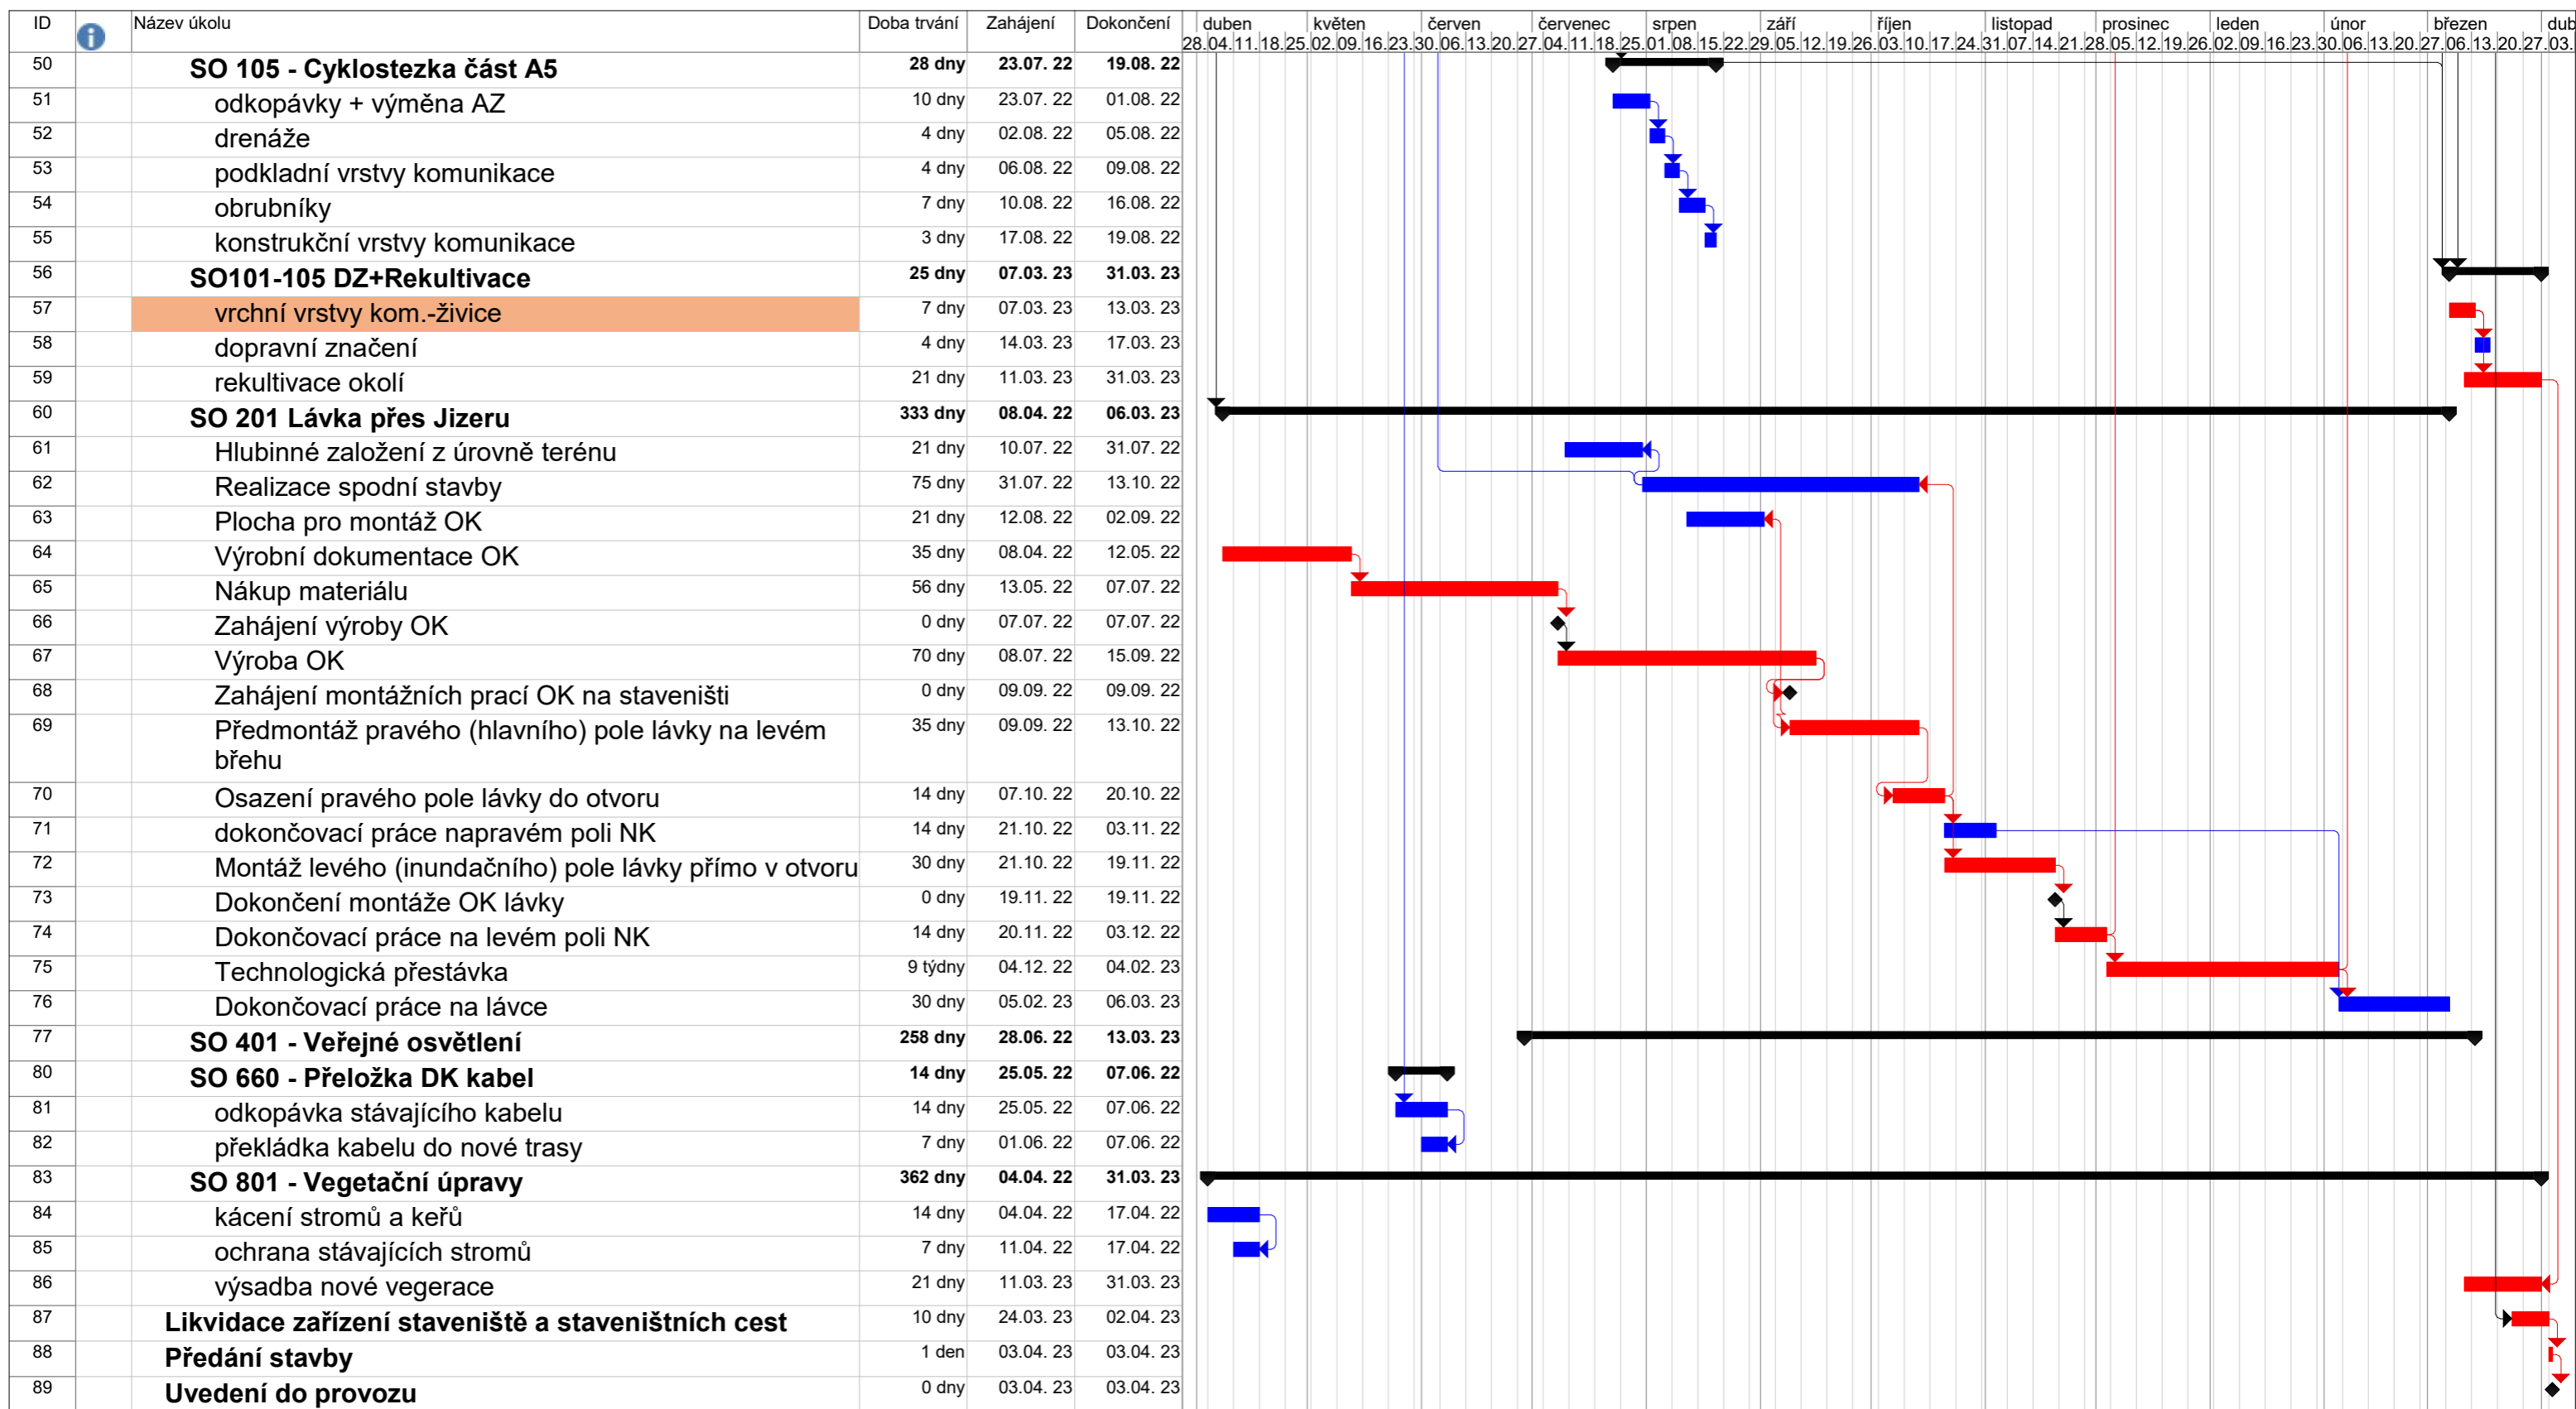

Projekt: HMNG Cyklostezka MB
Datum: 11.02. 22

| | | |
|------------------------|--|------------------------|
| Úkol | | Zahrnutý milník |
| Kritický úkol | | Zahrnutý průběh |
| Milník | | Rozdělení |
| Souhrnný | | Vnější úkoly |
| Zahrnutý úkol | | Souhrn projektu |
| Zahrnutý kritický úkol | | Seskupit podle souhrnu |

| | |
|--|--|
| | Neaktivní milník |
| | Neaktivní souhrn |
| | Ruční úkol |
| | Pouze s dobou trvání |
| | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu |
| | Ruční souhrn |

| | |
|--|-------------------------|
| | Pouze zahájení |
| | Pouze s datem dokončení |
| | Vnější úkoly |
| | Vnější milník |
| | Průběh |
| | Konečný termín |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
