


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0	Protierozní opatření k.ú. Ledčice	173 dny?	20.3.17	15.11.17
1	Zahájení stavby	1 den	20.3.17	20.3.17
2	Objekt 101 - Polní cesta HPC 4R	35 dny	20.3.17	5.5.17
3	Zemní práce	15 dny	20.3.17	7.4.17
4	Vodorovné konstrukce	10 dny	10.4.17	21.4.17
5	Komunikace	15 dny	14.4.17	4.5.17
6	Trubní vedení	10 dny	4.4.17	17.4.17
7	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	10 dny	24.4.17	5.5.17
8	Přesun hmot	35 dny	20.3.17	5.5.17
9	Zakládání	5 dny	27.3.17	31.3.17
10	Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 dny	20.3.17	28.4.17
11	Náklady na údržbu	5 dny	1.5.17	5.5.17
12	Objekt 102 - Polní cesta HPC 4R	41 dny	8.5.17	3.7.17
13	Zemní práce	15 dny	8.5.17	26.5.17
14	Základy a zvláštní zakládání	10 dny	22.5.17	2.6.17
15	Svislé a kompletní konstrukce	10 dny	22.5.17	2.6.17
16	Vodorovné konstrukce	10 dny	22.5.17	2.6.17
17	Komunikace	30 dny	23.5.17	3.7.17
18	Trubní vedení	5 dny	15.5.17	19.5.17
19	Doplňující práce na komunikaci	10 dny	12.6.17	23.6.17
20	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	10 dny	12.6.17	23.6.17
21	Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 dny	15.5.17	23.6.17
22	Přesun hmot	41 dny	8.5.17	3.7.17
23	Zemní práce při extr.mont.pracích	5 dny	15.5.17	19.5.17
24	Náklady na údržbu	5 dny	19.6.17	23.6.17
25	Objekt 102 - Polní cesta HPC 4R - zeleň IP 18N	25 dny	12.10.17	15.11.17
26	Zemní práce	20 dny	12.10.17	8.11.17
27	Přesun hmot	20 dny	12.10.17	8.11.17
28	Náklady na údržbu	5 dny	9.11.17	15.11.17
29	Objekt 103 - Polní cesta HPC 4N	54 dny	4.7.17	15.9.17
30	Zemní práce	20 dny	4.7.17	31.7.17
31	Vodorovné konstrukce	5 dny	24.7.17	28.7.17
32	Komunikace pozemní	30 dny	1.8.17	11.9.17
33	Trubní vedení	5 dny	17.7.17	21.7.17
34	Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 dny	7.8.17	15.9.17
35	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	10 dny	14.8.17	25.8.17
36	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	10 dny	28.8.17	8.9.17
37	Přesuny hmot a sutí	5 dny	14.8.17	18.8.17
38	Zemní práce při extr.mont.pracích	5 dny	21.8.17	25.8.17
39	Náklady na údržbu	5 dny	28.8.17	1.9.17
40	Objekt 103 - Příkop PŘ 1N	35 dny	14.8.17	29.9.17
41	Zemní práce	25 dny	14.8.17	15.9.17
42	Vodorovné konstrukce	5 dny	18.9.17	22.9.17

Projekt: Protierozní opatření k.ú. Ledčice
 Datum: 17.2.17

<ul style="list-style-type: none"> Úkol Rozdělení Mílník 	<ul style="list-style-type: none"> Souhrnný Souhrn projektu Vnější úkoly 	<ul style="list-style-type: none"> Vnější mílník Neaktivní úkol Neaktivní mílník 	<ul style="list-style-type: none"> Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání 	<ul style="list-style-type: none"> Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení Průběh 	<ul style="list-style-type: none"> Pouze s datem dokončení Konečný termín Průběh
---	---	---	--	--	---

Stránka 1

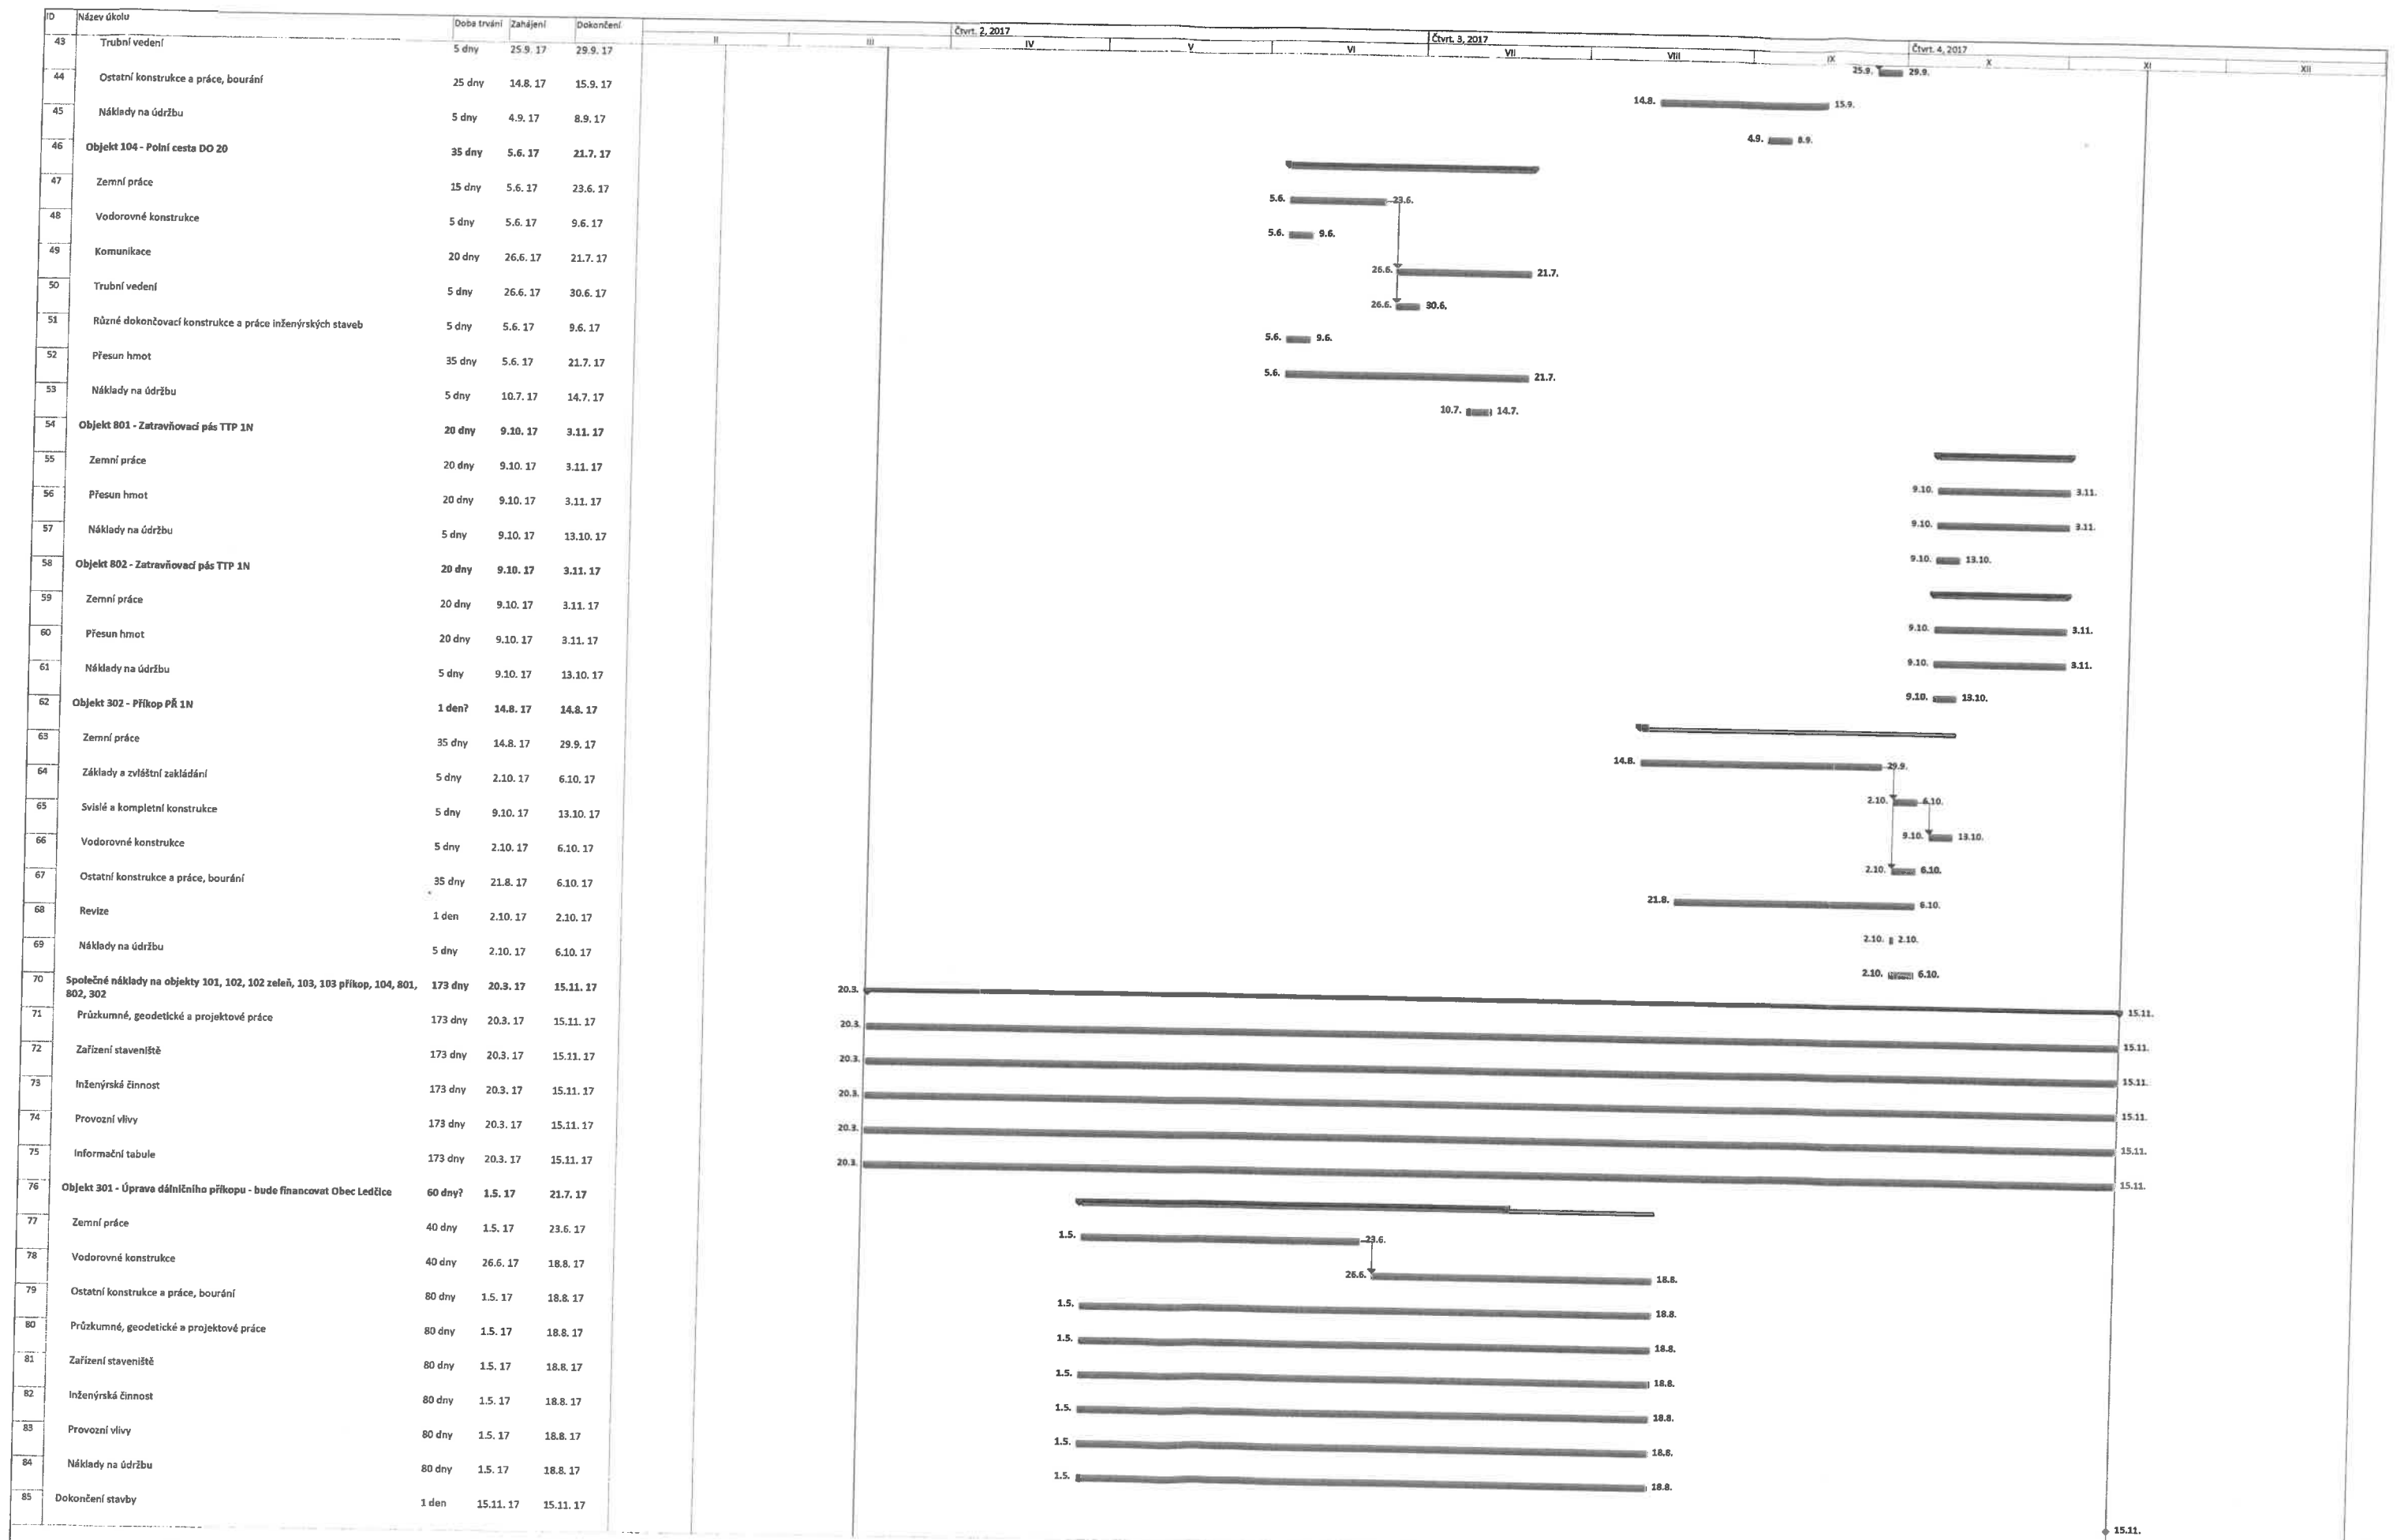

Projekt: Protierozní opatření k.ú.
 Datum: 17.2.17

Úkol
 Rozdělení
 Milník

Souhrnný
 Souhrn projektu
 Vnější úkoly

Vnější milník
 Neaktivní úkol
 Neaktivní milník

Neaktivní souhrn
 Ruční úkol
 Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
 Ruční souhrn
 Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení
 Konečný termín
 Průběh

Stránka 2
