

Harmonogram stavby: 5104 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce zdravotnických a elektroinstalace

Zhotovitel : Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
76001 Zlín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	červen 2022			červenec 2022			srpen 2022				
						2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5104	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstr	6/15/2022	8/31/2022	21,888,000	11,864											
D.1.1	Hlavní objekt	6/15/2022	8/31/2022	21,506,177	11,864											
D.0	Vedlejší rozpočtové náklady	6/15/2022	8/31/2022	381,823	0											
D.0.0	Vedlejší rozpočtové náklady 2. etapa	6/15/2022	8/31/2022	381,823	0											
VN/2	Vedlejší náklady - 2.ETAPA	6/15/2022	8/31/2022	381,823	0											
D.1.1.1_B	Architektonicko-stavební řešení 1.NP_2.e	6/15/2022	8/31/2022	2,013,573	2,334											
3	Svislé a kompletní konstrukce	7/18/2022	8/26/2022	91,812	59											
61	Úpravy povrchů vnitřní	8/8/2022	8/26/2022	350,145	526											
63	Podlahy a podlahové konstrukce	8/1/2022	8/5/2022	7,194	6											
64	Výplně otvorů	7/4/2022	7/15/2022	27,978	19											
94	Lešení a stavební výtahy	7/5/2022	8/19/2022	96,834	180											
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	8/29/2022	8/31/2022	107,430	304											
96	Bourání konstrukcí	6/15/2022	6/30/2022	102,444	236											
99	Staveništní přesun hmot	7/4/2022	8/26/2022	6,033	19											
711	Izolace proti vodě	8/1/2022	8/4/2022	7,356	7											
766	Konstrukce truhlářské	8/1/2022	8/26/2022	61,598	10											
767	Konstrukce zámečnické	8/15/2022	8/26/2022	600,840	348											
771	Podlahy z dlaždic a obklady	8/8/2022	8/15/2022	36,229	35											
776	Podlahy povlakové	8/8/2022	8/19/2022	141,905	47											
781	Obklady keramické	8/1/2022	8/19/2022	167,845	255											
783	Nátěry	7/18/2022	7/18/2022	2,328	3											
784	Malby	8/22/2022	8/26/2022	134,065	219											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6/15/2022	6/30/2022	71,536	63											
D.1.1.1_D	Architektonicko-stavební řešení 3.NP_2.e	6/15/2022	8/31/2022	2,619,576	2,738											
3	Svislé a kompletní konstrukce	7/18/2022	8/26/2022	127,381	99											
61	Úpravy povrchů vnitřní	8/8/2022	8/26/2022	425,199	678											
63	Podlahy a podlahové konstrukce	8/1/2022	8/5/2022	4,886	5											
64	Výplně otvorů	7/4/2022	7/15/2022	38,607	25											
94	Lešení a stavební výtahy	7/5/2022	8/19/2022	82,785	154											
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	8/29/2022	8/31/2022	96,127	272											
96	Bourání konstrukcí	6/15/2022	6/30/2022	155,692	267											
99	Staveništní přesun hmot	7/4/2022	8/26/2022	26,538	84											
711	Izolace proti vodě	8/1/2022	8/4/2022	4,227	4											
761	Konstrukce sklobetonové	7/18/2022	7/29/2022	39,912	18											
764	Konstrukce klempířské	8/8/2022	8/11/2022	12,731	11											
766	Konstrukce truhlářské	8/1/2022	8/26/2022	230,272	15											
767	Konstrukce zámečnické	8/15/2022	8/26/2022	679,810	375											
771	Podlahy z dlaždic a obklady	8/8/2022	8/19/2022	38,560	37											
776	Podlahy povlakové	8/8/2022	8/19/2022	203,498	67											
781	Obklady keramické	8/1/2022	8/19/2022	196,103	230											
783	Nátěry	7/18/2022	7/18/2022	3,493	5											
784	Malby	8/22/2022	8/26/2022	115,858	219											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6/15/2022	6/30/2022	137,897	175											
D.1.1.1_C	Architektonicko-stavební řešení 2.NP_2.e	6/15/2022	8/31/2022	2,519,313	2,561											
3	Svislé a kompletní konstrukce	7/18/2022	8/26/2022	166,220	125											
61	Úpravy povrchů vnitřní	8/8/2022	8/26/2022	390,582	640											
63	Podlahy a podlahové konstrukce	8/1/2022	8/5/2022	31,027	24											
64	Výplně otvorů	7/4/2022	7/15/2022	44,115	29											
94	Lešení a stavební výtahy	7/5/2022	8/19/2022	78,266	142											
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	8/29/2022	8/31/2022	96,619	272											
96	Bourání konstrukcí	6/15/2022	6/30/2022	108,501	248											
99	Staveništní přesun hmot	7/4/2022	8/26/2022	20,344	66											
711	Izolace proti vodě	8/1/2022	8/4/2022	4,172	4											
712	Povlakové krytiny	8/8/2022	8/9/2022	894	0											
764	Konstrukce klempířské	8/8/2022	8/11/2022	6,111	6											
766	Konstrukce truhlářské	8/1/2022	8/26/2022	322,064	18											
767	Konstrukce zámečnické	8/15/2022	8/26/2022	558,829	290											
771	Podlahy z dlaždic a obklady	8/8/2022	8/15/2022	39,020	38											
776	Podlahy povlakové	8/8/2022	8/19/2022	215,506	73											
781	Obklady keramické	8/1/2022	8/19/2022	184,786	220											
783	Nátěry	7/18/2022	7/18/2022	4,075	6											
784	Malby	8/22/2022	8/26/2022	106,608	200											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6/15/2022	6/30/2022	141,572	159											
D.1.1.4.1/2	Zdravotně technické instalace_2.etapa	7/4/2022	8/5/2022	3,681,011	3,297											
721	Vnitřní kanalizace	7/4/2022	7/22/2022	676,583	608											
721.1	Tuková kanalizace	7/11/2022	7/22/2022	46,804	62											
722	Vnitřní vodovod	7/11/2022	8/5/2022	1,868,844	2,030											
7222	Požární vodovod	7/18/2022	7/22/2022	87,669	44											
725	Zařizovací předměty	8/1/2022	8/5/2022	769,124	90											
799	Ostatní	8/1/2022	8/5/2022													

Harmonogram stavby: 5104 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce zdravotnických a elektroinstalace

Zhotovitel : Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532

76001 Zlín


Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	2,022			
								červen	červenec	srpen	září
5104	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce	6/15/2022	8/31/2022	21,888,000	11,864	78	10	888,080	11,914,798	9,085,122	
D.1.1	Hlavní objekt	6/15/2022	8/31/2022	21,506,177	11,864	78	10	809,757	11,763,048	8,933,372	
D.1.1.4.3/2	Větrání_2.etapa	7/11/2022	7/29/2022	597,982	0	19	10		597,982		
VZT 101	1NP.1 Větrání m.č.117+119	7/11/2022	7/18/2022	16,521	0	8	10		16,521		
VZT 102	1NP.2 Větrání m.č.129	7/11/2022	7/18/2022	13,243	0	8	10		13,243		
VZT 203	2NP.1 Větrání m.č.205a	7/18/2022	7/25/2022	13,704	0	8	10		13,704		
VZT 204	2NP.3 Chlazení m.č. 216	7/18/2022	7/22/2022	484,854	0	5	10		484,854		
VZT 301	3NP.1 Větrání m.č.305a	7/25/2022	7/29/2022	13,704	0	5	10		13,704		
VZT 302	3NP.2 Větrání m.č.321	7/25/2022	7/29/2022	13,704	0	5	10		13,704		
VZT 303	3NP.3 Větrání m.č.213a	7/25/2022	7/29/2022	1,716	0	5	10		1,716		
VZT 410	Montážní materiál	7/11/2022	7/29/2022	6,674	0	19	10		6,674		
VZT 411	Lešení	7/11/2022	7/29/2022	7,222	0	19	10		7,222		
VZT 412	Zaregulování, revize, kvalifikační měření,	7/25/2022	7/29/2022	14,928	0	5	10		14,928		
VZT 414	Doprava, vedlejší náklady, přesuny hmot	7/11/2022	7/29/2022	11,712	0	19	10		11,712		
D.1.1.4.2/2	Vytápění_2.etapa	6/27/2022	7/29/2022	1,793,419	932	33	10	92,114	1,701,305		
713	Izolace tepelné	7/18/2022	7/21/2022	36,605	0	4	10		36,605		
732	Strojovny	7/14/2022	7/17/2022	4,672	2	4	10		4,672		
733	Rozvod potrubí	7/4/2022	7/13/2022	260,588	353	10	10		260,588		
734	Armatury	7/11/2022	7/14/2022	171,449	30	4	10		171,449		
735	Otopná tělesa	7/25/2022	7/29/2022	1,101,801	195	5	10		1,101,801		
739	Demontáže	6/27/2022	6/30/2022	92,114	90	4	10	92,114			
783	Nátěry	7/18/2022	7/21/2022	27,625	49	4	10		27,625		
7991	HZS	7/18/2022	7/21/2022	88,412	204	4	10		88,412		
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	7/4/2022	7/29/2022	10,154	8	26	10		10,154		
D.1.1.4.7	Elektrotechnická komunikace 1.NP až 4.	7/25/2022	7/29/2022	2,976,372	1	5	10		2,976,372		
SLB_01	Dodávky	7/25/2022	7/29/2022	2,029,724	0	5	10		2,029,724		
SLB_02	Elektromontáže	7/25/2022	7/29/2022	813,770	1	5	10		813,770		
ON	Ostatní náklady	7/25/2022	7/29/2022	132,878	0	5	10		132,878		
D.1.1.4.6/2	Silnoproudá elektrotechnika_2.etapa	7/11/2022	8/5/2022	5,304,931	0	26	10		3,633,197	1,671,734	
ELE_201	Rozvaděč R1.1	7/25/2022	8/5/2022	32,266	0	12	10		18,822	13,444	

ELE_202	Rozvaděč R1.2	7/25/2022	8/5/2022	97,571	0	12	10		56,916	40,655	
ELE_203	Rozvaděč R1.3	7/25/2022	8/5/2022	34,557	0	12	10		20,158	14,399	
ELE_204	Rozvaděč R2.1	7/25/2022	8/5/2022	33,663	0	12	10		19,637	14,026	
ELE_205	Rozvaděč R2.2	7/25/2022	8/5/2022	97,683	0	12	10		56,982	40,701	
ELE_206	Rozvaděč R2.3	7/25/2022	8/5/2022	29,671	0	12	10		17,308	12,363	
ELE_207	Rozvaděč R3.1	7/25/2022	8/5/2022	31,634	0	12	10		18,453	13,181	
ELE_208	Rozvaděč R3.2	7/25/2022	8/5/2022	53,109	0	12	10		30,980	22,129	
ELE_209	Rozvaděč RT2.1	7/25/2022	8/5/2022	49,643	0	12	10		28,958	20,685	
ELE_210	Rozvaděč RT3.1	7/25/2022	8/5/2022	49,039	0	12	10		28,606	20,433	
ELE_211	Krabice s přepětovou ochranou	7/25/2022	8/5/2022	5,245	0	12	10		3,060	2,185	
ELE_212	Hlavní přívody	7/11/2022	7/22/2022	156,375	0	12	10		156,375		
ELE_213	Elektroinstalace 1.NP	7/11/2022	8/5/2022	929,860	0	26	10		751,041	178,819	
ELE_214	Elektroinstalace 2.NP	7/11/2022	8/5/2022	1,185,923	0	26	10		957,861	228,062	
ELE_215	Elektroinstalace 3.NP a 4.NP	7/11/2022	8/5/2022	1,209,938	0	26	10		977,257	232,680	
ELE_216	IRC regulace topení 1.NP, 2.NP, 3.NP	7/29/2022	8/5/2022	804,720	0	8	10		301,770	502,950	
ELE_217	Hodinové zúčtovací sazby	7/29/2022	8/5/2022	504,035	0	8	10		189,013	315,022	
D.1.1.1_C	Architektonicko-stavební řešení 2.NP_2.e	6/15/2022	8/31/2022	2,519,313	2,561	78	10	250,074	162,855	2,106,384	
3	Svislé a kompletní konstrukce	7/18/2022	8/26/2022	166,220	125	40	10		58,177	108,043	
61	Úpravy povrchů vnitřní	8/8/2022	8/26/2022	390,582	640	19	10			390,582	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	8/1/2022	8/5/2022	31,027	24	5	10			31,027	
64	Výplně otvorů	7/4/2022	7/15/2022	44,115	29	12	10		44,115		
94	Lešení a stavební výtahy	7/5/2022	8/19/2022	78,266	142	46	10		45,939	32,327	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	8/29/2022	8/31/2022	96,619	272	3	10			96,619	
96	Bourání konstrukcí	6/15/2022	6/30/2022	108,501	248	16	10	108,501			
99	Staveništní přesun hmot	7/4/2022	8/26/2022	20,344	66	54	10		10,549	9,795	
711	Izolace proti vodě	8/1/2022	8/4/2022	4,172	4	4	10			4,172	
712	Povlakové krytiny	8/8/2022	8/9/2022	894	0	2	10			894	
764	Konstrukce klempířské	8/8/2022	8/11/2022	6,111	6	4	10			6,111	
766	Konstrukce truhlářské	8/1/2022	8/26/2022	322,064	18	26	10			322,064	
767	Konstrukce zámečnické	8/15/2022	8/26/2022	558,829	290	12	10			558,829	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	8/8/2022	8/15/2022	39,020	38	8	10			39,020	
776	Podlahy povlakové	8/8/2022	8/19/2022	215,506	73	12	10			215,506	
781	Obklady keramické	8/1/2022	8/19/2022	184,786	220	19	10			184,786	
783	Nátěry	7/18/2022	7/18/2022	4,075	6	1	10		4,075		
784	Malby	8/22/2022	8/26/2022	106,608	200	5	10			106,608	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	6/15/2022	6/30/2022	141,572	159	16	10	141,572			
D.1.1.1_B	Architektonicko-stavební řešení 1.NP_2.e	6/15/2022	8/31/2022	2,013,573	2,334	78	10	173,980	122,405	1,717,188	
3	Svislé a kompletní konstrukce	7/18/2022	8/26/2022	91,812	59	40	10		32,134	59,678	
61	Úpravy povrchů vnitřní	8/8/2022	8/26/2022	350,145	526	19	10			350,145	

63	Podlahy a podlahové konstrukce	8/1/2022	8/5/2022	7,194	6	5	10			7,194	
64	Výplně otvorů	7/4/2022	7/15/2022	27,978	19	12	10		27,978		
94	Lešení a stavební výtahy	7/5/2022	8/19/2022	96,834	180	46	10		56,838	39,997	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	8/29/2022	8/31/2022	107,430	304	3	10			107,430	
96	Bourání konstrukcí	6/15/2022	6/30/2022	102,444	236	16	10	102,444			
99	Staveništní přesun hmot	7/4/2022	8/26/2022	6,033	19	54	10		3,128	2,905	
711	Izolace proti vodě	8/1/2022	8/4/2022	7,356	7	4	10			7,356	
766	Konstrukce truhlářské	8/1/2022	8/26/2022	61,598	10	26	10			61,598	
767	Konstrukce zámečnické	8/15/2022	8/26/2022	600,840	348	12	10			600,840	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	8/8/2022	8/15/2022	36,229	35	8	10			36,229	
776	Podlahy povlakové	8/8/2022	8/19/2022	141,905	47	12	10			141,905	
781	Obklady keramické	8/1/2022	8/19/2022	167,845	255	19	10			167,845	
783	Nátěry	7/18/2022	7/18/2022	2,328	3	1	10		2,328		
784	Malby	8/22/2022	8/26/2022	134,065	219	5	10			134,065	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6/15/2022	6/30/2022	71,536	63	16	10	71,536			
D.1.1.4.1/2	Zdravotně technické instalace_2.etapa	7/4/2022	8/5/2022	3,681,011	3,297	33	10		2,379,984	1,301,027	
721	Vnitřní kanalizace	7/4/2022	7/22/2022	676,583	608	19	10		676,583		
721.1	Tuková kanalizace	7/11/2022	7/22/2022	46,804	62	12	10		46,804		
722	Vnitřní vodovod	7/11/2022	8/5/2022	1,868,844	2,030	26	10		1,509,451	359,393	
7222	Požární vodovod	7/18/2022	7/22/2022	87,669	44	5	10		87,669		
725	Zařizovací předměty	8/1/2022	8/5/2022	769,124	90	5	10			769,124	
799	Ostatní	8/1/2022	8/5/2022	172,510	387	5	10			172,510	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	7/4/2022	7/22/2022	59,478	76	19	10		59,478		
D.1.1.1_D	Architektonicko-stavební řešení 3.NP_2.e	6/15/2022	8/31/2022	2,619,576	2,738	78	10	293,589	188,947	2,137,040	
3	Svislé a kompletní konstrukce	7/18/2022	8/26/2022	127,381	99	40	10		44,583	82,797	
61	Úpravy povrchů vnitřní	8/8/2022	8/26/2022	425,199	678	19	10			425,199	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	8/1/2022	8/5/2022	4,886	5	5	10			4,886	
64	Výplně otvorů	7/4/2022	7/15/2022	38,607	25	12	10		38,607		
94	Lešení a stavební výtahy	7/5/2022	8/19/2022	82,785	154	46	10		48,591	34,194	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	8/29/2022	8/31/2022	96,127	272	3	10			96,127	
96	Bourání konstrukcí	6/15/2022	6/30/2022	155,692	267	16	10	155,692			
99	Staveništní přesun hmot	7/4/2022	8/26/2022	26,538	84	54	10		13,760	12,777	
711	Izolace proti vodě	8/1/2022	8/4/2022	4,227	4	4	10			4,227	
761	Konstrukce sklobetonové	7/18/2022	7/29/2022	39,912	18	12	10		39,912		
764	Konstrukce klempířské	8/8/2022	8/11/2022	12,731	11	4	10			12,731	
766	Konstrukce truhlářské	8/1/2022	8/26/2022	230,272	15	26	10			230,272	
767	Konstrukce zámečnické	8/15/2022	8/26/2022	679,810	375	12	10			679,810	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	8/8/2022	8/19/2022	38,560	37	12	10			38,560	
776	Podlahy povlakové	8/8/2022	8/19/2022	203,498	67	12	10			203,498	

781	Obklady keramické	8/1/2022	8/19/2022	196,103	230	19	10			196,103	
783	Nátěry	7/18/2022	7/18/2022	3,493	5	1	10		3,493		
784	Malby	8/22/2022	8/26/2022	115,858	219	5	10			115,858	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6/15/2022	6/30/2022	137,897	175	16	10	137,897			
D.0	Vedlejší rozpočtové náklady	6/15/2022	8/31/2022	381,823	0	78	10	78,323	151,750	151,750	
D.0.0	Vedlejší rozpočtové náklady 2. etapa	6/15/2022	8/31/2022	381,823	0	78	10	78,323	151,750	151,750	
VN/2	Vedlejší náklady - 2.ETAPA	6/15/2022	8/31/2022	381,823	0	78	10	78,323	151,750	151,750	
	Cena za měsíc							888,080	11,914,798	9,085,122	0
	Cena za rok							21,888,000			

Finanční harmonogram

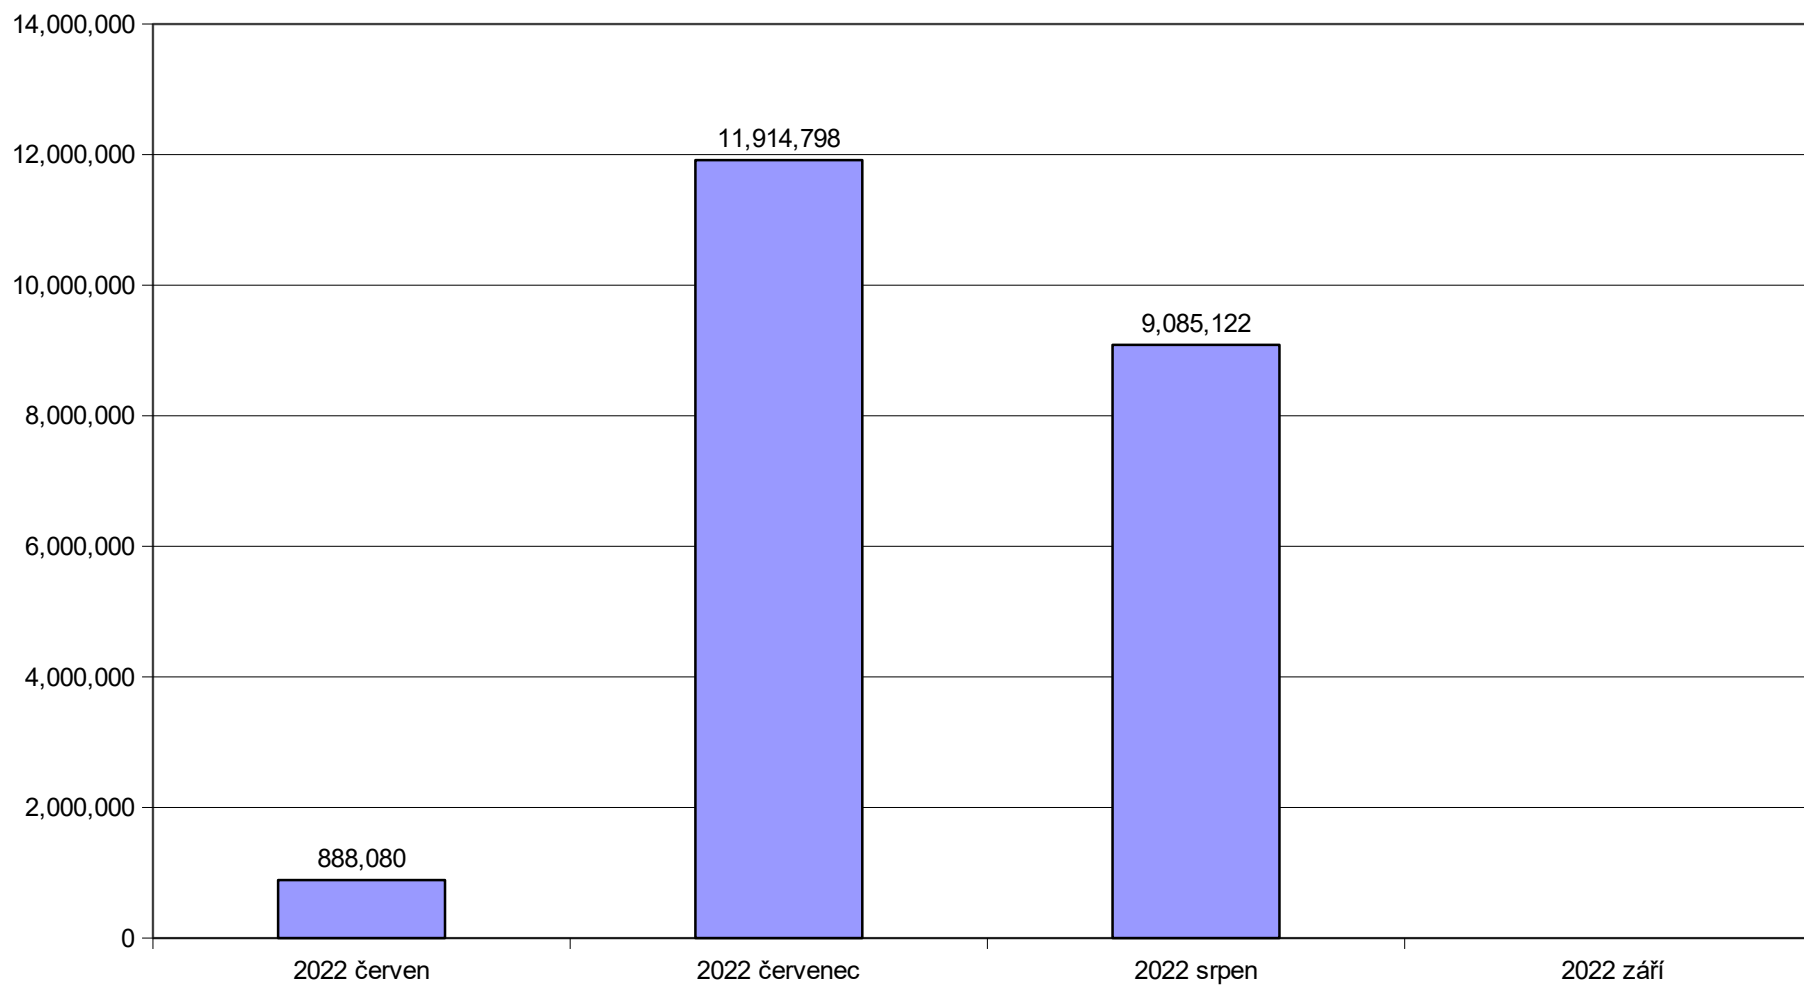

Součtový finanční harmonogram

