


Oprava RWY 12/30 v km 1,578 - 1,803

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Oprava RWY 12/30 v km 1,578 - 1,803	77 dny?	15.3.17	31.5.17
2	15.3.2017 zahájení stavby	0 dny	15.3.17	15.3.17
3	přeplepení zapuštěných návěstidel a meteo čidel / PRELIMINARY WORKS	1 den?	15.3.17	16.3.17
4	výbourání CB desky / DEMILITION OF CONCRETE PAVEMENT	14 dny	16.3.17	30.3.17
5	frézování CB desky / MILLING	2 dny	30.3.17	1.4.17
6	očištění CB desky stlačeným vzduchem / SURFACE CLEANING	1 den?	1.4.17	2.4.17
7	ošetření spár a trhlin ve spodní CB desce / TREATMENT OF BOTTOM LAYER	1 den	2.4.17	3.4.17
8	plošná oprava stávající desky materiálem Sika Mono Top / TREATMENT WITH Sika	2 dny	3.4.17	5.4.17
9	Úprava svislých hran, Lepení EPS	3 dny	5.4.17	8.4.17
10	1 pulka	10 dny?	8.4.17	18.4.17
11	pokládka geotextilie / GEOSYNTHETIC MATERIAL PLACEMENT	1 den	8.4.17	9.4.17
12	rozmístění výztuže - kari síť / REINF. MESH PLACEMENT	6 dny	8.4.17	14.4.17
13	rozmístění kluzných trnů a kotev / DOWELS AND TIE BARS PLACEMENT	4 dny	10.4.17	14.4.17
14	přípravné práce před betonáží	1 den?	14.4.17	15.4.17
15	betonáž / CEMENT CONCRETE SURFACE PLACEMENT	1 den	15.4.17	16.4.17
16	technologická přestávka / TECHNOLOGICAL BREAK	1 den	16.4.17	17.4.17
17	řezání spár - CUTTING	1 den?	17.4.17	18.4.17
18	2 pulka	8 dny?	17.4.17	25.4.17
19	pracovní spára - vrtání	1 den?	18.4.17	19.4.17
20	pokládka geotextilie / GEOSYNTHETIC MATERIAL PLACEMENT	1 den	17.4.17	18.4.17
21	rozmístění výztuže - kari síť / REINF. MESH PLACEMENT	5 dny	17.4.17	22.4.17
22	rozmístění kluzných trnů a kotev / DOWELS AND TIE BARS PLACEMENT	3 dny	19.4.17	22.4.17
23	betonáž / CEMENT CONCRETE SURFACE PLACEMENT	1 den	22.4.17	23.4.17
24	technologická přestávka / TECHNOLOGICAL BREAK	1 den?	23.4.17	24.4.17
25	řezání spár - CUTTING	1 den?	24.4.17	25.4.17
26	2.5.2017 milník: dokončení nového CB krytí	0 dny	2.5.17	2.5.17
27	oprava příjezdové komunikace a teréni úpravy - ORN	8 dny	26.4.17	4.5.17
28	technologická přestávka, čištění komunikací, předznačení VDZ	21 dny	25.4.17	16.5.17
29	těsnění spár v CB krytí / JOINTS SEALING	3 dny	16.5.17	19.5.17
30	značení / ROAD MARKING	3 dny	19.5.17	22.5.17
31	čištění ploch	3 dny	22.5.17	25.5.17
32	Likvidace ZS + vyklizení ploch / SITE INSTALLATION - REMOVE	5 dny	25.5.17	30.5.17
33	31.5.2017 milník dle SoD: Řádné dokončení Díla	0 dny	31.5.17	31.5.17

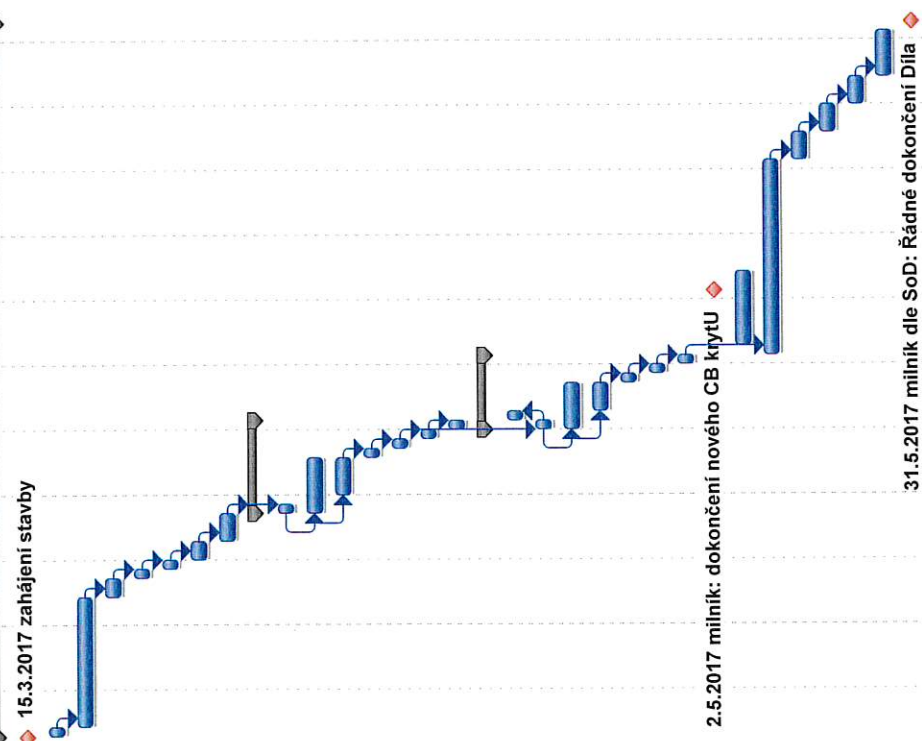

Úkol Milník Vnější úkoly

Rozdělení Souhrmný Vnější milník

Průběh Souhrn projektu Konečný termín

Projekt: RWY_12-30_160805_MNI
Datum: 6.1.17
