


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Výstavba stravovacího provozu Akademie VS ČR, Stráž pod Ralskem	264 dn	04.11.22	03.11.23
2	podpis smlouvy o dílo	0 dny	04.11.22	04.11.22
3	koordinační příprava	0 dny	07.11.22	07.11.22
4	převzetí staveniště	0 dny	21.11.22	21.11.22
5	Protokol o převzetí staveniště	0 dny	21.11.22	21.11.22
6	Přípravné práce a vybudování zařízení staveniště	5 dny	21.11.22	25.11.22
7	Součinnost objednatele	13 dny	21.11.22	05.12.22
11	Projektové práce zhotovitele	25 dny	08.11.22	08.12.22
15	Výrobní příprava - klíčové dodávky	78 dn	09.11.22	23.02.23
36	SO01 Stravovací pavilon	248 dn	25.11.22	03.11.23
37	Geodetické vytyčení	1 den	25.11.22	25.11.22
38	zemní práce - pilotovací rovina	2 dny	02.12.22	04.12.22
39	pilotové zakládání	18 dny	13.12.22	05.01.23
40	zemní práce - výkopy pro základy	20 dny	06.01.23	02.02.23
41	základové konstrukce monolitické - podkladní betony, pasy	30 dny	09.01.23	17.02.23
42	vedení sítí pod objektem	26 dny	20.01.23	24.02.23
43	zpětné zásypy, podkladní štěrky	8 dny	16.02.23	27.02.23
44	ŽB základová deska	21 dny	20.02.23	20.03.23
45	Dokončení základových ŽB konstrukcí	0 dny	20.03.23	20.03.23
46	spodní izolace - obvodová pod stěny	5 dny	21.03.23	27.03.23
47	svislé konstrukce a věnce 1.NP	25 dny	28.03.23	01.05.23
48	D+M spiřoly	10 dny	16.05.23	29.05.23
49	svislé konstrukce a věnce 2.NP	24 dny	30.05.23	30.06.23
50	D+M střešní vazníky	10 dny	17.07.23	28.07.23
51	Dokončení montáže střešních vazníků	0 dny	28.07.23	28.07.23
52	příčky 1.NP včetně zárubní	20 dny	30.05.23	26.06.23
53	příčky 2.NP včetně zárubní	25 dny	13.06.23	17.07.23
54	střešní plášť, klempířské konstrukce	30 dny	31.07.23	08.09.23
55	D+M výplně otvorů fasáda	30 dny	31.07.23	08.09.23
56	TZB - hrubé rozvody 1.NP	40 dny	30.05.23	24.07.23
57	hydroizolace 1.NP	10 dny	11.07.23	24.07.23
58	vnitřní omítky 1.NP	20 dny	04.07.23	31.07.23
59	zateplení ETICS	10 dny	25.07.23	07.08.23
60	podlahové skladby 1.NP	15 dny	25.07.23	14.08.23
61	TZB - hrubé rozvody 2.NP	40 dny	11.07.23	04.09.23
62	vnitřní omítky 2.NP	20 dny	18.07.23	14.08.23
63	podlahové skladby 2.NP	15 dny	05.09.23	25.09.23
64	dokončení hrubých rozvodů TZB	0 dny	04.09.23	04.09.23
65	podhledy	38 dny	08.08.23	28.09.23
66	obklady, dlažby	35 dny	25.08.23	12.10.23
67	TZB - instalace, kompletace	30 dny	15.09.23	26.10.23
68	malby	15 dny	13.10.23	02.11.23
69	KZS včetně omítek	50 dny	31.07.23	06.10.23
70	klempířské prvky fasáda a svody	20 dny	09.10.23	03.11.23
71	přístřešek	169 dn	28.02.23	20.10.23
72	základy	20 dny	28.02.23	27.03.23
73	ocelové konstrukce	15 dny	25.09.23	13.10.23
74	kompletace	5 dny	16.10.23	20.10.23
75	dokončovací práce	25 dny	15.09.23	19.10.23
76	revize, zkoušky	15 dny	13.10.23	02.11.23
77	Vyčištění objektu	5 dny	30.10.23	03.11.23
78	IO01 Zpevněné plochy, sadové úpravy	247 dn	27.11.22	03.11.23
79	bourací práce, odstranění stávajících ploch	5 dny	27.11.22	01.12.22
80	příprava - nové plochy (obrubníky, štěrky)	30 dny	21.08.23	29.09.23
81	zámková dlažba	15 dny	02.10.23	20.10.23
82	sadové úpravy, čisté terénní úpravy	15 dny	16.10.23	03.11.23
83	IO02 Venkovní splašková a dešťová kanalizace	234 dn	30.11.22	20.10.23
84	odstranění stávajících vedení a šachet	5 dny	30.11.22	05.12.22
85	přeložka splaškové kanalizace	10 dny	30.11.22	12.12.22
86	provedení nových tras - výkopy, potrubí, zásypy	40 dny	31.07.23	22.09.23
87	kompletace přípojek	20 dny	25.09.23	20.10.23
88	IO03 Areálový rozvod NN, venkovního osvětlení a slaboproudých roz	127 dn	27.04.23	20.10.23
89	objektová přípojka	10 dny	27.04.23	10.05.23
90	rozvody k bráně	5 dny	11.05.23	17.05.23
91	venkovní osvětlení na objektu	10 dny	09.10.23	20.10.23
92	přeložka VO u stávajícího objektu	10 dny	11.09.23	22.09.23
93	IO04 Areálový rozvod horkovodu	23 dny	11.05.23	12.06.23
94	zemní práce, výkopy	5 dny	11.05.23	17.05.23
95	pokládka potrubí, zkoušky	10 dny	18.05.23	31.05.23
96	zásypy	5 dny	01.06.23	07.06.23
97	propojení systému	3 dny	08.06.23	12.06.23
98	IO05 Přípojka VN a trafostanice	55 dny	23.03.23	07.06.23
99	provedení nové kabelové trasy VN z odpojení na nadzemním vedení	35 dny	23.03.23	10.05.23
100	dodávka TS	20 dny	13.04.23	10.05.23
101	propojení a oživení TS	20 dny	11.05.23	07.06.23
102	IO06 Přípojka vody a areálový rozvod vody	82 dny	17.01.23	10.05.23
103	přívod do objektu	5 dny	17.01.23	23.01.23
104	vodoměrná šachta a napojení na řad	10 dny	27.04.23	10.05.23
105	Předávací řízení	15 dny	13.10.23	02.11.23
106	Prohlídka díla	5 dny	13.10.23	19.10.23
107	Dokumentace k předání díla (DSPS, revize, doklady apod.)	0 dny	13.10.23	13.10.23
108	Předání díla	0 dny	02.11.23	02.11.23
109	Protokol o předání díla objednateli	0 dny	02.11.23	02.11.23
110				
111	Dílnská dokumentace bude poskytnuta k odsouhlasení minimálně 7 dní před zahájením příslušných prací.			

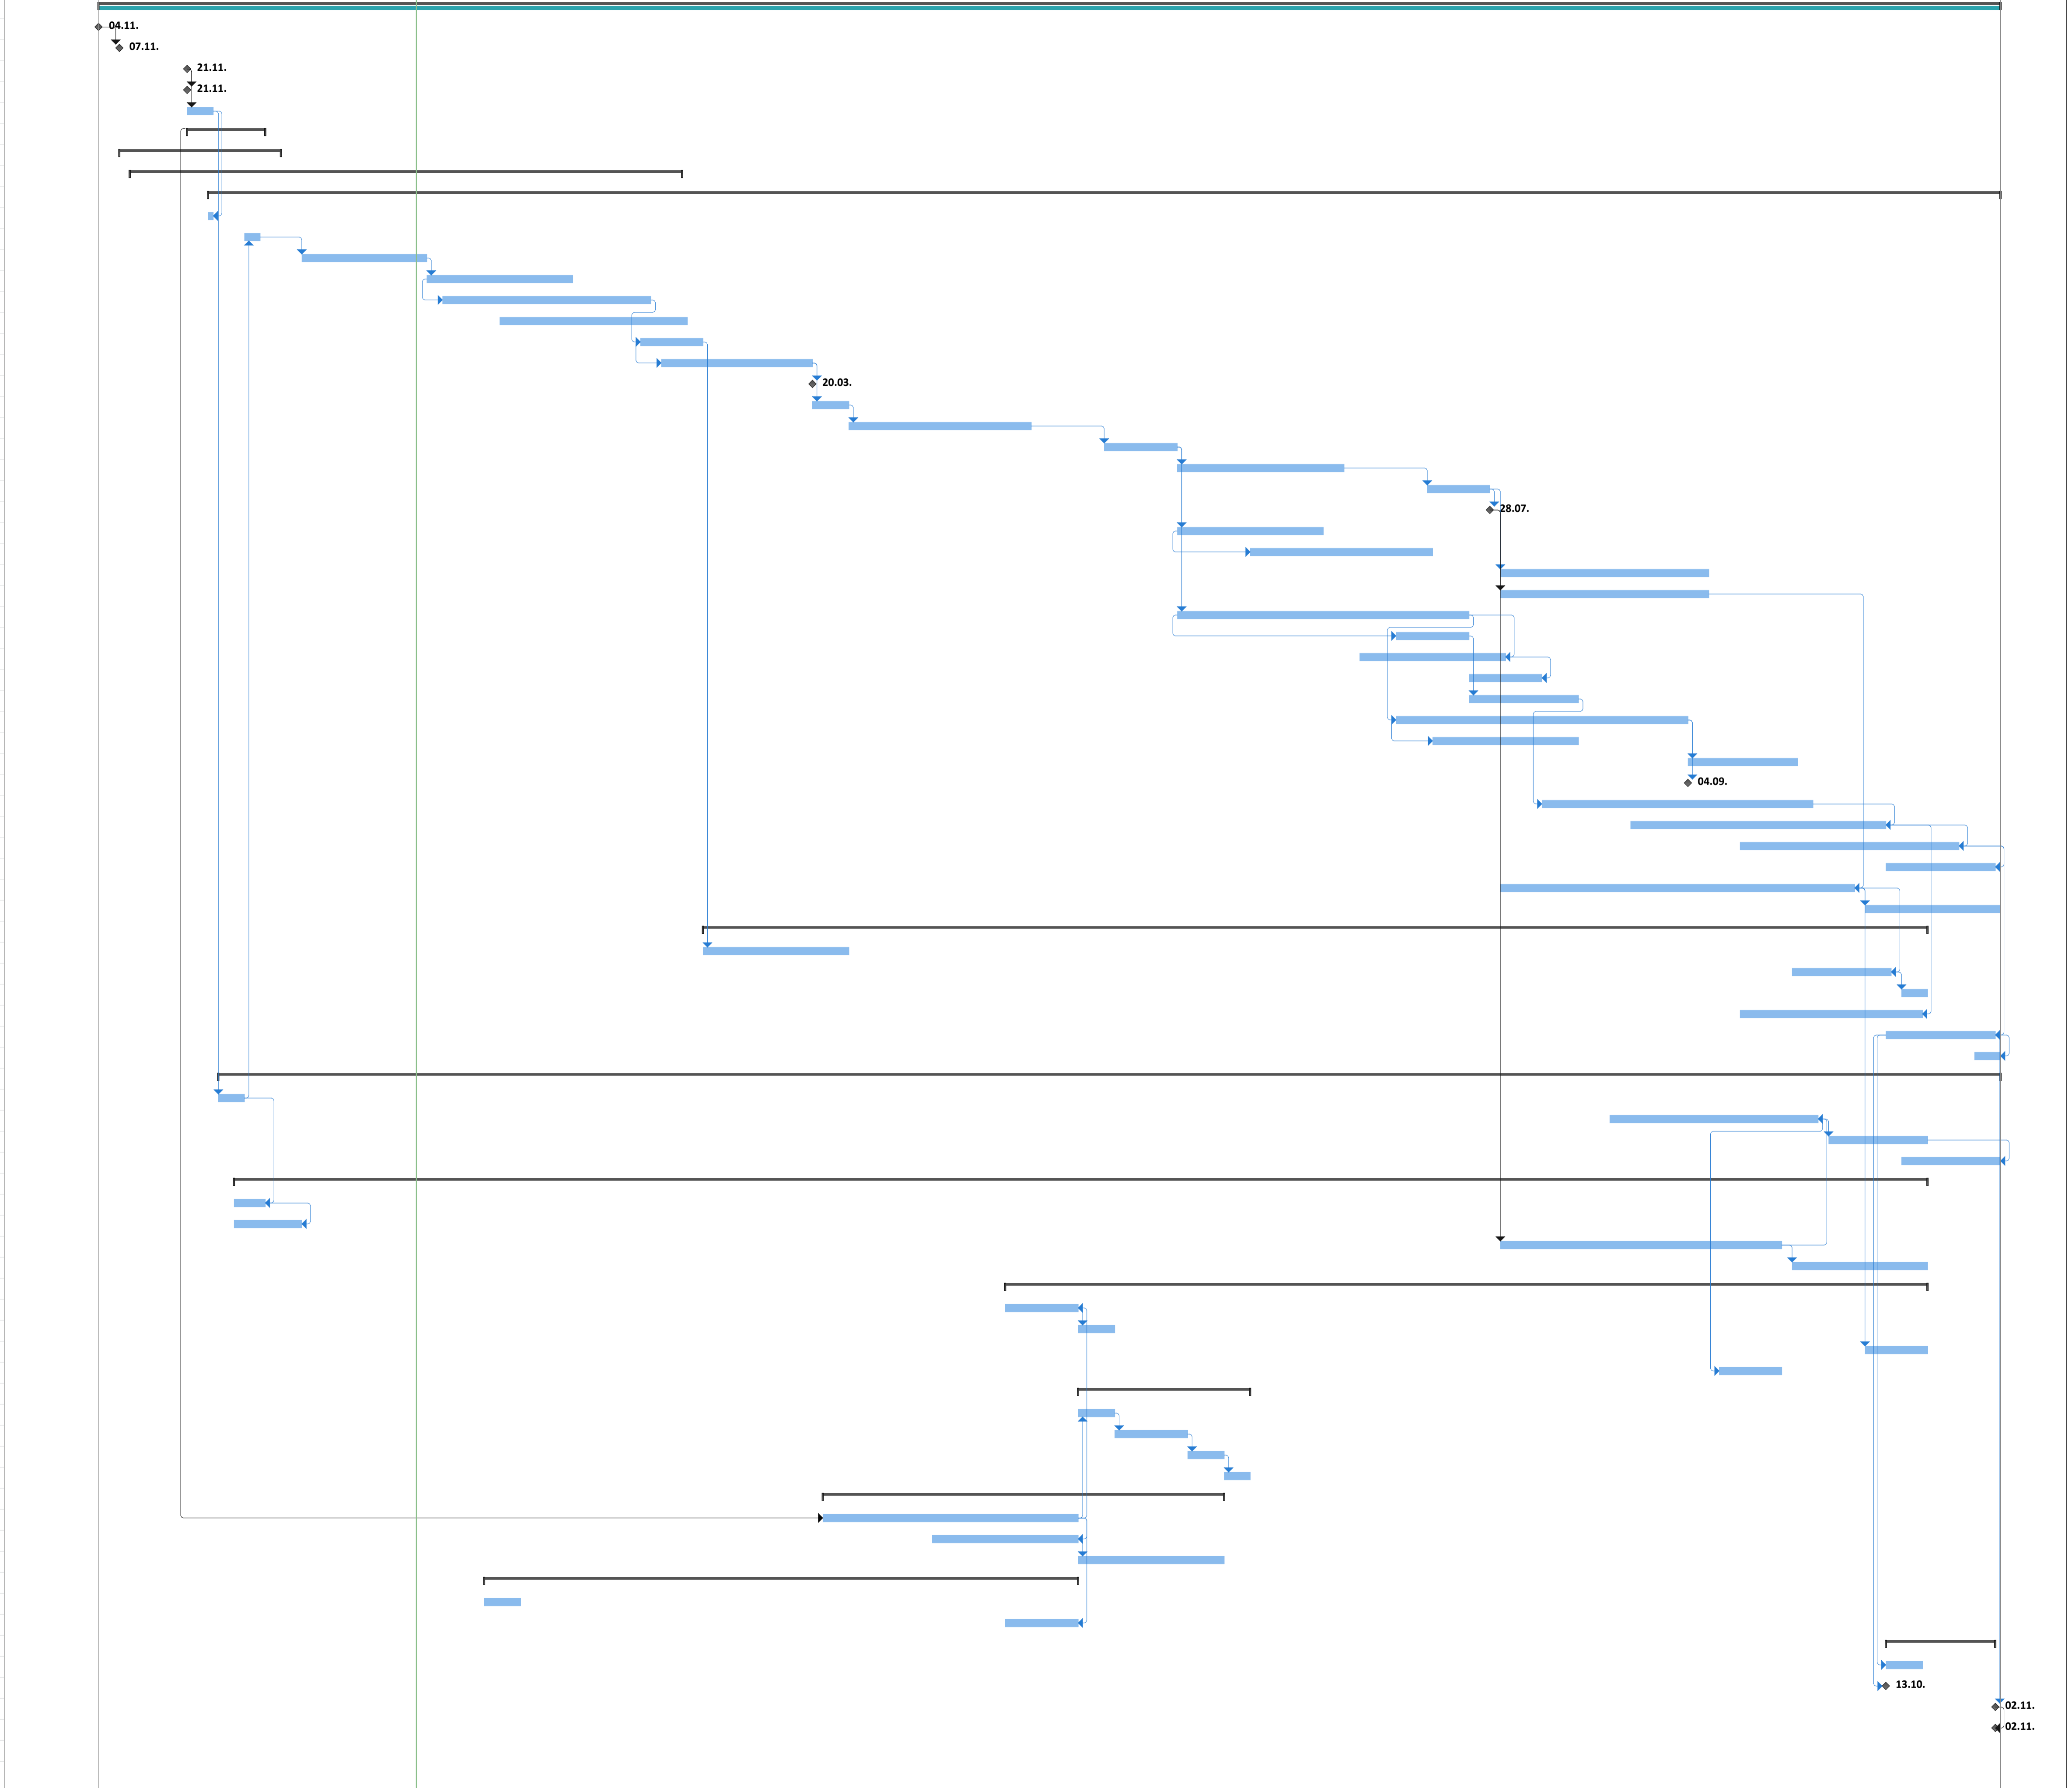

Projekt: HMG_Akademie VS ČR_re	Úkol	Souhrnný	Vnější milník	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Průběh ručně zadaného úkolu
Datum: 04.01.23	Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Konečný termín	Průběh
	Milník	Vnější úkoly	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Průběh	
