


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrt. 2, 2021			Čtvrt. 3, 2021			Čtvrt. 4, 2021			Čtvrt. 1, 2022			Čtvrt. 2, 2022			Čtvrt. 3, 2022			Čtvrt. 4,
							III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1		„Obnova zahrady Strakovy akademie“																							
2																									
3		Předání/převzetí staveniště	1 den	01.06. 21	01.06. 21																				
4		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	31 dny?	02.06. 21	02.07. 21	3																			
5		Zařízení staveniště vč. oplocení	8 dny	01.06. 21	08.06. 21	3																			
6		Vytyčení stávajících sítí	30 dny	01.06. 21	30.06. 21	3																			
7		Zřízení ochrany stromů	13,25 dny	01.06. 21	14.06. 21	3																			
8		Vytyčení stavby	31 dny	01.06. 21	01.07. 21	3																			
9		Osazení 2 ks semaforů	11 dny	22.06. 21	02.07. 21	3FS+20 dny																			
10		Osazení 2 ks billboardů	1 den	02.06. 21	02.06. 21	3FS+31 dny																			
11		TECHNICKÉ PRVKY - podél E.Beneše	60 dny	04.06. 21	02.08. 21																				
12		Odstranění stávajících povrchů	28 dny	04.06. 21	01.07. 21	10																			
13		Nové povrchy	30 dny	02.07. 21	31.07. 21	12																			
14		Výměna mříží odvodňovacích žlabů	2 dny	01.08. 21	02.08. 21	13																			
15		ZELEŇ - podél E.Beneše	14 dny	01.10. 21	14.10. 21	10FS+93 dny																			
16		Parkový trávník	10 dny	01.10. 21	10.10. 21	10FS+93 dny																			
17		Regenerace stávajícího trávníku	14 dny	01.10. 21	14.10. 21	10FS+93 dny																			
18		TECHNICKÉ PRVKY	290 dny	03.08. 21	19.05. 22	11																			
19		Odstranění stávajících povrchů	90 dny	03.08. 21	31.10. 21	11																			
20		Odstranění schodů, základů, zídek	15 dny	03.08. 21	17.08. 21	11																			
21		Repase schodiště	60 dny	18.08. 21	16.10. 21	20																			
22		Zídky	60 dny	18.08. 21	16.10. 21	20																			
23		Nové povrchy	120 dny	05.01. 22	04.05. 22	37;48;57																			
24		Plot	10 dny	05.05. 22	14.05. 22	23																			
25		Dokončovací práce	5 dny	15.05. 22	19.05. 22	24																			
26		Mobiliář	5 dny	15.05. 22	19.05. 22	24																			
27		ZELEŇ	223,38 dny	15.10. 21	26.05. 22	15																			
28		Trvalky	43,13 dny	15.10. 21	27.11. 21	15																			
29		Keře	61,25 dny	26.03. 22	26.05. 22	28FS+119 dny																			
30		Retenční trávník	61,25 dny	26.03. 22	26.05. 22	28FS+119 dny																			
31		Parkový trávník	61,25 dny	26.03. 22	26.05. 22	28FS+119 dny																			
32		Regenerace stávajícího trávníku	61,25 dny	26.03. 22	26.05. 22	28FS+119 dny																			
33		ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM	185,13 dny	01.11. 21	05.05. 22	10																			
34		Bourací práce, demontáže	10 dny	01.11. 21	10.11. 21	19																			
35		Zemní práce - výkopy	21 dny	01.11. 21	21.11. 21	19																			
36		Trubní rozvody	21 dny	22.11. 21	12.12. 21	35																			
37		Zemní práce - zásyp	21 dny	13.12. 21	02.01. 22	36																			
38		Kompletace koncových prvků	31 dny	26.03. 22	26.04. 22	28FS+119 dny																			
39		Stavební úpravy místnosti technologie	20 dny	13.12. 21	01.01. 22	36																			



Projekt: sr Datum: 20.05. 21	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrť 2, 2021				Čtvrť 3, 2021			Čtvrť 4, 2021			Čtvrť 1, 2022			Čtvrť 2, 2022			Čtvrť 3, 2022			Čtvrť 4,
							III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
40		MTŽ technologie	31 dny	26.03. 22	26.04. 22	28FS+119 dny																				
41		Tlakové zkoušky	9 dny	26.04. 22	05.05. 22	40																				
42		OSVĚTLENÍ	196 dny	17.11. 21	31.05. 22																					
43		Demontáž stávající elektroinstalace	11 dny	17.11. 21	27.11. 21	19																				
44		Zemní práce - hloubení	14 dny	17.11. 21	30.11. 21	19																				
45		Kabelové rozvody	21 dny	01.12. 21	21.12. 21	44																				
46		Zemnění	21 dny	01.12. 21	21.12. 21	44																				
47		Provedení kabelových tras	21 dny	01.12. 21	21.12. 21	44																				
48		Zemní práce - zásyp kabelových tras	14 dny	22.12. 21	04.01. 22	47																				
49		Kompletace koncových prvků	59 dny	02.03. 22	29.04. 22	48FS+56 dny																				
50		Rozvaděče	34 dny	27.04. 22	30.05. 22																					
51		Předání revize	1 den	31.05. 22	31.05. 22	50																				
52		VODNÍ PRVKY	105 dny	01.11. 21	13.02. 22	10																				
53		Zemní práce - výkopy	14 dny	01.11. 21	14.11. 21	19																				
54		ŽB kce fontány	30 dny	15.11. 21	14.12. 21	53																				
55		Elektroinstalace - rozvody	14 dny	15.11. 21	28.11. 21	53																				
56		Technologie - rozvody	14 dny	15.11. 21	28.11. 21	53																				
57		Zemní práce - obsyp, zásyp	14 dny	29.11. 21	12.12. 21	56																				
58		Technologie - kompletace	60 dny	13.12. 21	10.02. 22	57																				
59		Zkoušky	3 dny	11.02. 22	13.02. 22	58																				
60		PERIMETRICKÁ SÍŤ	14 dny	03.06. 21	16.06. 21	10																				
61		Zemní práce - výkop	5 dny	03.06. 21	07.06. 21	10																				
62		<i>Perimetrická síť - realizace jiným subj.</i>	5 dny	08.06. 21	12.06. 21	61																				
63		Zemní práce - zásyp	4 dny	13.06. 21	16.06. 21	62																				
64		Protokolární předání stavby	1 den	01.06. 22	01.06. 22	3FS+364 dny																				
65		Dokončení Komplexních zkoušek	1 den	10.06. 22	10.06. 22	64FS+8 dny																				
66		Odstranění staveniště	1 den	14.06. 22	14.06. 22	64FS+12 dny																				
67		Předání DSPS	1 den	30.06. 22	30.06. 22	64FS+28 dny																				
68		Předání 2 ks pamětních desek	1 den	31.08. 22	31.08. 22	64FS+90 dny																				

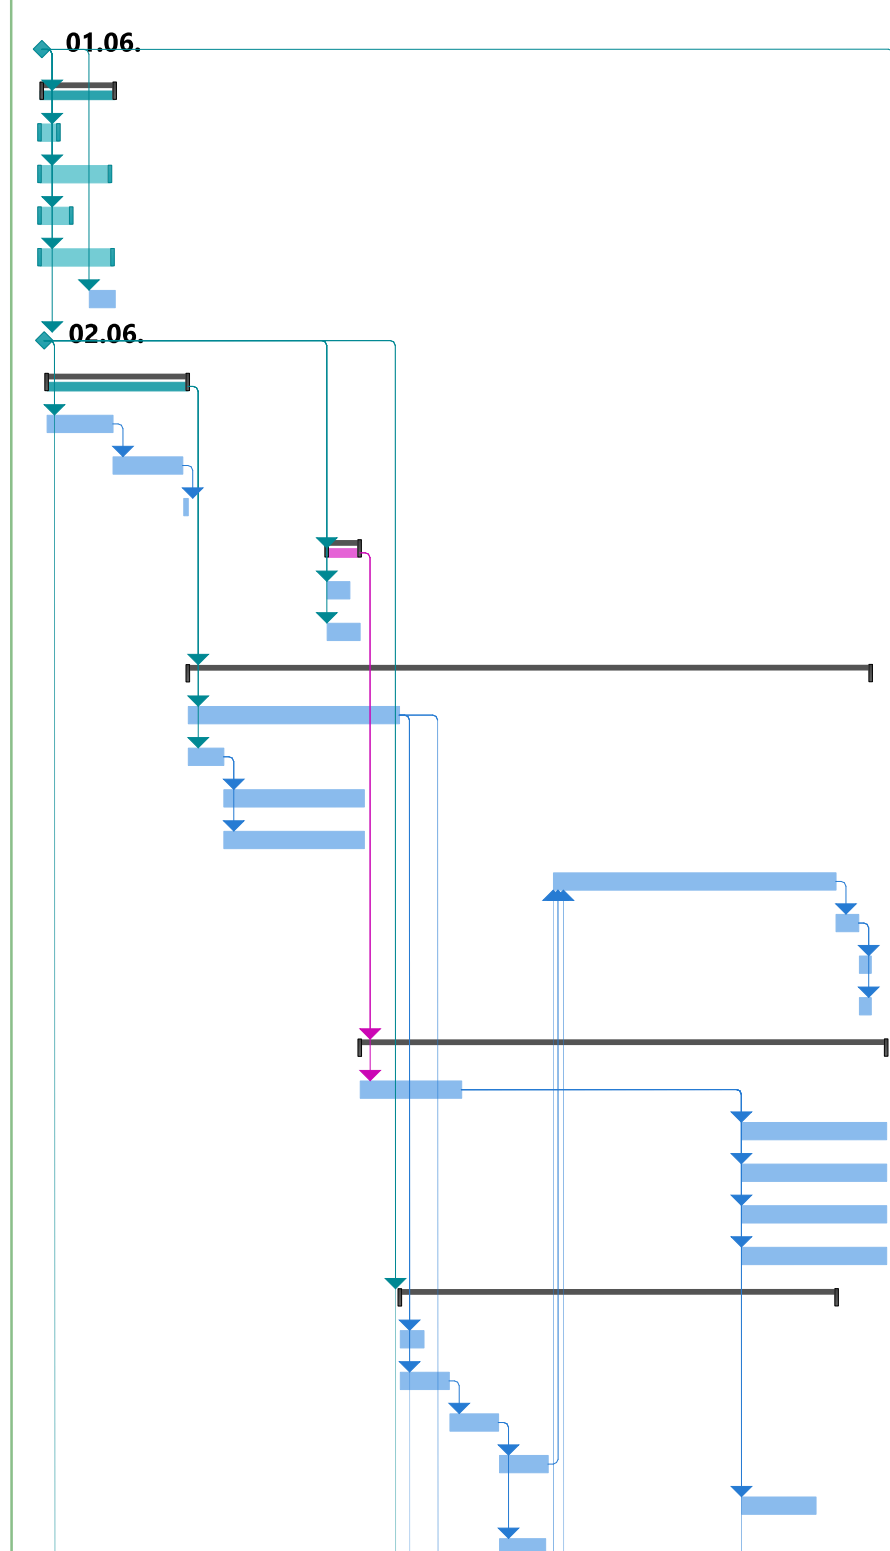

Ing. Miloš
Náprstek

Digitálně podepsal Ing.
Miloš Náprstek
Datum: 2021.05.20
10:29:26 +02'00'

Projekt: sr
Datum: 20.05. 21

Úkol		Neaktivní úkol
Rozdělení		Neaktivní milník
Milník		Neaktivní souhrn
Souhrnný		Ruční úkol
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání

	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Ruční souhrn		Konečný termín	
	Pouze zahájení		Průběh	
	Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Vnější úkoly			
