

SO 103

Datum: 6. 9. 2021 Den týdne: PO

Řídicí středisko: 81/2000 Název akce: 11/102 HB. HL. 17. PRATY - STĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, 1. ET.

Teplota: JASNO +10°C, +24°C

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 17⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): JIŘÍ LUKEŠ, ZDENĚK KOUTENSKÝ, PAVEL BLÁHO, MARIAN
CHENDEJ, VASIL HAD, ZDENĚK KOLÁŘ

Mechanismy: KRATICE, DETPČI, VIBROČNÍ DESKA, MOTOROVÁ ŘÍZEBKA PŘÍVĚS

Materiál: KAMENKO PR. 0-32mm, 4-8mm, ŽÁTKOVÁ OLÁŠKA, PÍSEK
PR. 0-1mm

Zkoušky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - ZAPOŘEDNÍ POUŠTĚV 8 PR. 0-32mm
 (CHODNICE PRO PĚŠI - 1510 ŠTĚPNA 15 PRŮMĚR
 PŘAMĚRŮ V KM 15,190 - 15,140) + MONTÁŽNÍ PR. OBEROV
 - POUŠTĚV POUŠTĚV 8 PR. 4-8mm + POUŠTĚV
 ŽÁTKOVÉ OLÁŠKY V KM 15,190 - 15,140 1510 ŠTĚPNA
 15 PRŮMĚR PŘAMĚRŮ + ZAPÍČKOVÁNÍ + MONTÁŽNÍ

ZÁKON ZHODNOTIČE

V LÁNCI REKONSTRUKCE VOZOVU PROTAH PŘECHODIČI
 BYLO NUTNÉ ÚHROUĚ UPLAUIT NEBO UVRĚNIT VTAŽITELI
 ULIČNÍ ÚPRAVY VOZOVARY, PORUŠENÍ NECH. PACHET PRU.
 KANALIE. KÁDŮ U TOUČNĚNÍ P PLOUŠENÍ NOSTA
 KONSTRUKČNÍCH VLASTÍ VOLOUK. TOTO BUDĚ DOLOŽENO
 MĚŘICÍMÍ PROTOKOLM A FOTOZDOKUMENTACÍ K UVRĚNENO
 JAKO ÚČEPLÁČE ÚČASNŮMŮ U OJSEKATEČE.

ZÁKON VDII AVIZOVANĚ VICE PRÁČE ZUPĚ DOLOŽENA
 DETAILNĚM JOURNĚM PRÁČI VOLOUK
 VYRODNOČENÍ VÍTKOVÝCH DČENÍČE KANAL.
 POUŠTĚV, UV A DALŠÍM KONSTR V OBLASTI
 VESTĚ.

Podpis zástupce investora (TI)

Podpis st

SO 103

Datum: 29. 2021 Den týdne: ÚT

Nákladové středisko: 21/1841 Název akce: 11/021 HR. HL. M. PRAHA - STŘEHOVICE, REKONSTRUČE II. ETAPA

Včasn: 18:00 + 9h, +23°C

Pracovní doba: 3:00 - 12:00

Pracovní přestávka: 11³⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): ŠDENEK KUTIENSKI, PAVEL BLÁHA, JAROMÍR LEHČEK, ŠDENEK KOLÁŘ, PAVEL SLUHA, JAROMÍR ŠTÍPĚL, MICHAL OBERBERGER, VÁCLAV KUPO, OLEH RUCHKA

Mechanismy: PĚŠTPEL, KROVÍK, ČELNÍ NAKLADAC, PÍSEČNÍ DESKA, MOTYLKA, BRUSLÁKA PŘEJÍKELI

Materiál: PĚŠTPEL 50 Ø 32mm, 4-8mm, BRUSLÁKA PŘEJÍKELI, PÍSEČNÍ DESKA, PŘEJÍKELI Ø 4mm

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PŘEJÍKELNÍ PĚŠTPEL Ø 32mm + PÍSEČNÍ DESKA V KRM 15,140 - 15,110 + MONTÁŽNÍ VYSOČNÍ DESKA
- PŘEJÍKELNÍ PĚŠTPEL Ø 4-8mm + PŘEJÍKELNÍ BRUSLÁKA PŘEJÍKELI V KRM 15,140 - 15,110 + BRUSLÁKA PŘEJÍKELI + PŘEJÍKELNÍ + MONTÁŽNÍ BRUSLÁKA PŘEJÍKELI + PŘEJÍKELNÍ + MONTÁŽNÍ

Kopie zástupce investora (TDI):

Podpis stavby

16 103

Datum: 8.9.2027 Den týdne: PT

Nákladové středisko: 891/B50C Název akce: III/102/HB HL. 17. PRAMT - ŠICHOVKA, BELOKONSTRUKCE II. ETAPY

Počasi: JARNO +11°C +20°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOVÁŘSKÝ, ZDENĚK KOLÁŘ, ANTOUK LEBEČKA,
JANUŠEK ŠTĚPĚK, ODDĚLNÍ KONSTRUKTOR, MICHAL ČHEŇKA,
VÁCLAV VÍTO

Mechanismy: BOJTEKCI PŘELNÍ A PARALADAC, DĚTKY, PŮVODNÍ PŘÍKOPKA PŘEMĚNOU

Materiál: KAMENLO K0.4 8mm, ŠÍTKOVÁ DVOŘEBA,

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - POUŽITÍ PŮVODNÍ PŘÍKOPKY K0.4 8mm +
PŘÍKOPKA ŠÍTKOVÁ DVOŘEBA V K0.4 15,110 - 15,030
KAMENLO K0.4 8mm PŘEMĚNOU PŘÍKOPKY + ŠÍTKOVÁ DVOŘEBA

Podpis zástupce investora (TDI)

Podpis stavby

So 103

Řídicí středisko: Střelice Název akce: VIOLY HR. HL. ST. PRAHA - ČESKOVICĚ, PŘEKONSTROJKA, I. ETAPA

Datum: 9. 9. 2021 Den týdne: ÚT

Požadí: AKNO 1PC, +23°C

Pracovní doba: 8⁰⁰-17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰-11³⁰


Pracovníci (jména a příjmení): ŽEŠKARO KOUTENSKÝ, ALEXZ BLÁHA, VÍBÍ LUKŠEK, ŽEŠKARO KOUTEK, PATRIK LETHEČKA, OUDOBŠ HANČLÍK, MICHAEL ČERNÝ, RYJIL HRD, OLGA RYCHLÁ, MICHAEL DÍTR, KRYŠTOF FENOL, JARJAN VÍŠEK, MICHAEL ŽEŠKAR

Mechanismy: LIESHNER 914, KOPALCE ČERNÍ AKUMULÁČNÍ, JETPE, SYNSUL, ATO, HROBENÍ ÚŘEŠA MALÁ, PŘÍJÍMAČ PŘÍKRY, SONDY, KLADOVÁKOVSKÝ

Materiál: KLADOVÁKOVSKÝ HR. 4-8mm, ČERNÁVA DUBČEK

Průšky:

- Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):
- ODVĚZ, HROBENÍ ÚŘEŠA MALÁ & PŘÍJÍMAČ PŘÍKRY NA STŘELICÍCH
 - PRÁCE VÍŠEK PŘÍKRY - LITÁ PRÁCA NA PŘÍKRY PŘÍJÍMAČNÍ
 - PRÁCE VÍŠEK PŘÍKRY & KOPALCE HR. 4-8mm + PŘÍJÍMAČ ČERNÁVA DUBČEK + AKUMULÁČNÍ + HROBENÍ (AKUMULÁČNÍ PŘÍKRY - LITÁ PRÁCA NA PŘÍKRY PŘÍJÍMAČNÍ) LIT 15,070 - 15,050
 - ODVĚZ, HROBENÍ ÚŘEŠA MALÁ NA STŘELICÍCH
 - VÝZVA PŘÍKRY

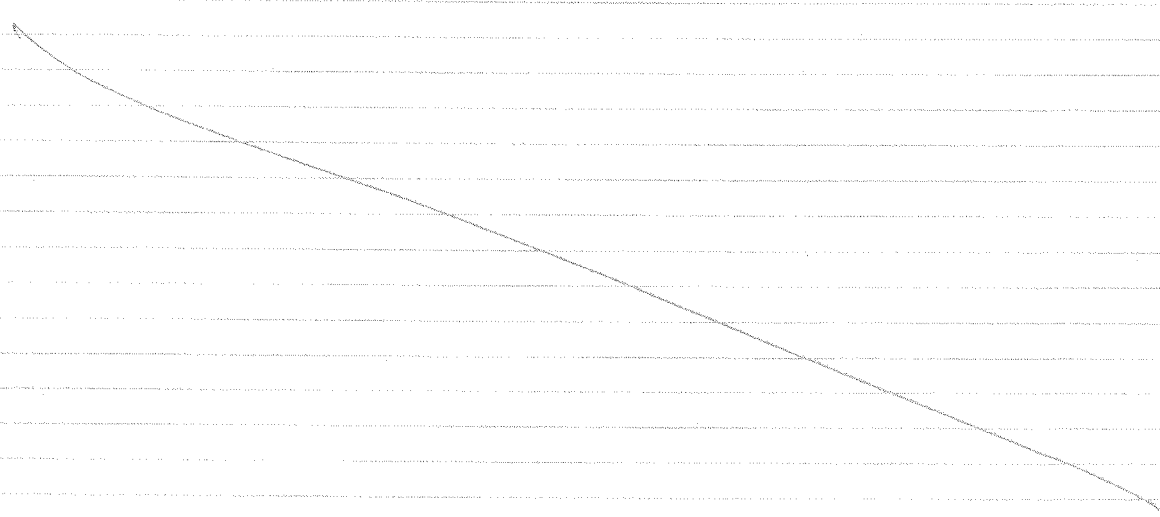

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavt

So 103

Datum: 11.9.2021 Den týdne: 10

Středisko: STRABAG Název akce: 11/103 AZ. AZ. H. PRATI - ŽECHOVICE, REKONSTRUKCE II. ETAPY

Část: Kuchyně + WC, + 20°C

Pracovní doba: 9⁰⁰ - 16⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): PAVEL LEHÁČKA, MARIAN ŠÍPEL, MICHAL CHENDEJ, 100% HOD

Mechanismy: KUCHYŇSKÝ ČERNÝ KAMENEC, DŘEVO, KOTLOVÁ PŘESÚVA MAŠINER

Materiál: BASTINO PL 48mm, KAMENEC 2000

Dotázky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PŘEVODĚNÍ PLOSTU 8 KAMENIVA
KO. 48mm + POKRYTÍ KAMENOVÉ DESKY +
ZABĚHÁNÍ (KAMENOVÁ PRÁHA KE SPÍNĚNÍ PŘEVODĚNÍ)
H1 15,050 - 15,030

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis sta

SO 103

Datum: 13. 9. 2021

Den týdne: PO

Místové středisko: 831/AGAC Název akce: UJOLHR. HL. H. PRÁNY - STĚCHOVILE, REKONSTRUKCE, ETAPA II

Teplota: 24°C POLOJASNO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTENSKÝ, PETR SLUKA, PAVEL BLAHA, JIŘÍ LUKČÍ, PATRIK LEHEČKA

Mechanismy: ČELNÍ NAKLADAC KRAMER, MOTOROVÁ ŽELEZÁČKA PARTNER

Materiál: KAMENIVO FR 4-8 mm, ŽÁHKOVÁ DLAŽBA

Časový:

Vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVEDENÍ PODSYPU Ž KAMENIVA FR 4-8 mm
- POKLADKA ŽÁHKOVÉ DLAŽBY + ŽRĚZÁNÍ (LEVA STRANA VE SMĚRU STANICENÍ) KM 15,030 - 15,010

Míst. zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyved:

50703

Datum: 14.9.2021 Den týdne: ÚT

Místové středisko: M/20AC Název akce: III/02 HR. HL. 4. PRÁNY - ŠTECHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA B.

Čas: 14⁰⁰, 22⁰⁰ POLOVÁSNOPracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTENSKÝ, PETR SLUKA, PAVEL ŽALHA,
JIRÍ LUKES, PATRIK LEHEČKA

Mechanismy: ČELNÍ NAELADAC KRAHMER, MOTOROVÁ ŽELACZA MOTIVER

Materiál: KAMENIVO FR 4-8mm, ŽÁHKOVÁ ŽLAZBA*

Zůstatky:

Předané práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVAZENÍ PODSYPU Z KAMENIVA FR. 4-8mm
- POCLADKA ŽÁHKOVÉ ŽLAZBY + ZABEZPEČENÍ (LEVA STRANA VE ŠHERU STANICENÍ) KM 15,010 - 14,990

Místo zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyved.

50103

Datum: 15. 9. 2021 Den týdne: ST

Místodělové středisko: 811/1234 Název akce: M/102 HR. HL. H. PRAHY - ŠECHOVICE, REKONSTRUČNÍ, ETAPA 4.

Teplota: 14°C, 21°C POLOJASNO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUŘENSKÝ, PETR SKUČA, PAVEL ŽALHA,
JIRÍ LUKES, PATRIK LEHEČKA

Mechanismy: KRAMMER ŹELNÍ NAKLADAC, MOTOROVÁ ŽEZACÍ PARIKNER

Materiál: KAMENIVO PR. 4-8 mm, ŽÁHKOVÁ ŽLÁZBA

Nástroje:

Výkonové práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PROVEDENÍ PODSYPU Z KAMENIVA PR. 4-8 mm
- POLOŽKA ŽÁHKOVÉ ŽLÁZBY + ŽABEZÁNÍ (PRÁVA STRANA VE SMĚRU STANICENÍ) LH 14, 960-14, 940
- BEZPEČNÍ PŘEDPŘÍPRAVUJÍCÍM BEZPEČNÍM ÚKROU (BOCHRANĚNÍ)

Zástupce investora (TI):

Podpis stavě

50103

Datum: 17.9.2021 Den týdne: Pá

Výzvadové středisko: 851/2008 Název akce: N/KA HE. HL. H. PRÁNY - STĚCHOVICE, REKONSTRUČE, ETAPA II.

Teplota: 13°C - 21°C POLOJASNO

Pracovní doba: 7^h - 16^hPracovní přestávka: 11^h - 12^hPracovní (jména a příjmení): DENĚK EDUENSKÝ, PĚTR SLUKA, PAVEL ZLATA,
JIRÍ LUKAŠ, PAVEL LEHEČKA, JAROSLAV ŠTĚPĚK

Mechanismy: KRAHMER ŮZERNÍ NAKLADAC, HODOROVÁ ŽEZAČKA PARTNER

Materiál: KATEKIVO PE 4-8 mm, ZAHLEVOVÁ DLAŽBA, ŽELEZOBETONOVÉ
OPRAVY, ŠPÁT

Nástřky:

Ukončené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVEDENÍ PODSYPU POD ZAHLEVOVOU DLAŽBU Z KATEKIVA PE 4-8 mm
- POCLEBA ZAHLEVOVÉ DLAŽBY + ŽELEZOBETONOVÉ (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVČENÍ) KM 14,990 - 15,000
- POCLEBA ŽELEZOBETONOVÝCH OPRAV DO ŽELEZOBETONOVÉHO LOŽE

Zástupce investora (TI):

Podpis stavbyve

SO 103

Datum: 16.9.2021 Den týdne: CT

Mladové středisko: 841/1602 Název akce: 11/02 HR. HL. H. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

časť: 18°C, 19°C ZATĚŽENO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTENSKÝ, PETR ŠULKA, PAVEL BLAHA,
JIRÍ LUKES, PATRIK LEHEČKA

Mechanismy: 1. ZATĚŽENÍ OZVENI NAKLADACÍ, MOTOROVÁ REZÁNÍ PARTNER

Materiál: KAMENIVO PR 4-8mm, ZATĚŽOVÁ DLAŽBA, ZAHROBNÍ BĚŽONOVÉ
OPRAVY/OT, BĚŽON

Půlky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PROVEDENÍ PODSYPU Z KAMENIVA PR. 4-8mm
- POELADBA ZATĚŽOVÉ DLAŽBY + ZAHROBNÍ (PRAVA STRANA VE SMĚRU STAVIČENÍ) 14,140 - 14,440
- POUŽITÍ DO VLADČENÍCH OBERG (ZAHROBNÍ) DO BĚŽONOVÉHO LOŽE

Pro zástupce investora (TI):

Podpis stavbyvedou

SO 103

Datum: 11. 9. 2021 Den týdne: SO

Místní středisko: 84/2524 Název akce: 11/102 NR HL 1. PRAHY - STĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, STÁPA I

Pčasť: 10°C - 19°C POLOJASNO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰Pracovní přeslávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): EDUARD KOURESKÝ, PETR SLUKA, PAVEL ZLÁTKA, JIŘÍ LUKAŠ,
PABRIL LEHNEDEA, JAROSLAV PÁDĚK

Vstehismy: KRAMERŮV ČERNÝ NAKLADÁK, MOTOROVÁ REZACE PÁRINEC

Materiál: KAMENIVO FR 4-8 mm, ZÁHKOVÁ DLAŽBA

Zkoušky:

Převzuté práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVEDENÍ PODSYPU Z KAMENIVA FR 4-8 mm
- POKLÁDKA ZÁHKOVÉ DLAŽBY + ZABĚRAČNÍ (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANICE) KM 15,000 - 15,020

Podpis zástupce investora (TD)

Podpis stavbyři

S0103

Datum: 20.9.2021 Den týdne: PO

Skladové středisko: 841/2002 Název akce: III/102 HR HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II

Přesah: 7°C, 16°C ZATAŽENO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOVENSKA, PĚTR SUDLA, PAVEL JIŘÁK,
JIRÍ LUKES, PATRIK LEHEČKA

Mechanismy: KRATHER OCEMI NALCADO, MOTOROVA VEZACA PARTNER

Materiál: KAMENIVO FR 4-8mm, ZAHROVA' DLAŽBA

Zaušky:

Zavedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PLOVADĚNÍ PODSYPU Z KAMENIVA FR. 4-8mm
- POKLADKA ZAHROVÉ DLAŽBY + ZARĚZÁNÍ (PRAVA' STRANA VE SMĚRU STANICE) KM 15,020 - 15,040

Zástupce investora (TDI):

Podpis stavby

S0103

Datum: 21.9.2021 Den týdne: ÚT

Řídicí středisko: 841/26AC Název akce: III/02 HR. VL. H. PRAHY - STŘECHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Mst: 6°C, 16°C POLOVASNO

rovní doba: 4°C - 18°C

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰řivníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUBEK, PETR SLUKA, PAVEL JALHA, JIŘÍ LUKAŠ,
PATRİK LEHEČKA

řismy: KRAMER ČELNÍ NAKLADÁČ, MOTOROVÁ PŘÍJAZDA PARDNER

řlá: KAMENIVO FR. 4-8 mm, ŽÁHKOVÁ ŽLÁZBA

řky:

ředené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVAZENÍ PODSYPU Ž KAMENIVA FR. 4-8 mm
- POKLADKA ŽÁHKOVÉ ŽLÁZBY + ŽÁŘENÍ (PRAVA STRANA VE SMĚRU STANIČEN I) KA 15,040 - 15,050

řs zástupce inve

Podpis st

SO 103

Datum: 22. 9. 2021 Den týdne: ST

Středisko: 871/2602 Název akce: 11/102 HR. HL. V. PRAHY - STECHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Věst: 7°C, 14°C ZATAŽENO, OBLAČNO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 9¹⁵ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): EDUARD KOUBEK, PETR SLUHA, PAVEL BLAHA, JIRÍ LUKES,
PATRICK KEMEL

Mechanismy: KRANER ČERNÍ NALADIAČ, HOTOROVA' REZACÍ PARNER

Materiál: KAMENIVO FR. 4-8 mm, ZÁMKOVÁ JLAŽBA

Zkoušky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVEDENÍ PODSYPY Z KAMENIVA FR. 4-8 mm
- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ JLAŽBY + ZARÉZÁNÍ (PRAVA STRANA VE
SMĚRU STANICE) KH 15,050 - 15,040

Za zástupce investora (

Podpis stavby

SO103

Datum: 23. 9. 2001 Den týdne: čtKódové středisko: 8M/26AC Název akce: 11/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTECHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.Čas: 7⁰⁰, 19⁰⁰ POLOVNANOPracovní doba: 7⁰⁰ - 19⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTENSKÝ, PĚTR SLUKA, PAVEL BLAHA, JIŘÍ LUKAŠ,
PATRIK LEHEČKACharakteristika: KRAHMER ČELNÍ NAKLADAC, MOTOROVÁ ŘEZACKA PARTNERMateriál: KAMENIVO FR 4-8mm, ZAHROVÁ DLAŽBA

Poznámky:

Převzete práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVEDENÍ PODSYPU Z KAMENIVA FR 4-8mm
- POKLADKA ZAHROVÉ DLAŽBY + ZADĚŽANÍ (PRAVÁ STRANA VE SHERU STANIČENÍ) KH 15,040 - 15,090

Zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyve

SO 103

Datum: 24. 9. 2021 Den týdne: PÁ

Výstavové středisko: P1/126AC Název akce: II/102/102.HL.H. PRAHY - STŘEHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Teplota: 9°C 18°C ZATAŽENO

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTENSKÝ, PETR SLUKA, PAVEL BLAHA,
JIŘÍ JUREŠ, PATRIK LEHEČKA

Mechanismy: KRAMER ČEZNI NAKLADAC, MOTOROVÁ ŘEZAČKA PARTNER

Materiál: KAMENIVO FR 4-8 mm, ŽÁHKOVÁ DLÁŽBA

Zušky:

Vykonané práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PROVÁDĚNÍ PODSYPU Z KAMENIVA FR 4-8 mm
- POKLÁDKA ŽÁHKOVÉ DLÁŽBY + ZAŘEŽÁNÍ (PRAVÁ STRANA VE ŠHERU STANICE NI) 15,090 - 15,110

Pro zástupce investora (TI)

Podpis stavbyvedoucí

SO 103

Datum: 30.9.2021 Den týdne: OT

Výškové středisko: 841/260C Název akce: 11102 NR HL. N. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA I.

teplota: 5°C, 14°C POLOVA-SNO

pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): OLEH RUCHLA, ONDŘEJ HANZLÍČ, VASYL VLAD, MYCHAÍLO CHENDRY, JIŘÍ ZUČEK

mechanismy: PRAHNER OZEČNÍ NAKLADAC

materiál:

početky:

určené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DVAŽBY LH 14,990 - 14,960 (LETOŠÍ PRÁVA KE PRÁVĚM PRÁVNÍKŮ) + OČIŠTĚNÍ A VYČIŠTĚNÍ NA PALETY
- VÝKLAD VYKONÁVATELŮ

30.9.2021
 11102/ SO 103 DUSKO V LH 14,990 - 14,960 SN
 LETOŠÍ PRÁVA KE PRÁVĚM PRÁVNÍKŮ KE ČIŠTĚNÍ MŘEZŮ
 OČIŠTĚNÍ KONTAKTACE KÚŘÍ STŘEŠNÍMÍ SAMU OZEČNÍ
 VYKONÁVATELŮ PRÁVA (VYKONÁVATELŮ PRÁVA) + OČIŠTĚNÍ PRÁVA
 V OČIŠTĚNÍ PRÁVA PRÁVA V OČIŠTĚNÍ PRÁVA PRÁVA
 9 PRÁVA, PRÁVA PRÁVA PRÁVA PRÁVA PRÁVA
 PRÁVA PRÁVA PRÁVA PRÁVA PRÁVA PRÁVA PRÁVA
 PRÁVA, PRÁVA PRÁVA PRÁVA PRÁVA

Pro zástupce investora (TI)

Podpis stavbyve

BO 103

Datum: 4.10.2027 Den týdne: PO

Křídlové středisko: 371/3620J Název akce: MNOU MO. HL. H. PRATT - STRAHOVSKÉ, DECONSTRUCTION, II. STÁVA

časť: OBKROU +1PC, +1PC, +22PC

Pracovní doba: 300 - 1720

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): ALEX RUCKLA, ANDRÉJ HANUŠEK, PROKOPIJ ESIPENK,
MARTIN KLAD, PAVEL ŠEVKA, JIŘÍ LUKÁČ

Mechanismy: VISO, DEKOR JAZA, KROKOVÉ ČERNÉ KVALITATIVNĚ, EL. CENTRÁLA,
SALVOX, EL. VOVO MILIT, DEKOROVANÉ POKRYTÍ

Stavba: Přístaví stavba, PRÁZE,

Číslo:

Ukázané práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):
- odstranění stávajícího uložení číselné
části u objektu vzhledem k požadavkům v křižovatce ulic
KROKOVÉ A PRÁZE + ODVOZOVÁNÍ, BEZPEČNÉ PRÁZE
AŽ ODČINNÉ ŽIV
- odstranění stávajícího betonového základu + odvození
odčinné hrubé
- odstranění odvození betonové základy + odstranění +
práze betonové základy odvození hrubé
- ÚČELO ODVOZOVÁNÍ

Zástupce investora (TD)

Podpis stavbyved

SO 102

Datum: 7. 10. 2027 Den týdne: ÚT

Místové středisko: SO 102 Název akce: 11102 HR. IV. 17. JAHN - ŠKOLNÍHO, PRIZONSKÉ ULICE, I. ETAPA

Teplota: 0, 18°C, 19°C, 20°C

Pracovní doba: 9⁰⁰ - 17³⁰

Pracovní přestávka: 11³⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): JATEL RUKA, JAROSLAV ŠÍPSE, JIŘÍ LUBES, YARIL VLAB,
DANĚL HODULÍK, JYK MĚL CHANDER

Mechanismy: M. JAHN, 10130A 9 JAHN ŠKOLNÍHO, 1180. DESKA STAV,
PRIZONSKÉ PRIZONSKÉ

Stavba: 11102 HR. IV. 17. JAHN (BEZVÁKOVÉ PŘÍKOPY), PRIZONSKÉ,
PRIZONSKÉ

Zkušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):
- provedení měření výškových bodů
v desce příkopů v PRIZONSKÉ ULICI
MĚŘENÍ A PLOŠNÍ ZASTAVENÍ DÍLCŮ + OPAŘENÍ
DŘEVNÝCH PŘÍKOPŮ V KM 14,940 - 14,960
- provedení měření výškových bodů + OPAŘENÍ +
MĚŘENÍ PLOŠNÍ DŘEVŮ (KM 14,940 - 14,960 - LEVÁ STĚNA)
- VÝKON STAVBY

Místo zástupce investora (TE)

Podpis sta

Jo 103

Datum: 7.10.2021 Den týdne: ČT

Místo středisko: P1102, Název akce: V1101 PR. HL. 11. PRÁH - PŘEMĚNA, ÚSTAVNĚNÍ, ÚSTAVNĚNÍ

čas: 08:00 - 13:00, 17:00, 18:00

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovní doba: 8:00 - 13:00

zaměstnanci (jména a příjmení): JIŘÍ HUBER, PĚTR PAVLA, JAROSLAV PÍTEK, OLGA BUCHTA, ANDRŠ HANŠLÍK, KOTLÍK

mechanizmy: BOP - STAVNÍ VYUŽITÍ, 1100, 0502A 1020, 0502A 1020

materiál: STAVNÍ VYUŽITÍ, 1100 PR. 02 mm

poznámky:

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - POUŽITÍ STAVNÍ VYUŽITÍ + ÚSTAVNĚNÍ + BOP PŘEMĚNÍ + POUŽITÍ STAVNÍ VYUŽITÍ (KOH 14,990 - 14,960 - LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANICE)

Podpis zástupce investora (

Podpis stavb



**II/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE,
REKONSTRUKCE, ETAPA II.
Technický dozor stavby**

Naše značka: 196/19-120/VM/22
Vaše značka

Vyřizuje: M. Valenta
Tel

e-mail
Datum: 10. 6. 2022

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 11 SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi.

Zhotovitel stavby dne 12. 5. 2022 předložil TDS doplněný návrh ZBV č. 11 SO 103 (103/6) Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi.

Do návrhu ZBV byly zapracovány změny oproti PDPS.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 11 (verze 3) SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi. (Předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zidky u křižovatky Hlavní a Školní).

Položky oceněného soupisu prací SO 103 (103/6) budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených měřeními a záznamy ve stavebním deníku.

Na vědomí:
Ing. Milan Fiala
Ing. Šimek

Alice Pavlikova

Od: Ptáček Lukáš, Ing
Odesláno: úterý 30. srpna 2022 16:44
Komu: an Fidler; Alice Pavlikova; Karel Simek; Miroslav Valenta;
Dvoráček David Ing.; Balcar Ondřej, Ing.
Předmět: II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II - ZBV č. 11

Dobrý den,

na základě smlouvy o poskytování služeb číslo S-832/00066001/2022 byla provedena technická asistence v rámci ZBV č. 11 stavby II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.

V předloženém ZBV (ke stažení z portálu AspeHub – odkaz přijde v samostatném e-mailu) jsou již zpracovány jednotlivé připomínky a je v souladu se směrnici R-Sm-36.

V případě potřeby se na mně neváhejte dále obrátit.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Lukáš Ptáček

Ředitel divize Technická asistence

Mobi

E-mai

IBR Consulting, s. r. o.

Sokolovská 352/215, Praha 9 190 00

Tel./fax

www.ibr.cz

