




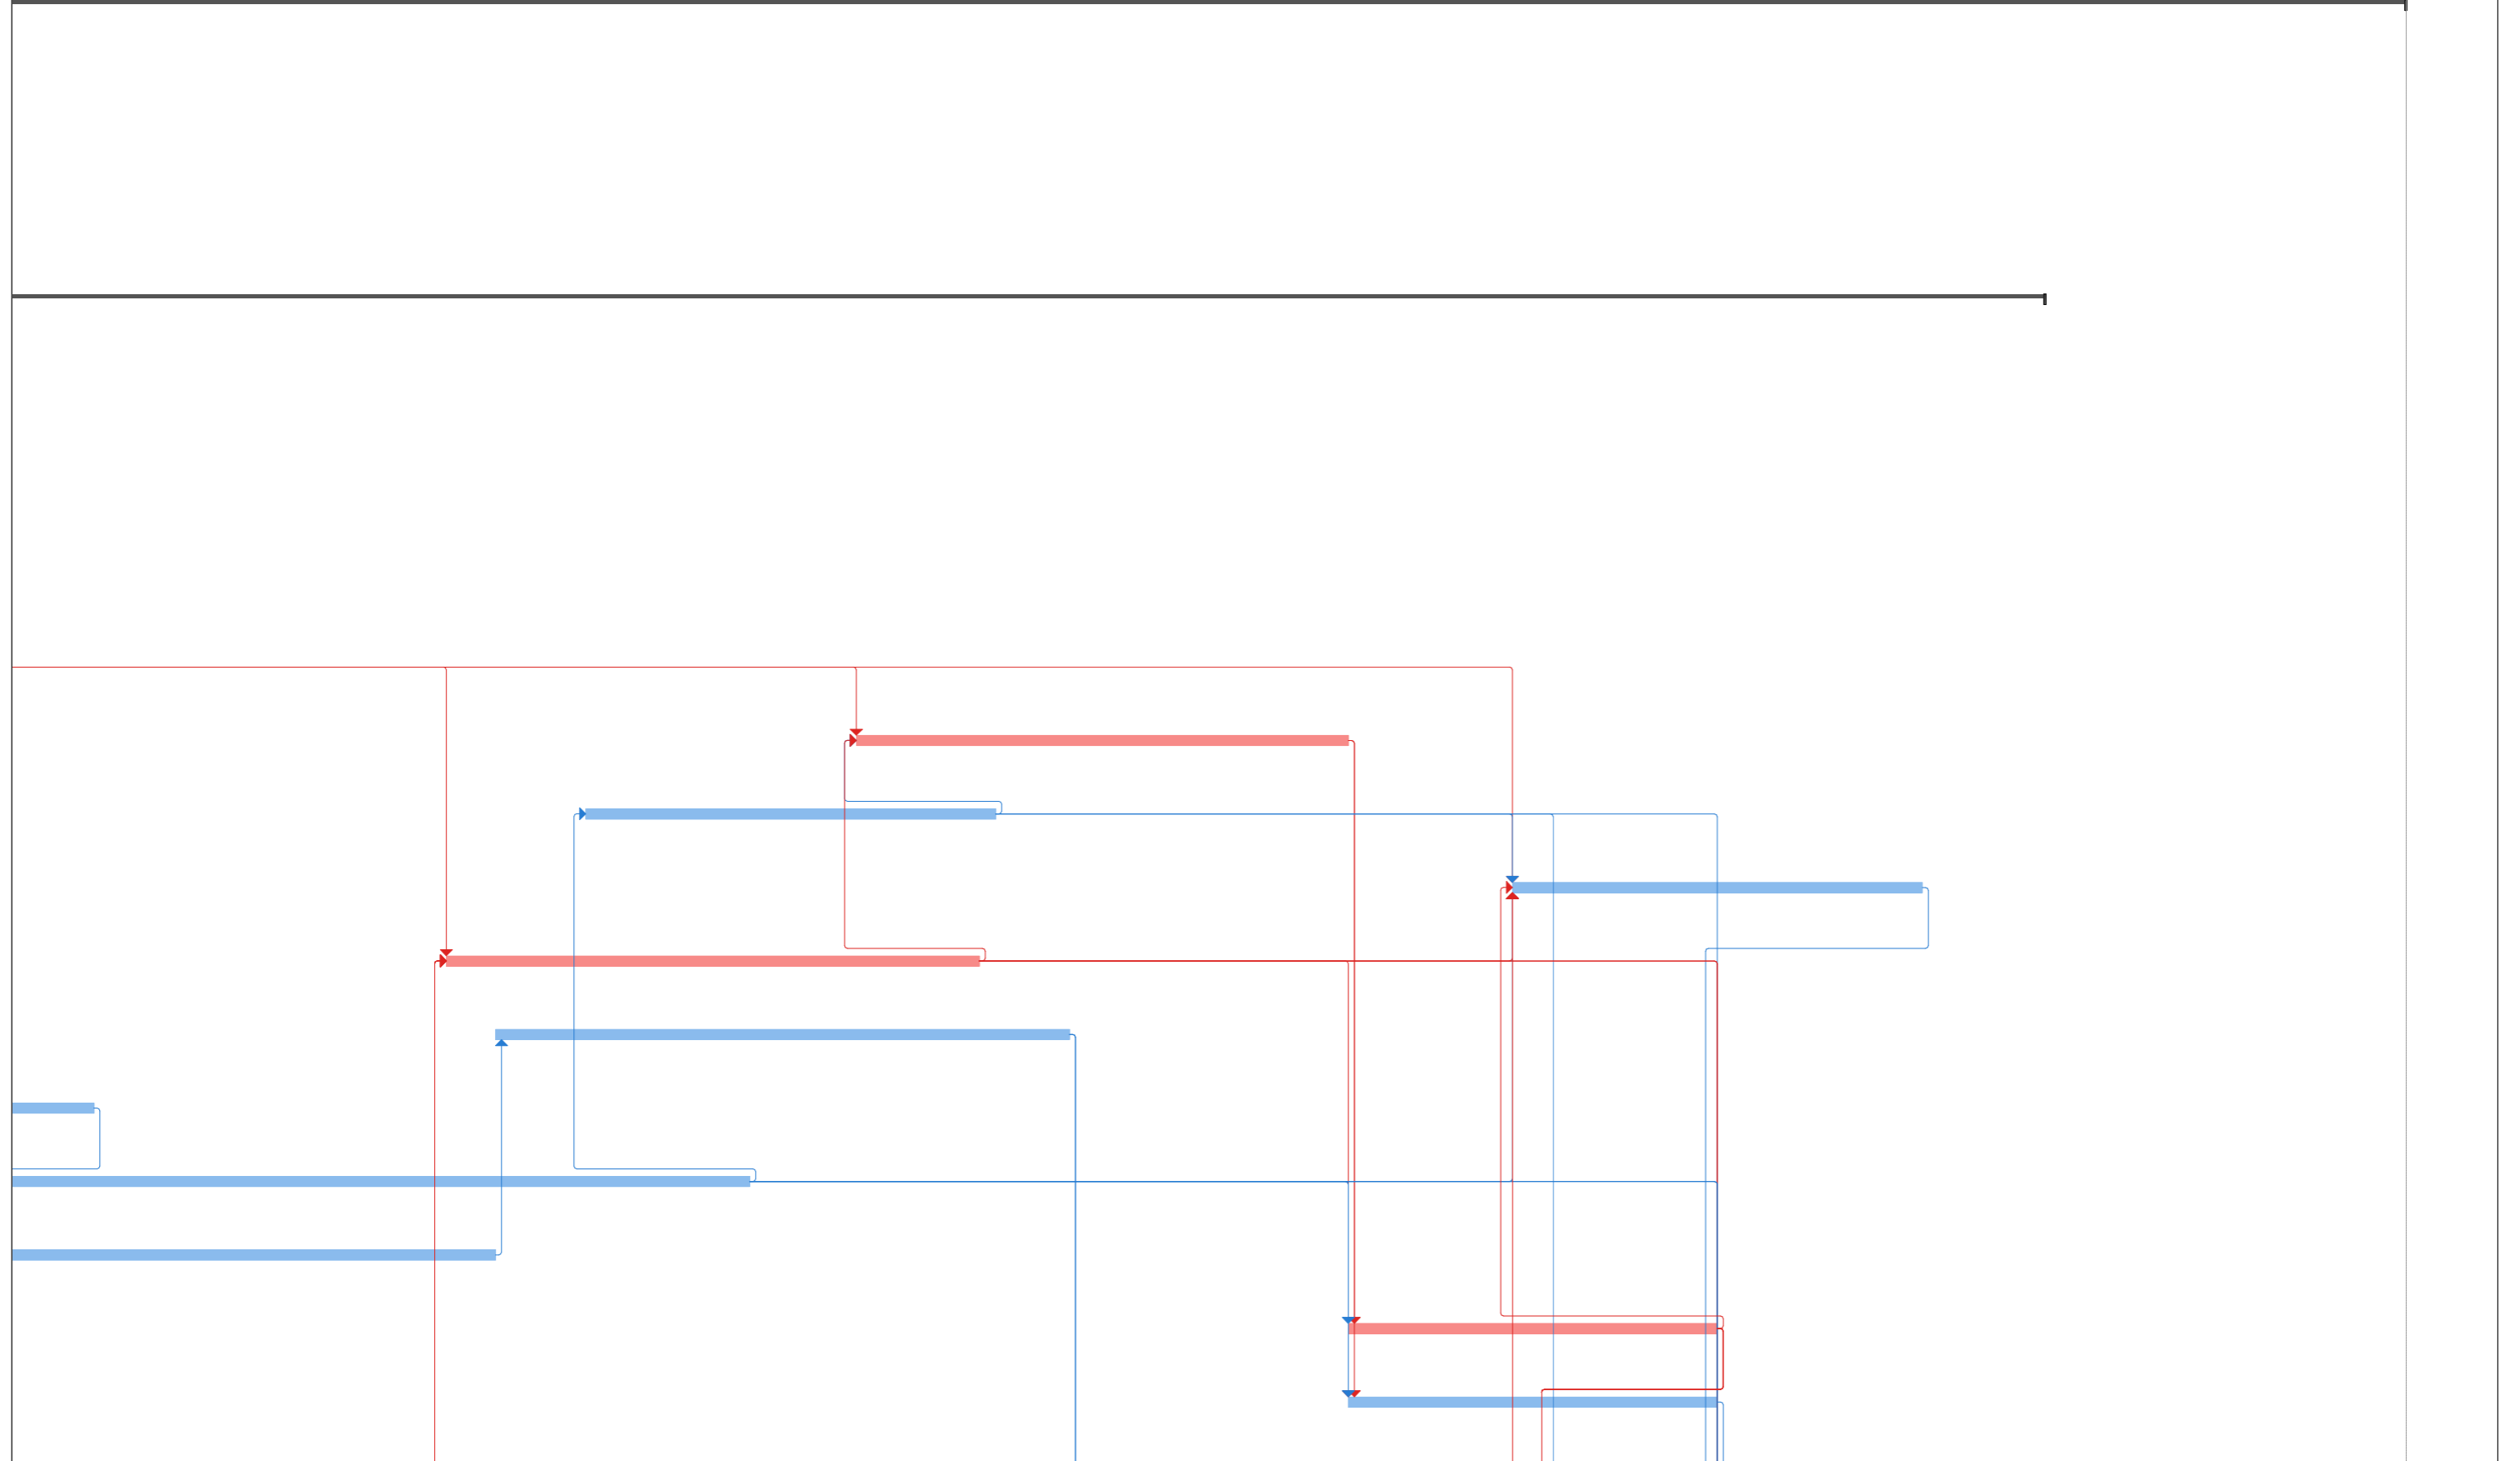
Projekt: Project\_vzor\_práce31dn  
Datum: 11.08. 23

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Pouze s datem dokončení		Konečný termín		Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Kritický		
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Vnější milník		Kritické rozdělení		
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější souhrn		Vnější souhrn		Průběh		

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																												
					září T-3	T-2	T-1	T1	T2	říjen T3	T4	T5	T6	listopad T7	T8	T9	T10	prosinec T11	T12	T13	T14	T15	leden T16	T17	T18	T19	únor T20	T21	T22	T23	březen T24	T25
21	Osazení vnitřních dveřních křídel	40 dny	09.11. 24	18.12. 24																												
22	Malby a nátěry	40 dny	09.11. 24	18.12. 24																												
23	<b>TZB, elektro</b>	<b>249 dny</b>	<b>30.03. 24</b>	<b>03.12. 24</b>																												
24	ZTI	79 dny	30.03. 24	16.06. 24																												
25	ZTI - kompletace	45 dny	20.10. 24	03.12. 24																												
26	vytápění + chlazení	79 dny	30.03. 24	16.06. 24																												
27	vytápění + chlazení - kompletace	45 dny	20.10. 24	03.12. 24																												
28	VZT	79 dny	30.03. 24	16.06. 24																												
29	VZT - kompletace	45 dny	20.10. 24	03.12. 24																												
30	Elektro - silno, slabo, MaR	79 dny	30.03. 24	16.06. 24																												
31	Elektro - silno, slabo, MaR - kompletace	45 dny	20.10. 24	03.12. 24																												
32	<b>Venkovní objekty</b>	<b>75 dny</b>	<b>22.08. 24</b>	<b>04.11. 24</b>																												
33	Komunikace a zpevněné plochy	60 dny	22.08. 24	20.10. 24																												
34	Sadové úpravy	60 dny	22.08. 24	20.10. 24																												
35	Dopravní řešení	15 dny	21.10. 24	04.11. 24																												
36	<b>Dokončení díla</b>	<b>73 dny</b>	<b>20.11. 24</b>	<b>31.01. 25</b>																												
37	Předběžná kontrola a komplexní zkoušky	40 dny	20.11. 24	29.12. 24																												
38	Odstraňování vad a nedodělků	40 dny	20.12. 24	28.01. 25																												
39	Úklid stavby	30 dny	01.01. 25	30.01. 25																												
40	Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků	1 den	31.01. 25	31.01. 25																												


Projekt: Project\_vzor\_práce31dn  
Datum: 11.08. 23

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín		Průběh ručně zadaného úkolu	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Kritický			
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Kritické rozdělení			
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník		Průběh			



Projekt: Project\_vzor\_práce31dn  
 Datum: 11.08.23

Úkol	Souhrn projektu	Ruční úkol	Pouze zahájení	Konečný termín	Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení	Neaktivní úkol	Pouze s dobou trvání	Pouze s datem dokončení	Kritický	Průběh
Milník	Neaktivní milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější úkoly	Kritické rozdělení	Průběh
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Ruční souhrn	Vnější milník	Průběh	Průběh

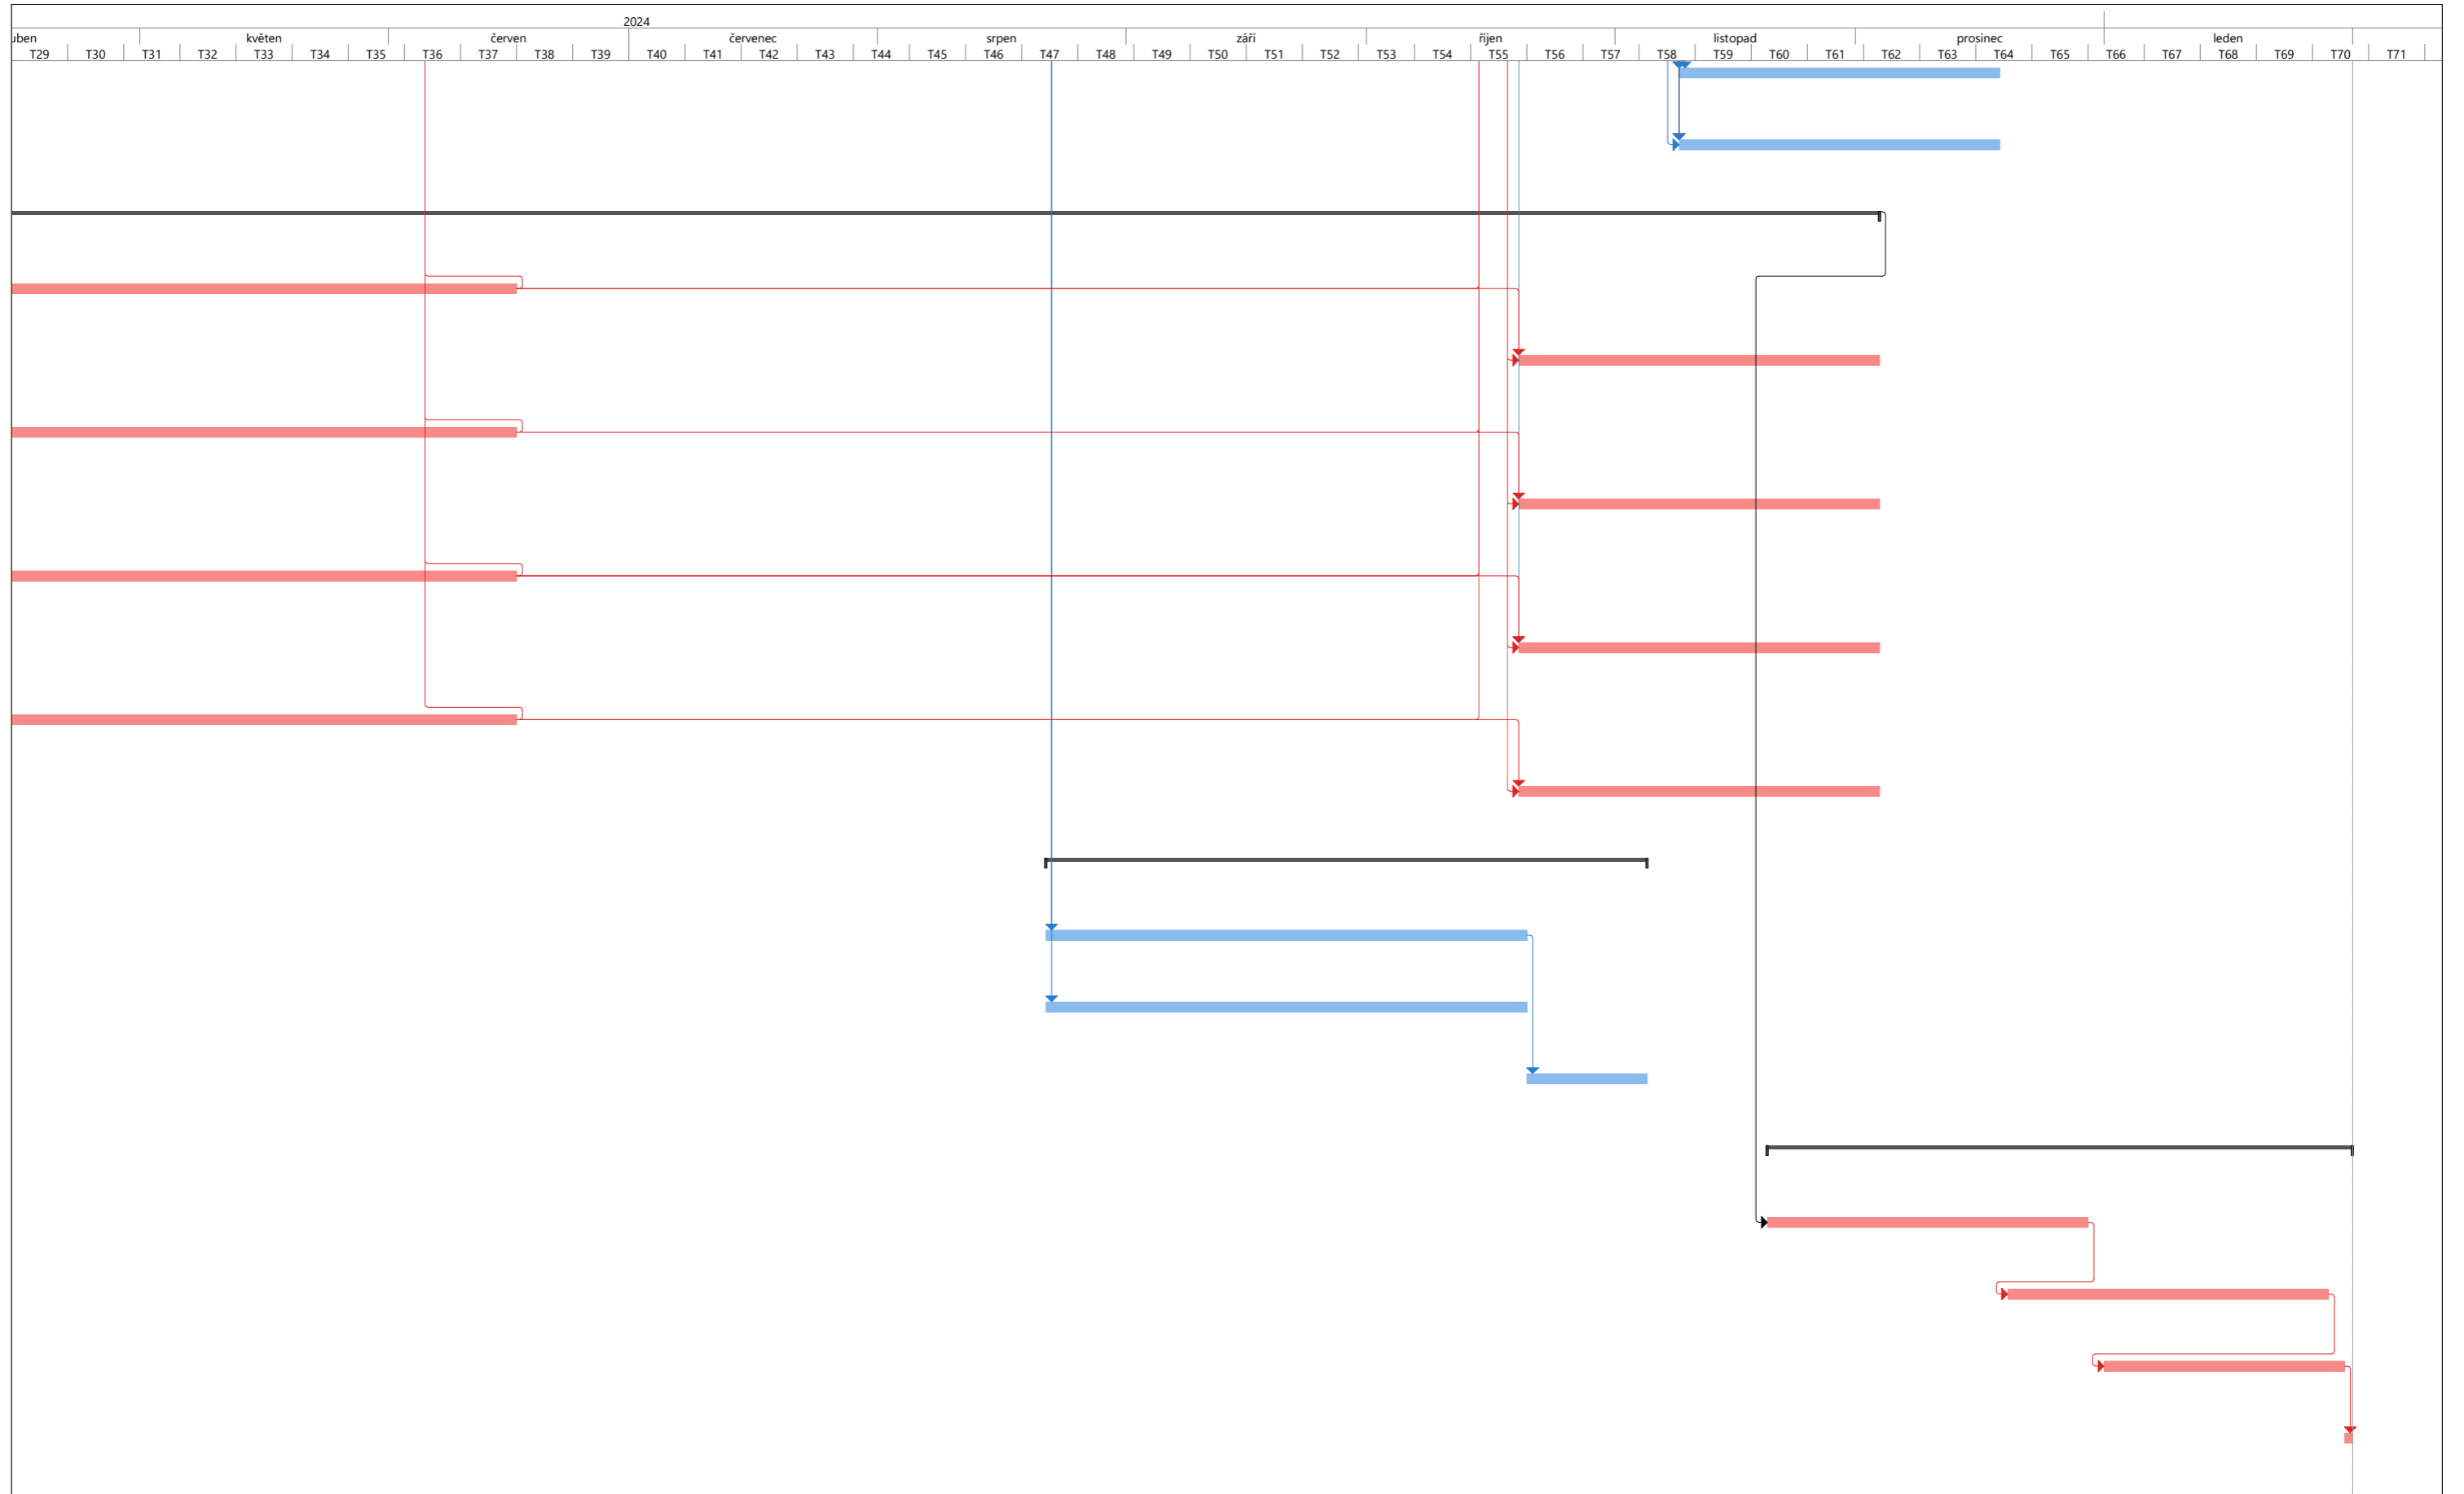

Projekt: Project\_vzor\_práce31dn  
Datum: 11.08. 23

Úkol	Souhrn projektu	Ruční úkol	Pouze zahájení	Konečný termín	Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení	Neaktivní úkol	Pouze s dobou trvání	Pouze s datem dokončení	Kritický	Průběh
Milník	Neaktivní milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější úkoly	Průběh	
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Ruční souhrn	Vnější milník		
