


Harmonogram výstavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň HI. n." k 23.10.2023

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Ř	L	P	Půlrok 1, 2024	Ú	B	D
1	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň HI. n.	893 dny	29.04. 21	28.09. 24							
2	zahájení stavby	1 den	29.04. 21	29.04. 21							
3											
4	Pracovní záběr N2 (sloučené původní záběry 2, 3, 4) - pouze sdělovací místnost 1.PP	216 dny	06.03. 23	31.12. 23							
5	sdělovací místnost 1.PP										
6	stavební část	194 dny	06.03. 23	30.11. 23							
7	technologická část	166 dny	15.05. 23	31.12. 23							
8	Dokončení kompletního pracovního záběru N2, včetně provedení přejímky (počátek běhu záručních lhůt prací v rozsahu záběru 2)	1 den	31.12. 23	31.12. 23	◆ 31.12.						
9											
10	Pracovní záběr N3 (původní záběr 5) - rekonstrukce východní budovy (A) včetně střechy	588 dny	01.11. 21	31.01. 24							
11	Budova A - 1.PP										
12	sanace zdiva	420 dny	02.05. 22	08.12. 23							
13	zámečnické konstrukce	523 dny	31.01. 22	31.01. 24							
14	vzduchotechnika, chlazení - hrubé rozvody	414 dny	02.05. 22	30.11. 23							
15	omítky	370 dny	18.07. 22	15.12. 23							
16	sádkartonové konstrukce - podhledy, příčky	392 dny	01.07. 22	31.12. 23							
17	výplně otvorů	299 dny	10.10. 22	30.11. 23							
18	podlahové krytiny	265 dny	12.12. 22	15.12. 23							
19	obklady, dlažby	289 dny	24.10. 22	30.11. 23							
20	malby, nátěry	321 dny	10.10. 22	31.12. 23							
21	kompletační práce - vzduchotechnika, chlazení, ZTI, ÚT, silnoproud, slaboproud, M+R	286 dny	28.11. 22	31.12. 23							
22	informační a orientační systém	458 dny	02.05. 22	31.01. 24							
23	Budova A - 1.NP (vyjma historických sálů a salóneků)										
24	dokončení stavebních prací	1 den	08.12. 23	08.12. 23	◆ 08.12.						
25	Budova A - 2.NP										
26	dokončení prací včetně odstraněných vad a nedodělků nebránících užívání	1 den	15.11. 23	15.11. 23	◆ 15.11.						
27	Budova A - 3.NP										
28	dokončení prací včetně odstraněných vad a nedodělků nebránících užívání	1 den	11.12. 23	11.12. 23	◆ 11.12.						
29	Budova A - střecha, fasáda										
30	tesařské konstrukce, krytina, opracování detailů kolem světlíků a výlezů	425 dny	25.04. 22	08.12. 23							
31	vzduchotechnika, ZTI, ÚT, silnoproud, slaboproud, M+R	385 dny	20.06. 22	08.12. 23							
32	fasáda, definitivní dešťové svody	379 dny	20.06. 22	30.11. 23							
33	hrotový a ochranný systém proti ptactvu	142 dny	22.05. 23	05.12. 23							

Aktualizovaný harmonogram 23.10.2023
Pozn.: "Doba trvání" - v pracovních dnech

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

Harmonogram výstavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň Hl. n." k 23.10.2023

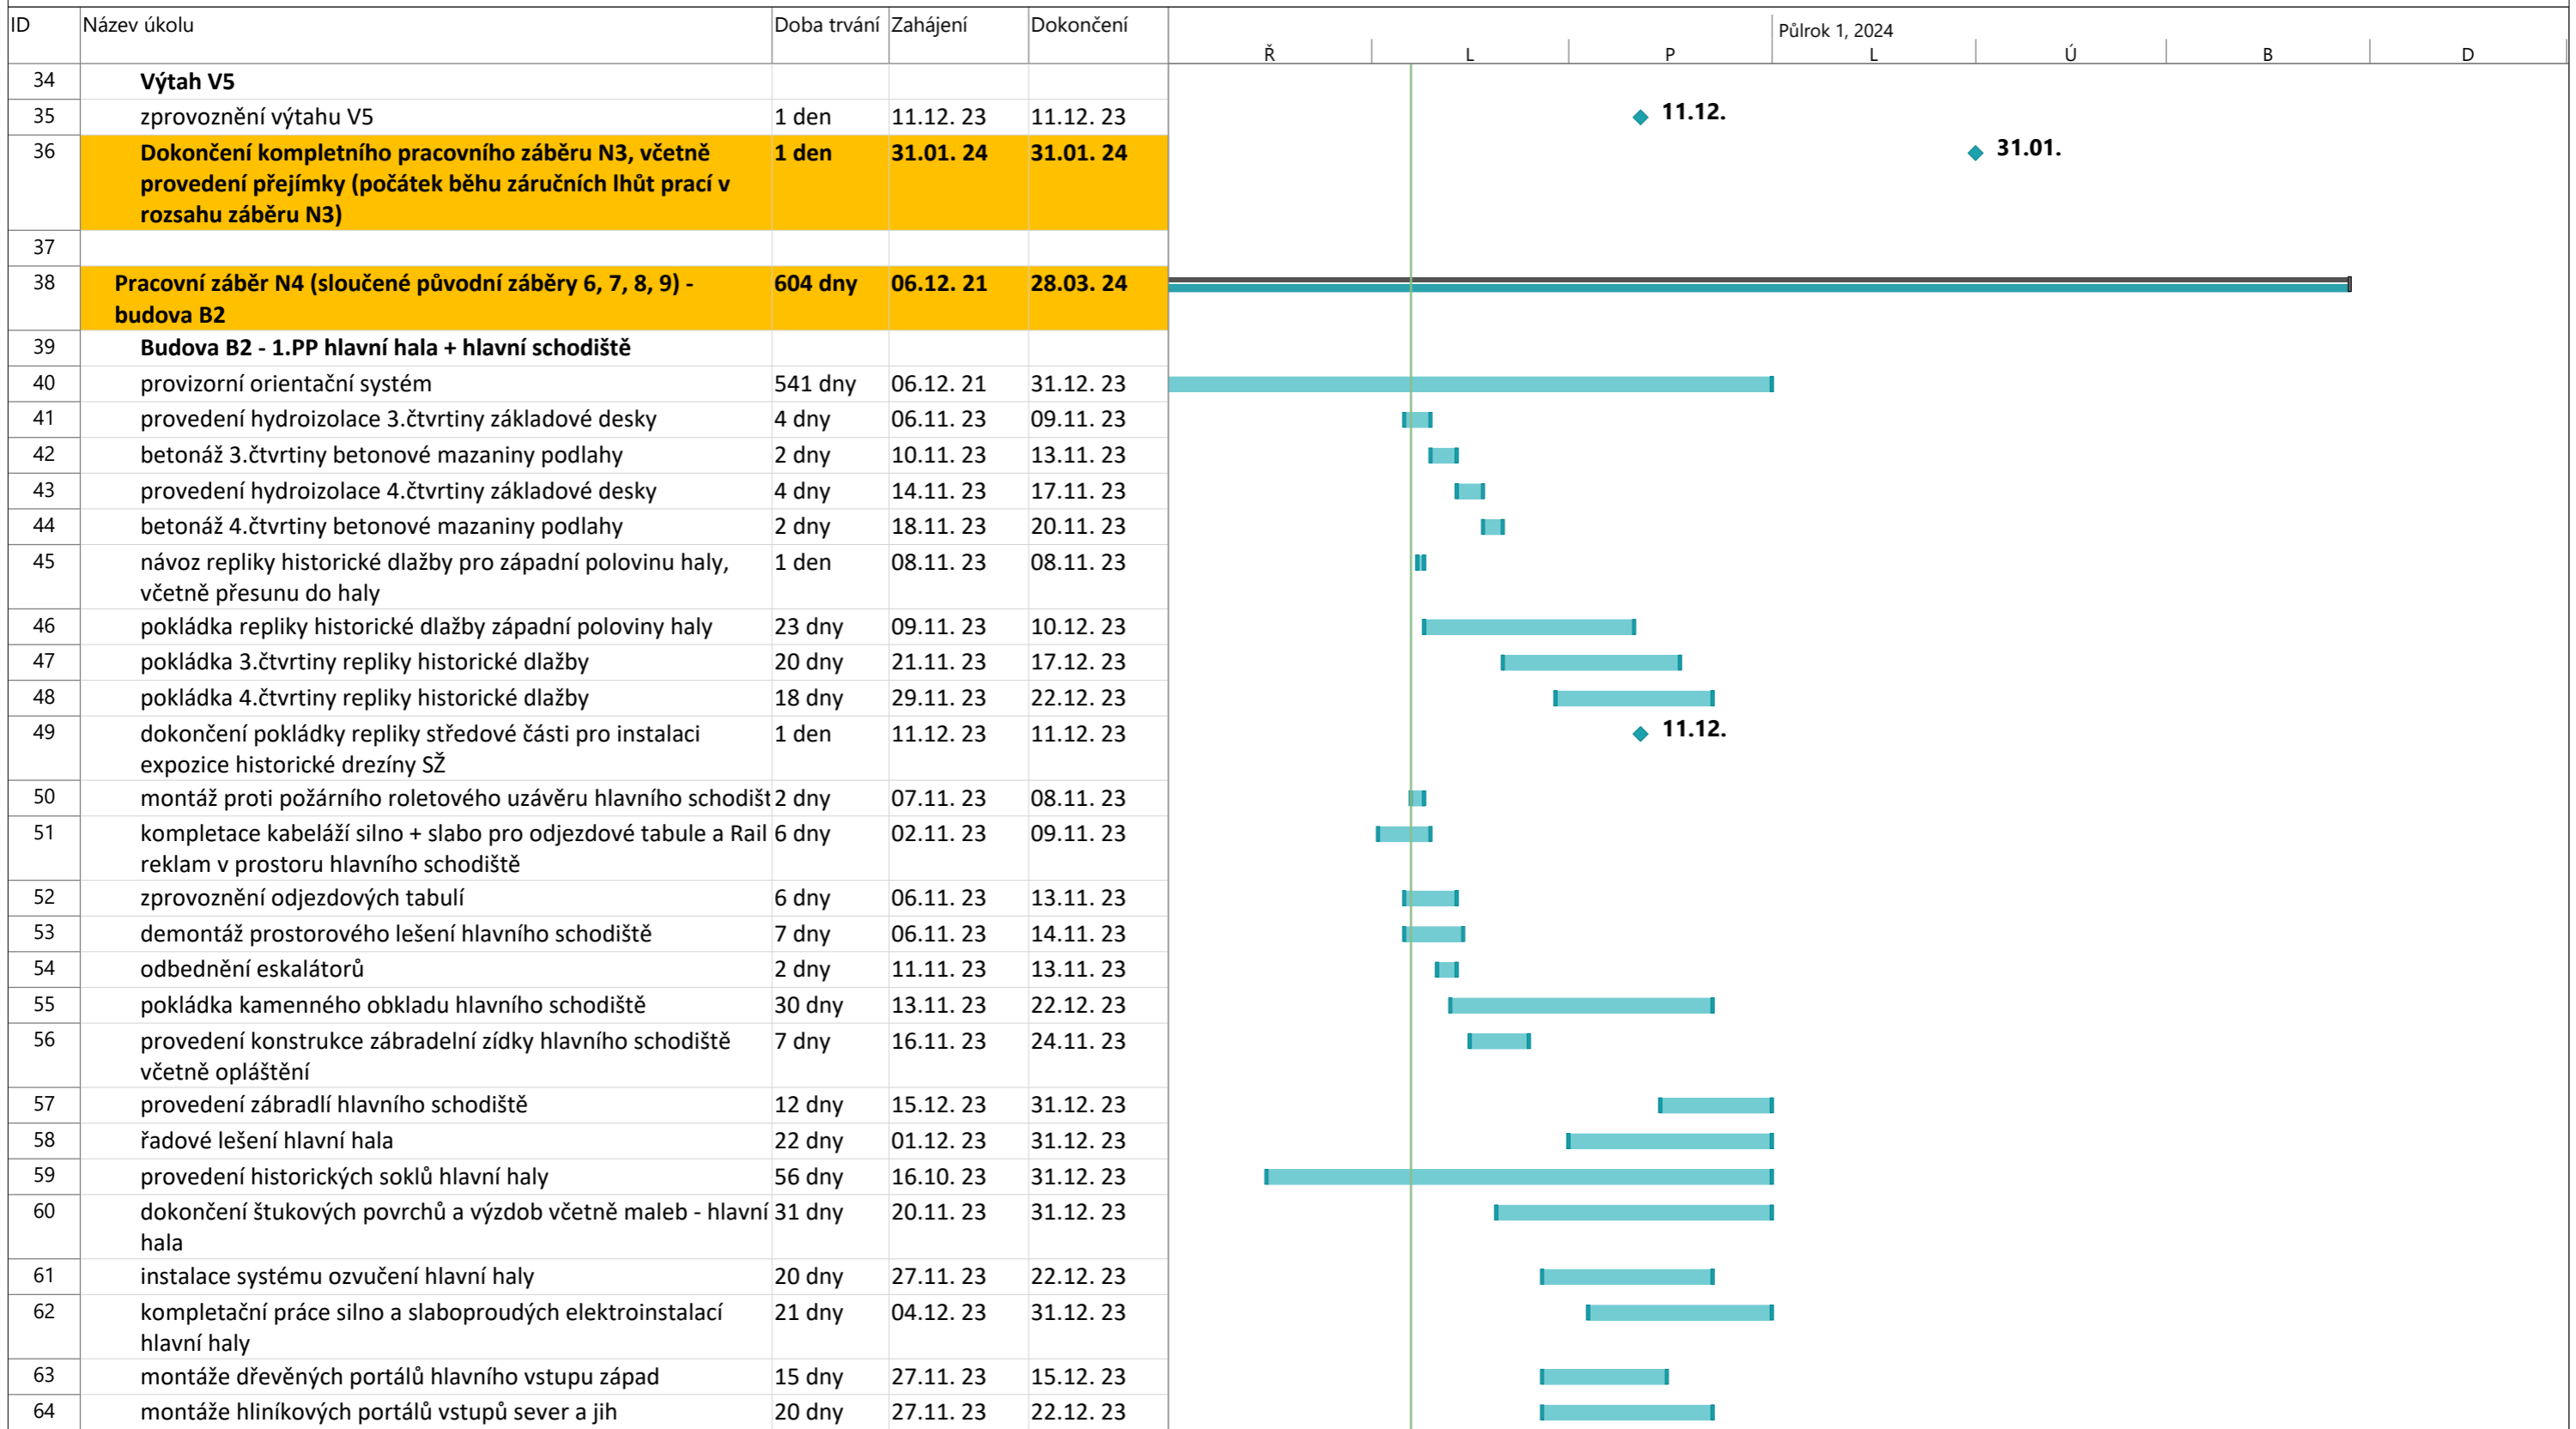

Aktualizovaný harmonogram
23.10.2023
Pozn.: "Doba trvání" - v pracovních dnech

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

Harmonogram výstavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň HL. n." k 23.10.2023

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Ř	L	P	Půlrok 1, 2024	L	Ú	B	D
65	provedení protipožární výplně obloukové lunety v 1.NP před výtahy V1, V2	15 dny	04.12. 23	22.12. 23								
66	vytažení profilace lunety	14 dny	28.11. 23	15.12. 23								
67	restaurování obrazů v hlavní hale	21 dny	04.12. 23	31.12. 23								
68	restaurování soch hutníka a železničáře v hlavní hale	21 dny	04.12. 23	31.12. 23								
69	instalace památníku v hlavním vstupu západ	10 dny	11.12. 23	22.12. 23								
70	Budova B2 - 1.PP nájemní jednotky											
71	dokončení omítek	23 dny	16.10. 23	15.11. 23								
72	dokončení sádkartonových konstrukcí	55 dny	02.10. 23	15.12. 23								
73	výplně otvorů - hliníkové portály	31 dny	09.10. 23	20.11. 23								
74	výplně otvorů - vnitřní ocelové dveře	16 dny	09.11. 23	30.11. 23								
75	dokončení obkladů, dlažeb	29 dny	23.10. 23	30.11. 23								
76	malby, nátěry	40 dny	30.10. 23	22.12. 23								
77	kompletační práce - vzduchotechnika, chlazení, ZTI, ÚT, silnoproud, slaboproud, M+R	56 dny	16.10. 23	31.12. 23								
78	předání pracovišť nájemních jednotek budoucím nájemcům k provedení vestavků při koordinaci zhotovitele (Společnost nádraží Plzeň)	17 dny	08.11. 23	30.11. 23								
79	informační a orientační systém	436 dny	02.05. 22	31.12. 23								
80	Budova B2 - 1.NP přednostovské sály											
81	provizorní orientační systém	141 dny	04.09. 23	18.03. 24								
82	otlučení omítek	44 dny	12.09. 23	10.11. 23								
83	demontáž podhledů	13 dny	11.09. 23	27.09. 23								
84	vybourání podlah	47 dny	11.09. 23	14.11. 23								
85	provedení betonových mazanin podlah	25 dny	20.11. 23	22.12. 23								
86	hrubé rozvody - vzduchotechnika, chlazení, ZTI, ÚT, silnoproud, slaboproud, M+R	40 dny	27.11. 23	19.01. 24								
87	omítky stěn	50 dny	16.10. 23	22.12. 23								
88	opravy stropů	30 dny	13.11. 23	22.12. 23								
89	provedení zavěšených stropů	30 dny	27.11. 23	05.01. 24								
90	montáž sádrových odlitků	22 dny	08.01. 24	06.02. 24								
91	výroba a montáž sádrových odlitků	46 dny	20.11. 23	22.01. 24								
92	výmalba 2	35 dny	22.01. 24	08.03. 24								
93	montáž truhlářských výplní 2	21 dny	26.02. 24	25.03. 24								
94	montáž parket 2	21 dny	26.02. 24	25.03. 24								
95	kompletace hrubá 2	21 dny	22.01. 24	19.02. 24								
96	kompletace finální 2	10 dny	04.03. 24	15.03. 24								
97	výmalba	18 dny	08.01. 24	31.01. 24								
98	montáž truhlářských výplní	21 dny	29.01. 24	26.02. 24								
99	montáž parket	21 dny	29.01. 24	26.02. 24								

Aktualizovaný harmonogram 23.10.2023
 Pozn.: "Doba trvání" - v pracovních dnech

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

Harmonogram výstavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň HL. n." k 23.10.2023

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Ř	L	P	Půlrok 1, 2024	L	Ú	B	D
100	kompletace hrubá	15 dny	15.01. 24	02.02. 24								
101	kompletace finální	11 dny	05.02. 24	19.02. 24								
102	kompletační práce - vzduchotechnika, chlazení, ZTI, ÚT, silnoproud, slaboproud, M+R	19 dny	04.03. 24	28.03. 24								
103	Salónky B1											
104	opravy omítek a doplnění	65 dny	30.10. 23	26.01. 24								
105	výmalba	30 dny	08.01. 24	16.02. 24								
106	Sály B1											
107	Opravy omítek	65 dny	30.10. 23	26.01. 24								
108	výmalba	34 dny	15.01. 24	29.02. 24								
109	informační a orientační systém	14 dny	11.03. 24	28.03. 24								
110	Budova B2 - 2.NP											
111	dokončení prací včetně odstraněných vad a nedodělků nebránících užívání	1 den	15.11. 23	15.11. 23								
112	Budova B2 - 3.NP											
113	zámečnické konstrukce	383 dny	15.08. 22	31.01. 24								
114	provětrávaná fasáda	305 dny	17.10. 22	15.12. 23								
115	omítky	325 dny	12.09. 22	08.12. 23								
116	sádkartonové konstrukce - podhledy, příčky	322 dny	15.09. 22	08.12. 23								
117	okenní žaluzie pevných oken	83 dny	09.10. 23	31.01. 24								
118	vnitřní výplně otvorů	321 dny	10.10. 22	31.12. 23								
119	podlahové krytiny	284 dny	30.11. 22	31.12. 23								
120	obklady, dlažby, replika historické dlažby	291 dny	10.10. 22	20.11. 23								
121	malby, nátěry	325 dny	31.10. 22	26.01. 24								
122	kompletační práce - vzduchotechnika, chlazení, ZTI, ÚT, silnoproud, slaboproud, M+R	303 dny	05.12. 22	31.01. 24								
123	informační a orientační systém	455 dny	01.07. 22	28.03. 24								
124	Výtahy V3, V4											
125	zprovoznění výtahů V3, V4	1 den	31.01. 24	31.01. 24								
126	Budova B2 - střechy - velká kopule včetně věžičky, dvě malé kopule											
127	provádění provizorního vodotěsného zakrytí konstrukce velké kopule	423 dny	20.06. 22	31.01. 24								
128	provedení úpravy nové krytiny z měděných šablon velké kopule kolem jižního a severního tympanonu	78 dny	16.10. 23	31.01. 24								
129	provedení klempířských a pasířských konstrukcí plochy velké kopule	383 dny	15.08. 22	31.01. 24								
130	dokončení tympanonů včetně povrchových úprav, klempířských a pasířských konstrukcí	269 dny	20.02. 23	29.02. 24								

Aktualizovaný harmonogram
23.10.2023
Pozn.: "Doba trvání" - v pracovních dnech

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

Harmonogram výstavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň HL. n." k 23.10.2023

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Ř	L	P	Půlrok 1, 2024	L	Ú	B	D
131	provedení definitivního odvodňovacího žlabu včetně tesařské konstrukce žlabu a klempířských konstrukcí podokapních říms velké kopule	261 dny	02.01. 23	31.12. 23								
132	dokončení klempířských prvků v napojení velké kopule na ploché střechy	239 dny	01.02. 23	31.12. 23								
133	dokončení detailů klempířských a pasířských konstrukcí v návaznostech - velká kopule - tympanon - malé kopule - ploché střechy	269 dny	20.02. 23	29.02. 24								
134	Budova B2 - střechy - ploché střechy											
135	provedení kompletních skladeb plochých střech v části B2	374 dny	27.06. 22	30.11. 23								
136	provedení skladeb zelených střech v částech B2	31 dny	20.11. 23	31.12. 23								
137	Fasády - dokončení											
138	západní strana	1 den	08.12. 23	08.12. 23								
139	jižní a severní strana	1 den	08.12. 23	08.12. 23								
140	jižní věžička, severní věžička	1 den	30.11. 23	30.11. 23								
141	východní strana nad rovinou střechy čekárenské haly B1	1 den	22.12. 23	22.12. 23								
142	stěhování pracovníků SŽ do dokončených prostor budovy B2 - 3.NP	43 dny	04.12. 23	31.01. 24								
143	Dokončení kompletního pracovního záběru N4, včetně provedení přejímky (počátek běhu záručních lhůt prací v rozsahu záběru N4)	1 den	28.03. 24	28.03. 24								
144												
145	Pracovní záběr N5 (sloučené původní záběry 10, 11) - budova A historické sály včetně zázemí, budova B1 čekárenská hala, budova C, venkovní zpevněné plochy, mobiliář	274 dny	13.03. 23	28.03. 24								
146	Budova A - historické sály 1 + 2 včetně zázemí											
147	provizorní orientační systém	141 dny	04.09. 23	18.03. 24								
148	demontáže stávajících rozvodů, vyklizení prostor	31 dny	04.09. 23	16.10. 23								
149	bourací práce	50 dny	18.09. 23	24.11. 23								
150	vyzdívky a dozdvívky, překlady	22 dny	02.10. 23	31.10. 23								
151	betonové mazaniny včetně izolačních souvrství	31 dny	16.10. 23	27.11. 23								
152	jádrové vrtání	45 dny	25.09. 23	24.11. 23								
153	hrubé rozvody - vzduchotechnika, chlazení, ZTI, ÚT, silnoproud, slaboproud, M+R	55 dny	09.10. 23	22.12. 23								
154	prostorové lešení	71 dny	20.11. 23	26.02. 24								
155	štuková výzdoba - očištění, opravy, doplnění	61 dny	24.11. 23	16.02. 24								
156	repese světlíků	30 dny	27.11. 23	05.01. 24								
157	montáž okenních výplní	20 dny	27.11. 23	22.12. 23								
158	montáž dveřních výplní	71 dny	20.11. 23	26.02. 24								
159	montáž vzduchotechniky do světlíků	15 dny	27.11. 23	15.12. 23								
160	výmalba	27 dny	01.02. 24	08.03. 24								

Aktualizovaný harmonogram 23.10.2023
Pozn.: "Doba trvání" - v pracovních dnech

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

Harmonogram výstavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň HL. n." k 23.10.2023

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Ř	L	P	Půlrok 1, 2024 L	Ú	B	D
161	kompletační práce - vzduchotechnika, chlazení, ZTI, ÚT, silnoproud, slaboproud, M+R	34 dny	12.02. 24	28.03. 24							
162	pokládka repliky historické dlažby	25 dny	19.02. 24	22.03. 24							
163	provedení dřevěných obkladů	32 dny	12.02. 24	26.03. 24							
164	informační a orientační systém	19 dny	04.03. 24	28.03. 24							
165	Budova B1 - čekárenská hala										
166	provizorní orientační systém	101 dny	14.08. 23	31.12. 23							
167	demontáže stávajících rozvodů, vyklizení prostor	24 dny	15.08. 23	15.09. 23							
168	provizorní opatření - statické zajištění stávajících konstrukcí, zajištění a zakrytí dokončených konstrukcí, celoplošné hydroizolační zajištění podlahy včetně provizorního odvodnění, zřízení pojezdových koridorů	35 dny	15.08. 23	30.09. 23							
169	bourací práce, otlučení omítek	50 dny	04.09. 23	10.11. 23							
170	vyzdívky a dozdívky, překlady	36 dny	02.10. 23	20.11. 23							
171	jádrové vrtání	27 dny	25.09. 23	31.10. 23							
172	nosná konstrukce střechy, ostatní zámečnické konstrukce - výroba, dodávka, montáž	109 dny	03.07. 23	30.11. 23							
173	souvrství střešního pláště, světlík, obklad fasády nad rovinou střechy	38 dny	09.11. 23	31.12. 23							
174	provedení skladeb zelených střech v části B1	21 dny	04.12. 23	31.12. 23							
175	vzduchotechnika, chlazení - hrubé rozvody	6 dny	13.11. 23	20.11. 23							
176	ZTI - hrubé rozvody	74 dny	15.08. 23	24.11. 23							
177	ÚT - hrubé rozvody	6 dny	13.11. 23	20.11. 23							
178	silnoproud, slaboproud, M+R - hrubé rozvody	11 dny	06.11. 23	20.11. 23							
179	omítky	29 dny	07.11. 23	15.12. 23							
180	sádkartonové konstrukce, akustické obklady	31 dny	20.11. 23	31.12. 23							
181	výplně otvorů, keramické obklady	31 dny	20.11. 23	31.12. 23							
182	prosklená podlaha včetně nosné konstrukce a stavebních přípomocí	141 dny	19.06. 23	31.12. 23							
183	keramické dlažby	21 dny	04.12. 23	31.12. 23							
184	malby, nátěry	16 dny	11.12. 23	31.12. 23							
185	kompletační práce - vzduchotechnika, chlazení, ZTI, ÚT, silnoproud, slaboproud, M+R	26 dny	27.11. 23	31.12. 23							
186	strukturní prosklená fasáda včetně sekčních otvírek - výroba, dodávka, montáž	56 dny	16.10. 23	31.12. 23							
187	informační a orientační systém	11 dny	18.12. 23	31.12. 23							
188	Budova C										
189	provizorní orientační systém	274 dny	13.03. 23	28.03. 24							
190	demontáže stávajících rozvodů, vyklizení prostor	76 dny	18.09. 23	31.12. 23							
191	bourací práce, otlučení omítek	86 dny	25.09. 23	22.01. 24							
192	sanace zdiva	43 dny	04.12. 23	31.01. 24							

Aktualizovaný harmonogram
23.10.2023

Pozn.: "Doba trvání" - v pracovních dnech

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

Harmonogram výstavby "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň HL. n." k 23.10.2023

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Ř	L	P	Půlrok 1, 2024	L	Ú	B	D
193	zemní práce pro základové konstrukce a ležaté rozvody ZTI	40 dny	27.11. 23	19.01. 24								
194	základové desky včetně odvětrávané vrstvy podloží	35 dny	11.12. 23	26.01. 24								
195	vyzdívky a dozdivky, překlady	45 dny	11.12. 23	09.02. 24								
196	betonové mazaniny včetně izolačních souvrství	21 dny	15.01. 24	12.02. 24								
197	zámečnické konstrukce	66 dny	04.12. 23	04.03. 24								
198	hrubé rozvody - vzduchotechnika, chlazení, ZTI, ÚT, silno, slabo, M+R	122 dny	01.08. 23	17.01. 24								
199	omítky	20 dny	15.01. 24	09.02. 24								
200	sádkartonové konstrukce - podhledy, příčky	26 dny	08.01. 24	12.02. 24								
201	výplně otvorů - interiérové dveře	24 dny	29.01. 24	29.02. 24								
202	výplně otvorů - exteriérové dřevěné portály	20 dny	20.11. 23	15.12. 23								
203	fasáda	66 dny	02.10. 23	31.12. 23								
204	obklady, dlažby	18 dny	01.02. 24	26.02. 24								
205	malby, nátěry	70 dny	11.12. 23	15.03. 24								
206	kompletační práce - vzduchotechnika, chlazení, ZTI, ÚT, silnoproud, slaboproud, M+R	34 dny	12.02. 24	28.03. 24								
207	informační a orientační systém	34 dny	12.02. 24	28.03. 24								
208	hrotový a ochranný systém proti ptactvu	19 dny	05.02. 24	29.02. 24								
209	úklidy	19 dny	04.03. 24	28.03. 24								
210	Venkovní zpevněné plochy, mobiliář											
211	bourací a zemní práce pro východní zpevněnou plochu u budovy A	51 dny	17.07. 23	25.09. 23								
212	základová deska a dlažba východní zpevněné plochy u budovy	18 dny	04.09. 23	27.09. 23								
213	výměna krytiny zastřešení severního a jižního nástupiště	196 dny	01.06. 23	29.02. 24								
214	demontáž a zpětné doplnění zastřešení částí nástupišť v šíři budovy B1	59 dny	11.12. 23	29.02. 24								
215	hrotový a ochranný systém proti ptactvu	44 dny	01.01. 24	29.02. 24								
216	doplnění a opravy stávajících zpevněných ploch	72 dny	20.12. 23	28.03. 24								
217	čištění a impregnace části zpevněných ploch	89 dny	27.11. 23	28.03. 24								
218	dodávka a montáž prvků mobiliáře	79 dny	11.12. 23	28.03. 24								
219	úklidy veřejných zpevněných ploch	84 dny	04.12. 23	28.03. 24								
220	Dokončení pracovního záběru N5, včetně provedení přejímky (počátek běhu záručních lhůt prací v rozsahu záběru N5); Dokončení prací posledního záběru - uvedení do provozu 35 MĚSÍCŮ OD ZAHÁJENÍ STAVBY (31 měsíců + 4 měsíce prodloužení)	1 den	28.03. 24	28.03. 24								◆ 28.03.
221	Kompletace dokumentace, zkušební provoz	132 dny	29.03. 24	28.09. 24								
222	Dokončení celého díla včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 41 MĚSÍCŮ OD ZAHÁJENÍ STAVBY (37 měsíců + 4 měsíce prodloužení)	1 den	28.09. 24	28.09. 24								

Aktualizovaný harmonogram
23.10.2023
Pozn.: "Doba trvání" - v pracovních dnech

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4137448

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e45ba404-983d-42d4-a715-e9de63c7011b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Daniela KUBÍNOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.11.2023 08:48:06



062484e6-9ebc-4d0f-b56c-23b9fbaedbe0
