



Projekt: Rekonstrukce administrativní budovy Terminálu 1 Datum: 15.08.23	Úkol Rozdělení Mílník Souhrnný Souhrn projektu	Neaktivní úkol Neaktivní mílník Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější úkoly	Vnější mílník Konečný termín Kritický Kritické rozdělení Průběh	Průběh ručně zadávaného úkolu

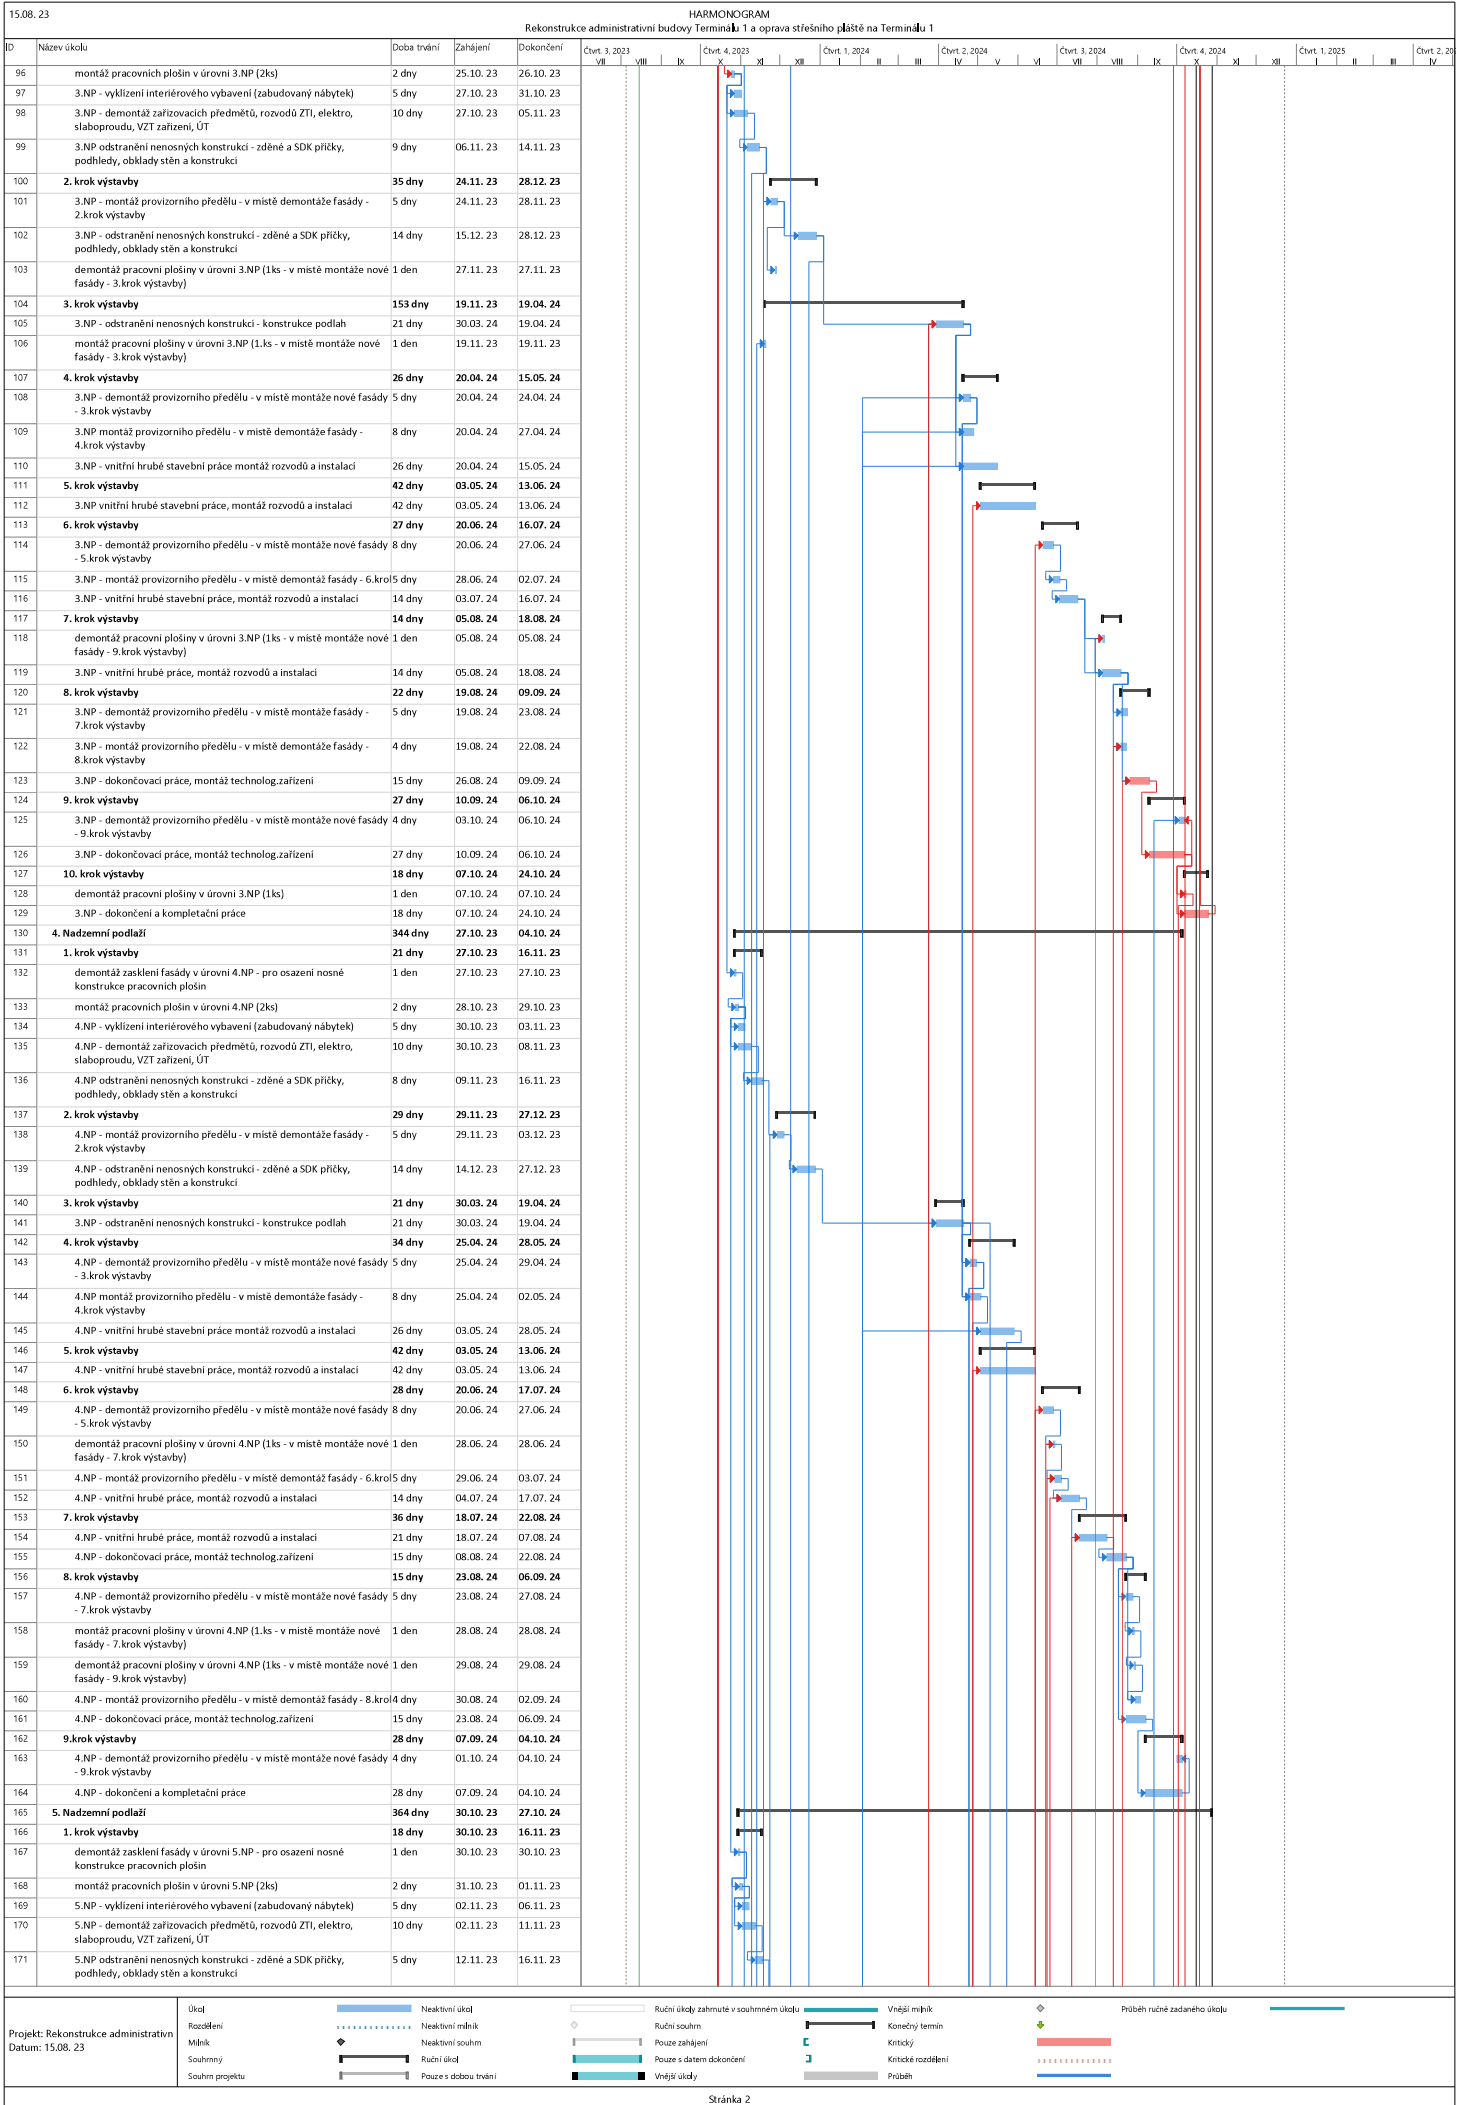

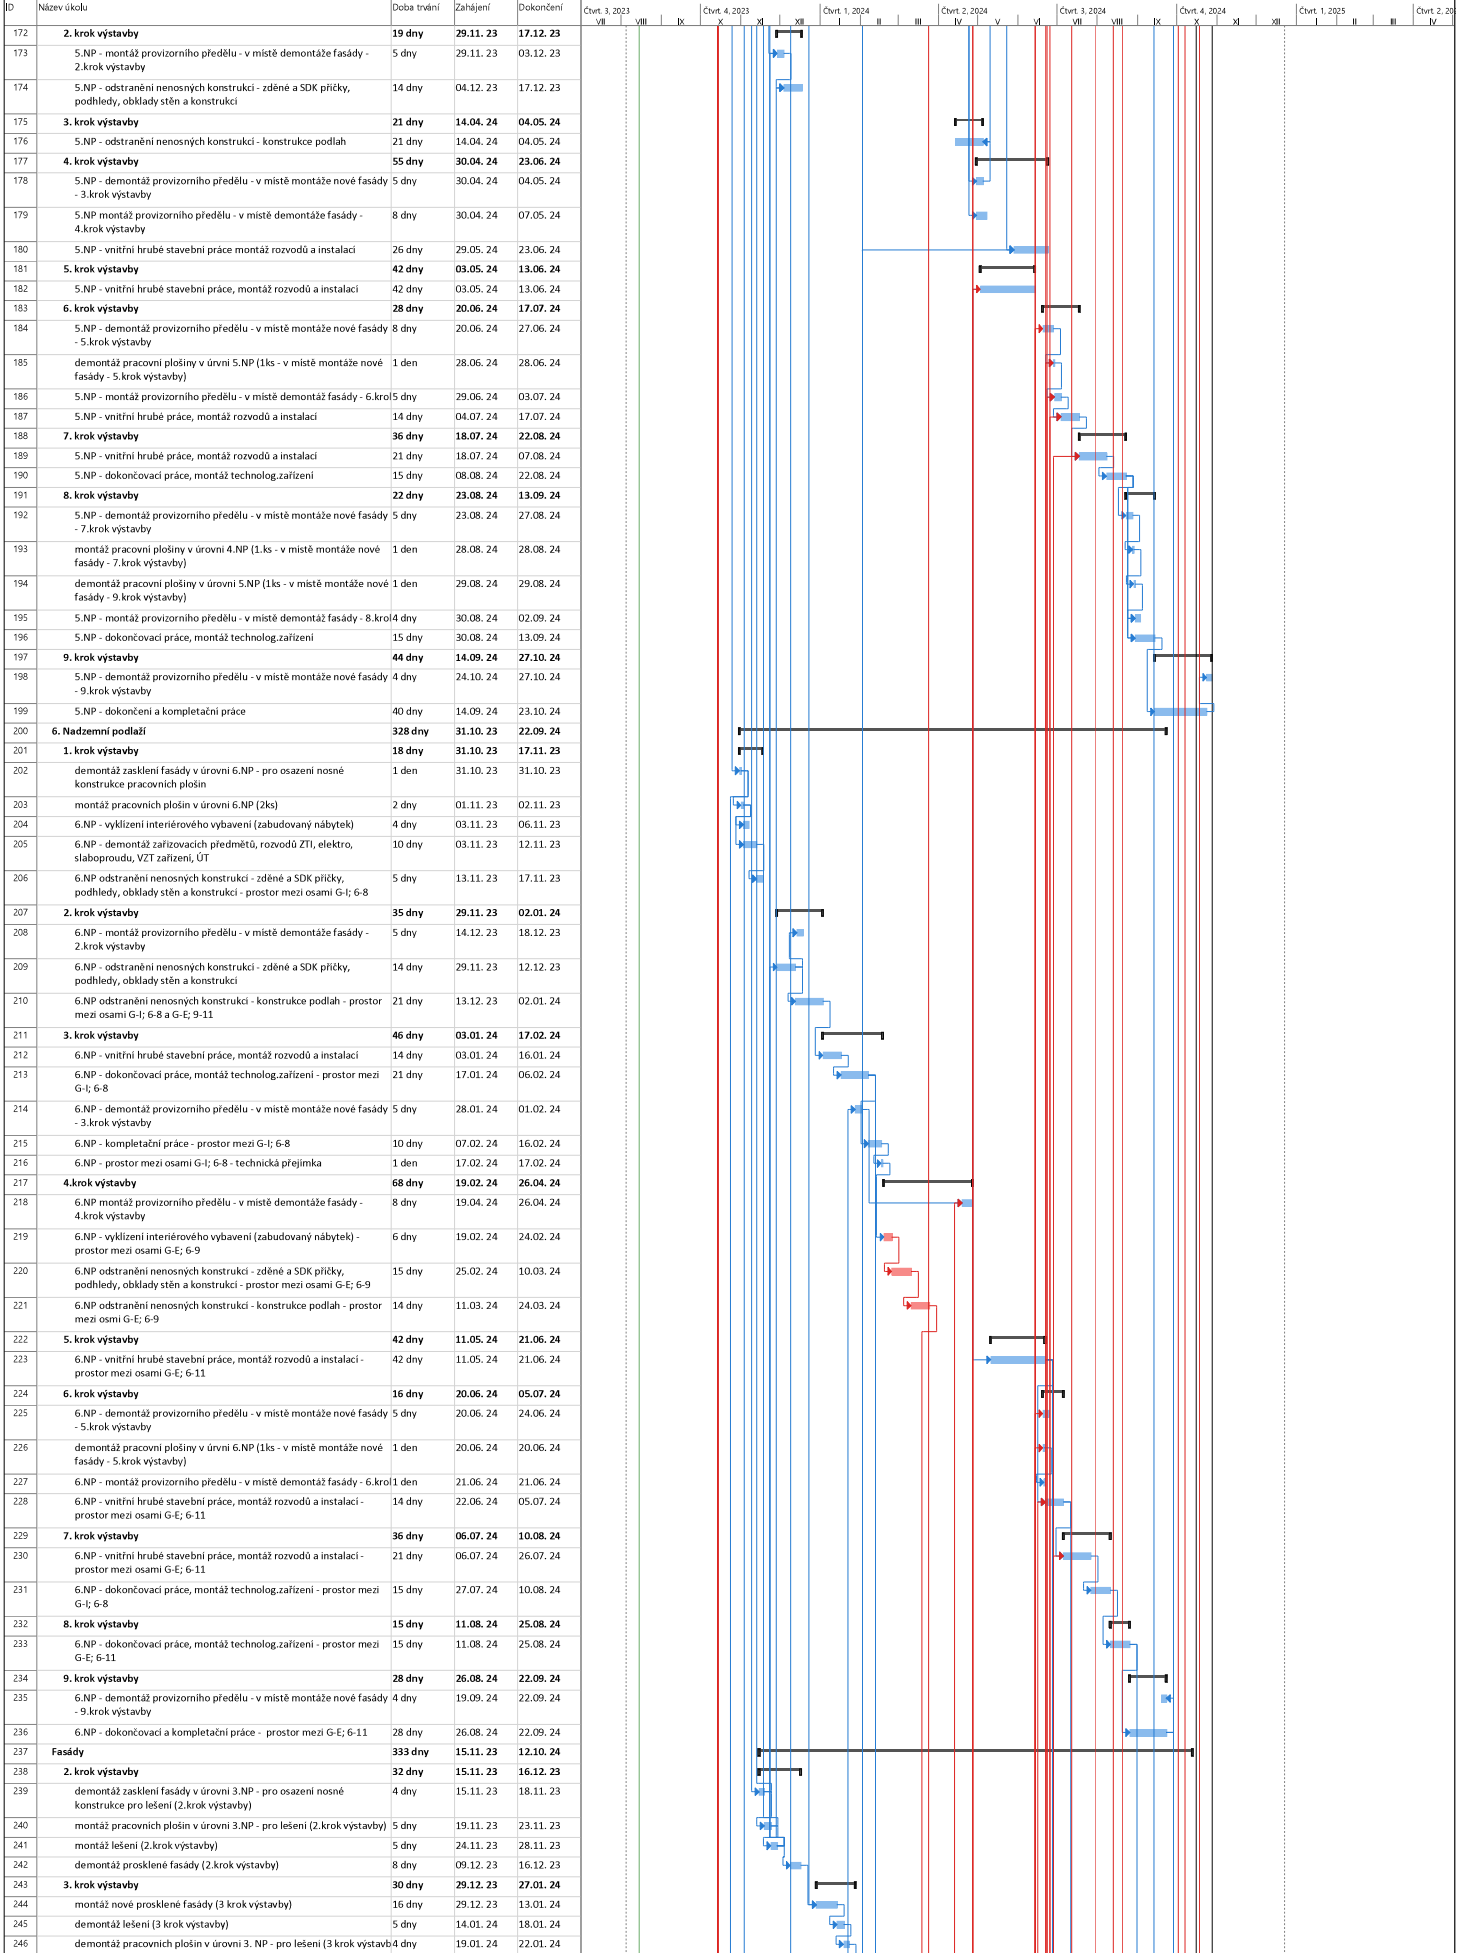

Projekt: Rekonstrukce administrativní budovy Terminálu 1 a oprava střešního pláště na Terminálu 1
 Datum: 15.08.23

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
------	--	----------------	--	--	--

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Cvrt. 3, 2023	Cvrt. 4, 2023	Cvrt. 1, 2024	Cvrt. 2, 2024	Cvrt. 3, 2024	Cvrt. 4, 2024	Cvrt. 1, 2025	Cvrt. 2, 2025
					VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
247	montáž nové prosklené fasády v úrovni 3.NP - po odstranění nosné konstrukce pro lešení (3. krok výstavby)	5 dny	23.01.24	27.01.24								
248	4. krok výstavby	39 dny	25.03.24	02.05.24								
249	demontáž zasklení fasády v úrovni 3.NP - pro osazení nosné kce pro lešení (4.krok výstavby)	5 dny	25.03.24	29.03.24								
250	montáž pracovních plošin v úrovni 3.NP - pro lešení (4.krok výstavby)	8 dny	30.03.24	06.04.24								
251	montáž lešení (4.krok výstavby)	10 dny	07.04.24	16.04.24								
252	demontáž prosklené fasády (4.krok výstavby)	16 dny	17.04.24	02.05.24								
253	5. krok výstavby	48 dny	03.05.24	19.06.24								
254	montáž nové prosklené fasády (5.krok výstavby)	20 dny	03.05.24	22.05.24								
255	demontáž lešení (5.krok výstavby)	10 dny	23.05.24	01.06.24								
256	demontáž pracovních plošin v úrovni 3. NP - pro lešení (5.krok výstavby)	8 dny	02.06.24	09.06.24								
257	montáž nové prosklené fasády v úrovni 3.NP - po odstranění nosné konstrukce pro lešení (5.krok výstavby)	10 dny	10.06.24	19.06.24								
258	6. krok výstavby	22 dny	20.06.24	11.07.24								
259	demontáž zasklení fasády v úrovni 3.NP - pro osazení konstrukce pro lešení (6.krok výstavby)	3 dny	20.06.24	22.06.24								
260	montáž pracovních plošin v úrovni 3.NP - pro lešení (6.krok výstavby)	6 dny	23.06.24	28.06.24								
261	montáž lešení (6.krok výstavby)	5 dny	29.06.24	03.07.24								
262	demontáž prosklené fasády (6.krok výstavby)	8 dny	04.07.24	11.07.24								
263	7. krok výstavby	29 dny	12.07.24	09.08.24								
264	montáž nové prosklené fasády (7.krok výstavby)	15 dny	12.07.24	26.07.24								
265	demontáž lešení (7.krok výstavby)	5 dny	27.07.24	31.07.24								
266	demontáž pracovních plošin v úrovni 3.NP - pro lešení (7.krok výstavby)	4 dny	01.08.24	04.08.24								
267	montáž nové prosklené fasády v úrovni 3.NP - po odstranění nosné konstrukce pro lešení (7.krok výstavby)	5 dny	05.08.24	09.08.24								
268	8. krok výstavby	16 dny	10.08.24	25.08.24								
269	demontáž zasklení fasády v úrovni 3.NP - pro osazení nosné konstrukce pro lešení (8.krok výstavby)	2 dny	10.08.24	11.08.24								
270	montáž pracovních plošin v úrovni 3.NP - pro lešení (8.krok výstavby)	3 dny	12.08.24	14.08.24								
271	montáž lešení (8.krok výstavby)	4 dny	15.08.24	18.08.24								
272	demontáž prosklené fasády (8.krok výstavby)	7 dny	19.08.24	25.08.24								
273	9.krok výstavby	48 dny	26.08.24	12.10.24								
274	montáž nové prosklené fasády (9.krok výstavby)	13 dny	26.08.24	07.09.24								
275	demontáž lešení (9.krok výstavby)	4 dny	08.09.24	11.09.24								
276	demontáž pracovních plošin v úrovni 3.NP - pro lešení (9.krok výstavby)	3 dny	12.09.24	14.09.24								
277	montáž nové prosklené fasády v úrovni 3.NP - po odstranění nosné konstrukce pro lešení (9.krok výstavby)	5 dny	08.10.24	12.10.24								
278	Střešní plášť - 6.NP	233 dny	20.10.23	08.06.24								
279	1. krok výstavby	13 dny	20.10.23	01.11.23								
280	demontáž ocelové konstrukce - 1.část - prostor mezi osami I; 7-10 a F-H; 11	6 dny	20.10.23	25.10.23								
281	demontáž vzř. zařízení	8 dny	22.10.23	29.10.23								
282	odstranění střešní krytiny v prostoru kroku 1	10 dny	23.10.23	01.11.23								
283	2. krok výstavby	35 dny	02.11.23	06.12.23								
284	montáž střešní krytiny v prostoru kroku 2	21 dny	02.11.23	22.11.23								
285	úprava zařízení VZT	10 dny	23.11.23	02.12.23								
286	přípravné práce pro stavbu schodiště	14 dny	23.11.23	06.12.23								
287	montáž ocelové konstrukce - 1.část - prostor mezi osami I; 7-10 a F-H; 11	10 dny	23.11.23	02.12.23								
288	3. krok výstavby	14 dny	03.12.23	16.12.23								
289	přesunutí antén z rohu v prostoru os I-6 a I-11 na novou nosnou ocelovou konstrukci	2 dny	03.12.23	04.12.23								
290	demontáž ocelové konstrukce - 2.část - prostor mezi osami E-I; 6 a E; 6-8 a I; 11	6 dny	05.12.23	10.12.23								
291	odstranění střešní krytiny v prostoru kroku 3	12 dny	05.12.23	16.12.23								
292	nosné konstrukce nástavby schodiště	12 dny	05.12.23	16.12.23								
293	4. krok výstavby	36 dny	17.12.23	21.01.24								
294	montáž střešní krytiny v prostoru kroku 4	24 dny	17.12.23	09.01.24								
295	montáž ocelové konstrukce - 2.část - prostor mezi osami E-I; 6 a E; 6-8 a I; 11	12 dny	10.01.24	21.01.24								
296	5. krok výstavby	25 dny	22.01.24	15.02.24								
297	přesunutí antén do rohu v prostoru os I-6 a I-11 na novou nosnou ocelovou konstrukci	2 dny	22.01.24	23.01.24								
298	demontáž ocelové konstrukce - 3.část - prostor mezi osami E; 8-11	5 dny	24.01.24	28.01.24								
299	nástavba schodiště - vnitřní hrubé stavební práce, montáž rozvodů a instalací	10 dny	29.01.24	07.02.24								
300	odstranění střešní krytiny v prostoru v kroku 5	8 dny	08.02.24	15.02.24								
301	6. krok výstavby	42 dny	16.02.24	28.03.24								
302	montáž střešní krytiny v prostoru kroku 6	21 dny	16.02.24	07.03.24								
303	nástavba schodiště - dokončovací a kompletační práce, montáž technolog.zřízení	21 dny	08.03.24	28.03.24								
304	montáž ocelové konstrukce - 3.část - prostor mezi osami E; 8-11	10 dny	08.03.24	17.03.24								
305	7. krok výstavby	42 dny	07.04.24	18.05.24								
306	oplaštění nástavby	21 dny	07.04.24	27.04.24								
307	alu lamely	21 dny	28.04.24	18.05.24								
308	8. krok výstavby	21 dny	19.05.24	08.06.24								
309	klempířské práce	21 dny	19.05.24	08.06.24								
310	Střešní plášť - Terminál 1	243 dny	20.10.23	18.06.24								
311	Pomocné kce - roznašení rošt na stávající skládkě střechy, osa 2-3; M	2 dny	20.10.23	21.10.23								
312	Pomocné konstrukce pro likvidaci azbestu	14 dny	20.10.23	02.11.23								
313	Střecha T1, pracovní krok 1-7	28 dny	03.11.23	30.11.23								
314	demontáž stávajícího souvrství vč. likvidace azbestu	8 dny	03.11.23	10.11.23								
315	prokotvení trapézových plechů	2 dny	11.11.23	12.11.23								
316	montáž parotěsné vrstvy	7 dny	13.11.23	19.11.23								
317	montáž záchytného systému	2 dny	20.11.23	21.11.23								
318	osazení kontrolních čipů	2 dny	22.11.23	23.11.23								
319	provedení nového souvrství	7 dny	24.11.23	30.11.23								
320	Střecha T1, pracovní krok 8-13	28 dny	01.12.23	28.12.23								
321	demontáž stávajícího souvrství vč. likvidace azbestu	8 dny	01.12.23	08.12.23								
322	prokotvení trapézových plechů	2 dny	09.12.23	10.12.23								
323	montáž parotěsné vrstvy	7 dny	11.12.23	17.12.23								
324	montáž záchytného systému	2 dny	18.12.23	19.12.23								
325	osazení kontrolních čipů	2 dny	20.12.23	21.12.23								
326	provedení nového souvrství	7 dny	22.12.23	28.12.23								
327	Střecha T1, pole mezi osami 21-27	28 dny	29.12.23	25.01.24								
328	demontáž stávajícího souvrství vč. likvidace azbestu	8 dny	29.12.23	05.01.24								
329	prokotvení trapézových plechů	2 dny	05.01.24	07.01.24								
330	montáž parotěsné vrstvy	7 dny	08.01.24	14.01.24								
331	montáž záchytného systému	2 dny	15.01.24	16.01.24								
332	osazení kontrolních čipů	2 dny	17.01.24	18.01.24								

Projekt: Rekonstrukce administrativní budovy Terminál 1
Datum: 15.08.23


█ Úkol
█ Rozdělení
█ Mílník
█ Souhrnný
█ Souhrn projektu

▬ Neaktivní úkol
▬ Neaktivní mílník
▬ Neaktivní souhrn
▬ Ruční úkol
▬ Pouze s dobou trvání

▬ Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
▬ Ruční souhrn
▬ Pouze zahájení
▬ Pouze s datem dokončení
▬ Vnější úkoly

▬ Vnější mílník
▬ Konečný termín
▬ Kritický
▬ Kritické rozdělení
▬ Průběh

▬ Průběh ručně zadávaného úkolu

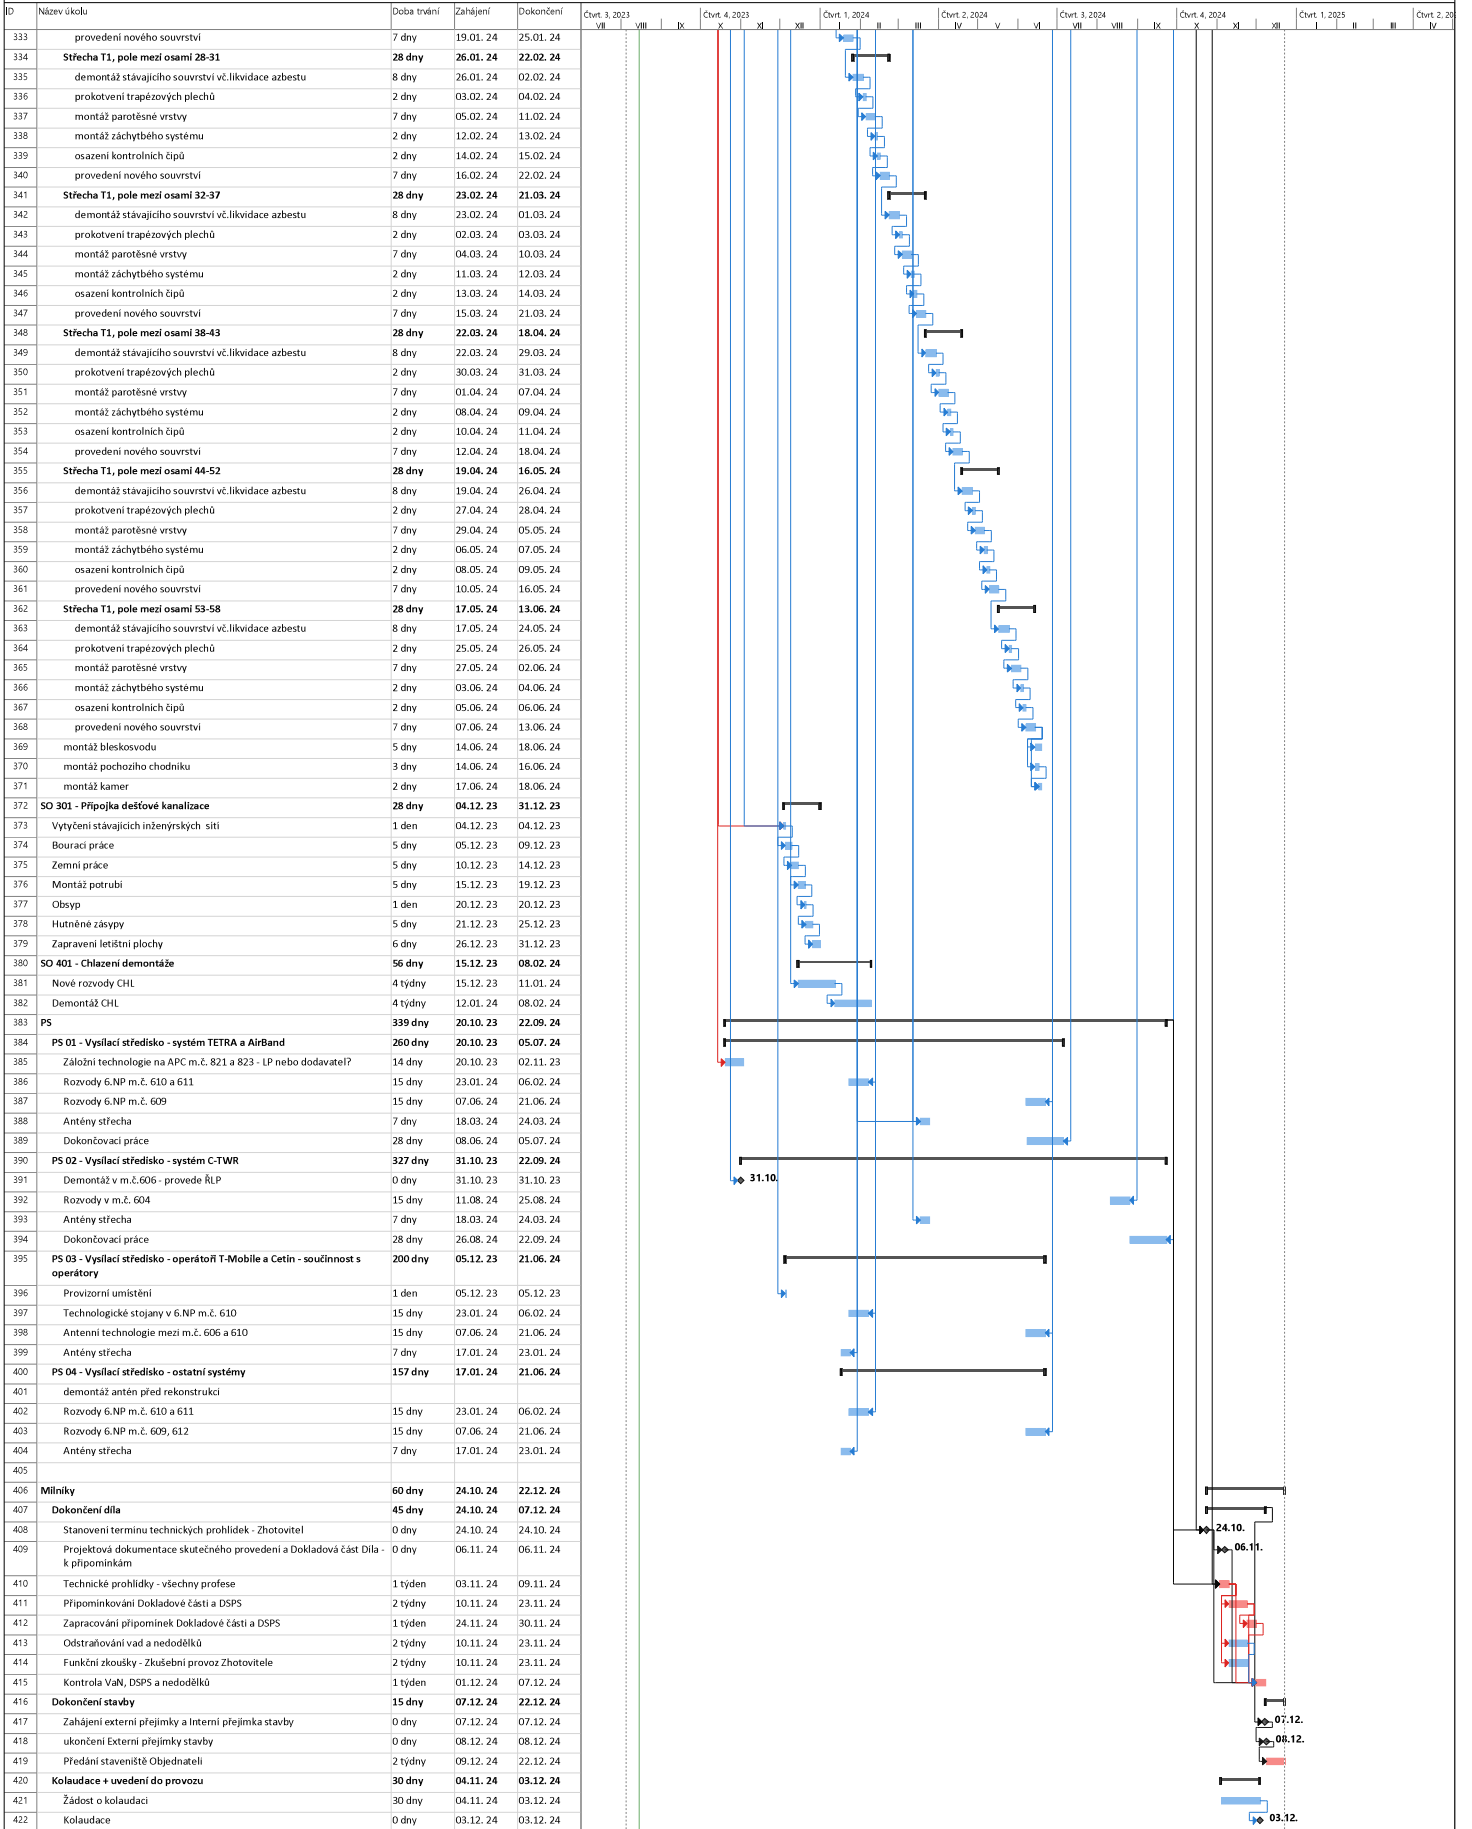

Projekt: Rekonstrukce administrativní budovy Terminu 1 Datum: 15.08.23	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkol zahrnutý v souhrnném úkolu		Vnější mílník		Průběh ručně zadávaného úkolu
	Rozdělení		Neaktivní mílník		Ruční souhrn		Konečný termín		Kritický
	Mílník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický rozdělení		Průběh
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení		
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkol		Průběh		
