

Harmonogram stavby: 2023051 Zateplení - jazyková škola Plzeň

Zhotovitel : Stavby Niros s.r.o.
 Anglické nábřeží 2434/1
 30100 Plzeň 3-Vnitřní Město


Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	leden 2024			
								1	2	3	4
2023051	Zateplení - jazyková škola Plzeň	03.01.2024	19.07.2024	5 281 364	0	143	4	0	0	0	0
01	Objekt	03.01.2024	19.07.2024	5 281 364	0	143	4	0	0	0	0
2	a - Vnitroblok	22.01.2024	19.07.2024	3 062 503	0	130	4				0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	01.04.2024	19.07.2024	1 933 766	0	80	4				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	22.01.2024	19.06.2024	355 996	0	108	4				0
997	Přesun sutě	08.04.2024	19.07.2024	235 224	0	75	4				
998	Přesun hmot	25.03.2024	15.07.2024	54 705	0	81	4				
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	25.03.2024	15.07.2024	56 241	0	81	4				
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25.03.2024	01.05.2024	6 667	0	28	4				
764	Konstrukce klempířské	20.05.2024	03.07.2024	265 689	0	33	4				
783	Dokončovací práce - nátěry	06.05.2024	19.07.2024	154 215	0	55	4				
3	b - Štíty	19.02.2024	15.07.2024	2 091 893	0	106	4				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	04.03.2024	15.07.2024	1 446 598	0	96	4				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	19.02.2024	08.07.2024	358 005	0	101	4				
997	Přesun sutě	11.03.2024	08.07.2024	103 482	0	86	4				
998	Přesun hmot	11.03.2024	08.07.2024	37 765	0	86	4				
783	Dokončovací práce - nátěry	08.04.2024	10.07.2024	127 712	0	68	4				
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	19.02.2024	08.07.2024	18 332	0	101	4				
4	x - VRN	03.01.2024	19.07.2024	126 968	0	143	4	0	0	0	0
VRN3	Zařízení staveniště	03.01.2024	19.07.2024	94 949	0	143	4	0	0	0	0
VRN4	Inženýrská činnost	19.02.2024	19.07.2024	12 475	0	110	4				
VRN6	Územní vlivy	19.02.2024	19.07.2024	12 475	0	110	4				
VRN7	Provozní vlivy	19.02.2024	19.07.2024	7 069	0	110	4				
	Nh za měsíc										0
	Nh za rok										

Harmonogram stavby: 2023051 Zateplení - jazyková škola Plzeň

Zhotovitel : Stavby Niros s.r.o.
 Anglické nábřeží 2434/1
 30100 Plzeň 3-Vnitřní Město

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac.	Prům. počet	2 024						
								leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
2023051	Zateplení - jazyková škola Plzeň	#####	#####	5 281 364	0	143	4	37 570	114 339	512 728	1 176 965	1 361 591	1 409 903	668 268
01	Objekt	#####	#####	5 281 364	0	143	4	37 570	114 339	512 728	1 176 965	1 361 591	1 409 903	668 268
2	a - Vnitroblok	#####	#####	3 062 503	0	130	4	23 733	68 826	81 673	685 834	844 262	909 262	448 913
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	#####	#####	1 933 766	0	80	4				527 391	544 970	527 391	334 014
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	#####	#####	355 996	0	108	4	23 733	68 826	73 573	71 199	73 573	45 093	
997	Přesun sutě	#####	#####	235 224	0	75	4				52 526	70 796	68 512	43 391
998	Přesun hmot	#####	#####	54 705	0	81	4			3 389	14 523	15 008	14 523	7 262
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	#####	#####	56 241	0	81	4			3 484	14 931	15 429	14 931	7 466
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	#####	#####	6 667	0	28	4			1 228	5 264	175		
764	Konstrukce klempířské	#####	#####	265 689	0	33	4					70 850	177 126	17 713
783	Dokončovací práce - nátěry	#####	#####	154 215	0	55	4					53 461	61 686	39 068
3	b - Štíty	#####	#####	2 091 893	0	106	4		29 360	409 733	470 497	496 008	480 008	206 288
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	#####	#####	1 446 598	0	96	4			302 274	323 865	334 661	323 865	161 933
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	#####	#####	358 005	0	101	4		27 929	78 710	76 171	78 710	76 171	20 312
997	Přesun sutě	#####	#####	103 482	0	86	4			18 109	25 870	26 733	25 870	6 899
998	Přesun hmot	#####	#####	37 765	0	86	4			6 609	9 441	9 756	9 441	2 518
783	Dokončovací práce - nátěry	#####	#####	127 712	0	68	4				31 249	42 118	40 759	13 586
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	#####	#####	18 332	0	101	4		1 430	4 030	3 900	4 030	3 900	1 040
4	x - VRN	#####	#####	126 968	0	143	4	13 837	16 154	21 321	20 633	21 321	20 633	13 068
VRN3	Zařízení staveniště	#####	#####	94 949	0	143	4	13 837	13 837	14 791	14 314	14 791	14 314	9 065
VRN4	Inženýrská činnost	#####	#####	12 475	0	110	4		903	2 544	2 462	2 544	2 462	1 559
VRN6	Územní vlivy	#####	#####	12 475	0	110	4		903	2 544	2 462	2 544	2 462	1 559
VRN7	Provozní vlivy	#####	#####	7 069	0	110	4		512	1 442	1 395	1 442	1 395	884
	Cena za měsíc							37 570	114 339	512 728	1 176 965	1 361 591	1 409 903	668 268
	Cena za rok										5 281 364			

Finanční harmonogram

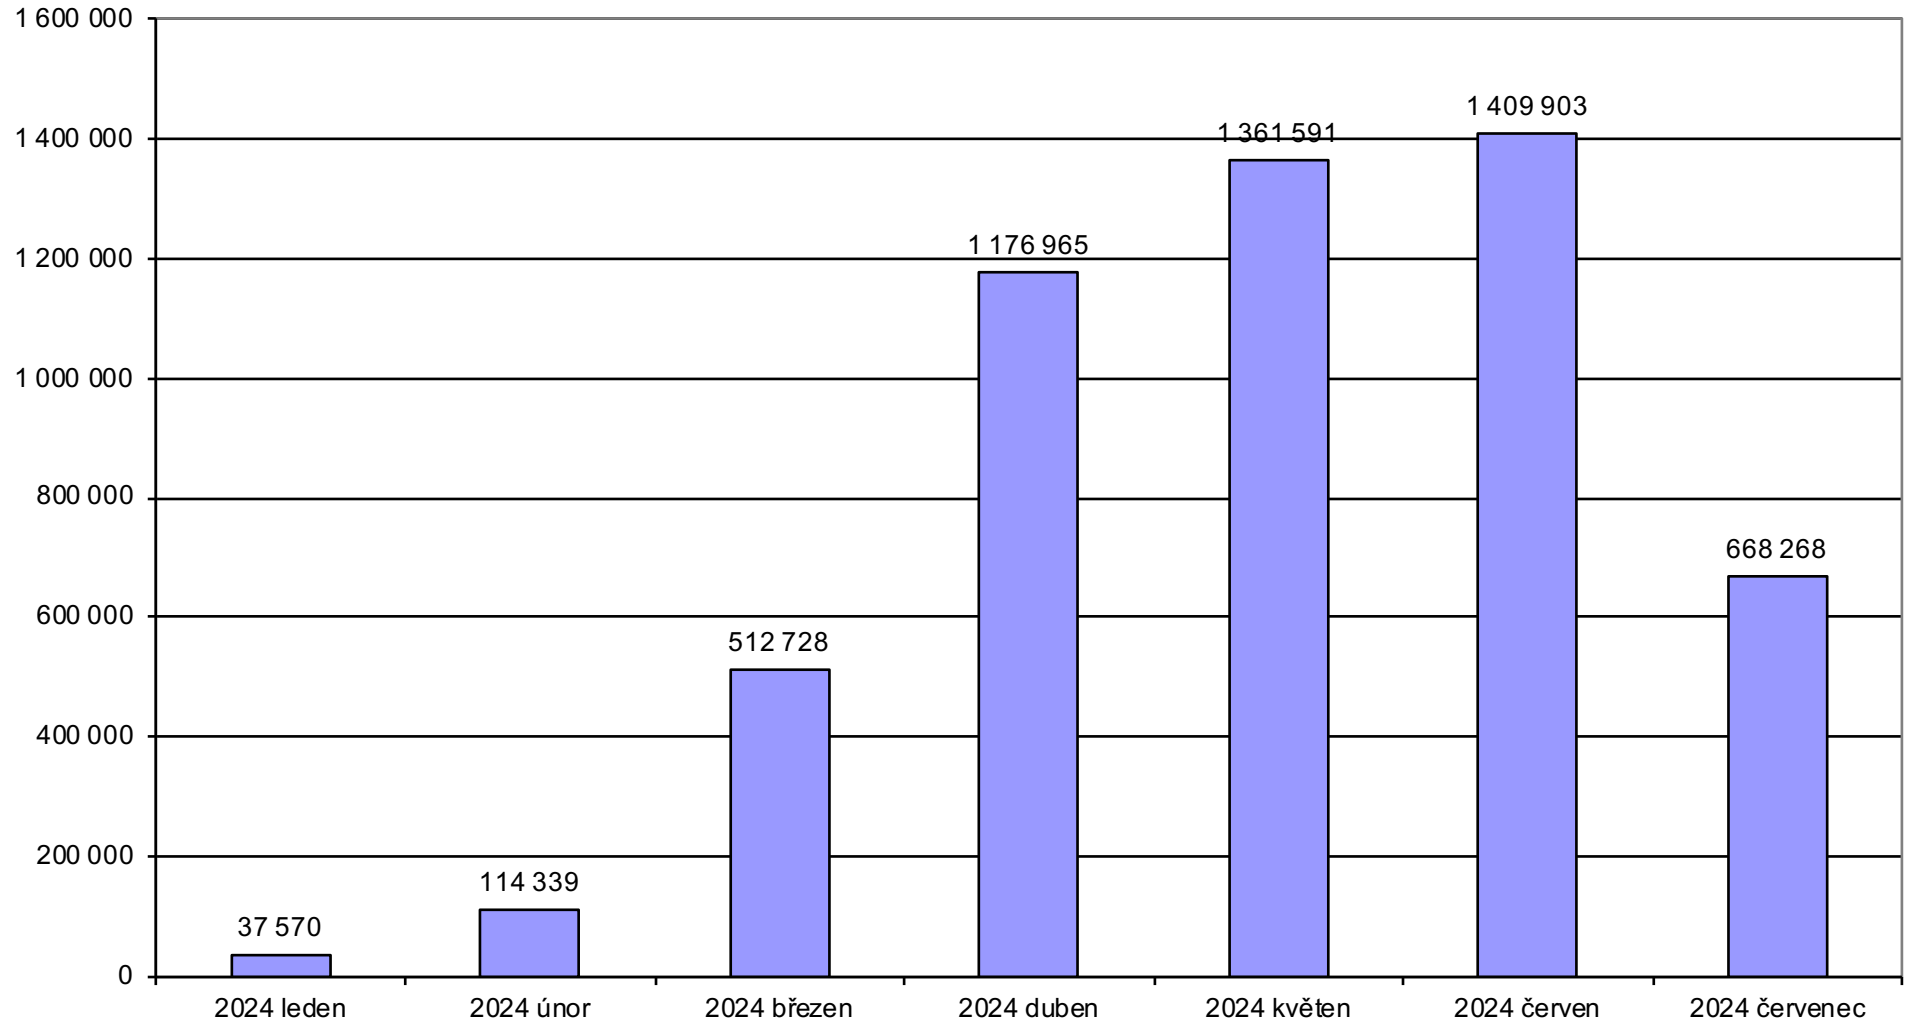

Součtový finanční harmonogram

