



Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Počet prac. dní	2 023			2 024										2 025					
						říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben
900	HZS	01.01.2025	04.03.2025	280 455	63																			
96	Bourání konstrukcí	01.12.2024	11.01.2025	46 465	42																			
M21	Elektromontáže	01.12.2024	20.03.2025	1 012 284	110																			
M46	Zemní práce při montážích	01.12.2024	01.01.2025	4 157	32																			
SO101.2	UZNATELNÉ NÁKLADY - úpravy vnitřní	01.06.2024	31.08.2024	569 792	92																			
1200.2	Stavební úpravy vnitřní dispozice tělocvič	01.06.2024	31.08.2024	569 792	92																			
3	Svislé a kompletní konstrukce	01.06.2024	03.07.2024	58 602	33																			
4	Vodorovné konstrukce	01.06.2024	09.07.2024	105 120	39																			
61	Úpravy povrchů vnitřní	01.07.2024	15.08.2024	105 088	46																			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	01.07.2024	31.08.2024	19 493	62																			
64	Výplně otvorů	01.07.2024	31.08.2024	6 250	62																			
94	Lešení a stavební výtahy	01.06.2024	31.08.2024	7 458	92																			
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	01.07.2024	31.08.2024	23 816	62																			
96	Bourání konstrukcí	01.07.2024	31.08.2024	38 063	62																			
99	Staveništní přesun hmot	01.06.2024	03.08.2024	9 827	64																			
713	Izolace tepelné	01.07.2024	31.07.2024	5 371	31																			
764	Konstrukce klempířské	01.07.2024	31.08.2024	103	62																			
766	Konstrukce truhlářské	01.07.2024	31.08.2024	24 714	62																			
776	Podlahy povlakové	01.07.2024	31.08.2024	95 322	62																			
783	Nátěry	01.07.2024	31.08.2024	732	62																			
784	Malby	01.08.2024	31.08.2024	26 134	31																			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.06.2024	05.07.2024	43 699	35																			
SO102	UZNATELNÉ NÁKLADY - Kanalizace deš	01.05.2024	29.09.2024	1 027 809	152																			
1200.3	Kanalizace dešťová s retenční jímkou	01.05.2024	29.09.2024	1 027 809	152																			
1	Zemní práce	01.05.2024	26.08.2024	617 179	118																			
2	Základy a zvláštní zakládání	01.08.2024	29.09.2024	46 658	60																			
4	Vodorovné konstrukce	01.06.2024	05.07.2024	50 326	35																			
8	Trubní vedení	01.06.2024	02.07.2024	231 284	32																			
96	Bourání konstrukcí	01.05.2024	29.05.2024	922	29																			
99	Staveništní přesun hmot	01.05.2024	04.07.2024	40 998	65																			
721	Vnitřní kanalizace	01.06.2024	29.06.2024	35 140	29																			
M46	Zemní práce při montážích	01.06.2024	29.06.2024	5 281	29																			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.06.2024	29.06.2024	22	29																			
SO103	UZNATELNÉ NÁKLADY - Zpevněné ploch	01.10.2023	02.01.2025	1 308 238	460																			
1200.4	Zpevněné plochy, Oplocení	01.10.2023	02.01.2025	1 308 238	460																			
1	Zemní práce	01.10.2023	09.10.2024	70 282	375																			
1	Zemní práce - bourací práce	01.10.2023	31.10.2023	35 141	31																			
1	Zemní práce	01.08.2024	09.10.2024	35 141	70																			
2	Základy a zvláštní zakládání	01.09.2024	01.10.2024	1 429	31																			
3	Svislé a kompletní konstrukce	01.10.2024	02.11.2024	254 244	33																			
5	Komunikace	01.08.2024	15.10.2024	435 660	76																			
91	Doplňující práce na komunikaci	01.12.2024	02.01.2025	33 805	33																			
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2024	30.11.2024	82 153	122																			
711	Izolace proti vodě	01.09.2024	04.10.2024	68 905	34																			
767	Konstrukce zámečnické	01.11.2024	01.01.2025	17 714	62																			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.11.2023	02.12.2023	273 763	32																			
SO104	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Návrh sado	01.12.2023	30.04.2025	188 925	517																			
1200.5	Návrh sadových úprav	01.12.2023	30.04.2025	188 925	517																			
1	Zemní práce	01.12.2023	30.04.2025	70 214	517																			
1	Zemní práce - bourací práce	01.12.2023	01.01.2024	35 107	31																			
1	Zemní práce	01.03.2025	30.04.2025	35 107	61																			
11	Přípravné a přidružené práce	01.03.2025	30.04.2025	118 711	61																			
	Finanční plnění bez DPH za měsíc					505 112	680 061	1 962 660	2 545 836	1 929 813	1 329 799	1 455 697	2 693 237	3 418 883	3 178 077	2 822 935	2 723 645	3 200 578	1 952 418	1 972 025	1 211 317	1 108 355	982 267	723 616
	Finanční plnění bez DPH za rok						3 147 833							29 222 944										4 025 555

1200.3	Kanalizace dešťová s retenční jímkou	01.05.2024	29.09.2024	1 027 809	732	152	1								182 615	476 240	186 308	160 095	22 551									
1	Zemní práce	01.05.2024	26.08.2024	617 179	595	118	1								162 140	156 910	162 140	135 989										
2	Základy a zvláštní zakládání	01.08.2024	29.09.2024	46 658	5	60	1											24 107	22 551									
4	Vodorovné konstrukce	01.06.2024	05.07.2024	50 326	49	35	1									43 137	7 189											
8	Trubní vedení	01.06.2024	02.07.2024	231 284	29	32	1									216 829	14 455											
96	Bourání konstrukcí	01.05.2024	29.05.2024	922	1	29	1								922													
99	Staveništní přesun hmot	01.05.2024	04.07.2024	40 998	45	65	1								19 553	18 922	2 523											
721	Vnitřní kanalizace	01.06.2024	29.06.2024	35 140	4	29	1									35 140												
M46	Zemní práce při montážích	01.06.2024	29.06.2024	5 281	4	29	1																					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.06.2024	29.06.2024	22	0	29	1									22												
SO103	UZNATELNÉ NÁKLADY - Zpevněné plochy	01.10.2023	02.01.2025	1 308 238	809	460	1	70 282	256 653	17 110	0	0	0	0	0	0	0	229 703	284 475	362 884	44 182	40 614	2 335					
1200.4	Zpevněné plochy, Oplocení	01.10.2023	02.01.2025	1 308 238	809	460	1	70 282	256 653	17 110	0	0	0	0	0	0	0	229 703	284 475	362 884	44 182	40 614	2 335					
1	Zemní práce	01.10.2023	09.10.2024	70 282	38	375	1	35 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 563	15 061	4 518								
1	Zemní práce - bourací práce	01.10.2023	31.10.2023	35 141	19	31	1	35 141																				
1	Zemní práce	01.08.2024	09.10.2024	35 141	19	70	1											15 563	15 061	4 518								
2	Základy a zvláštní zakládání	01.09.2024	01.10.2024	1 429	0	31	1												1 383	46								
3	Svislé a kompletní konstrukce	01.10.2024	02.11.2024	254 244	258	33	1													238 835	15 409							
5	Komunikace	01.08.2024	15.10.2024	435 660	115	76	1											177 703	171 971	85 985								
91	Doplňující práce na komunikaci	01.12.2024	02.01.2025	33 805	12	33	1																31 757	2 049				
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2024	30.11.2024	82 153	104	122	1											20 875	20 202	20 875	20 202							
711	Izolace proti vodě	01.09.2024	04.10.2024	68 905	22	34	1													60 798	8 106							
767	Konstrukce zámečnické	01.11.2024	01.01.2025	17 714	4	62	1														8 571	8 857	286					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.11.2023	02.12.2023	273 763	254	32	1		256 653	17 110																		
SO104	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - Návrh sado	01.12.2023	30.04.2025	188 925	202	517	1			34 010	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 170	75 648
1200.5	Návrh sadových úprav	01.12.2023	30.04.2025	188 925	202	517	1			34 010	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 170	75 648
1	Zemní práce	01.12.2023	30.04.2025	70 214	124	517	1			34 010	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 841	17 266
1	Zemní práce - bourací práce	01.12.2023	01.01.2024	35 107	62	31	1			34 010	1 097																	
1	Zemní práce	01.03.2025	30.04.2025	35 107	62	61	1																				17 841	17 266
11	Přípravné a přidružené práce	01.03.2025	30.04.2025	118 711	78	61	1																				60 329	58 382
	Cena za měsíc							505 112	680 061	1 962 660	2 545 836	1 929 813	1 329 799	1 455 697	2 693 237	3 418 883	3 178 077	2 822 935	2 723 645	3 200 578	1 952 418	1 972 025	1 211 317	1 108 355	982 267	723 616		
	Cena za rok							3 147 833							29 222 944												4 025 555	

Finanční harmonogram

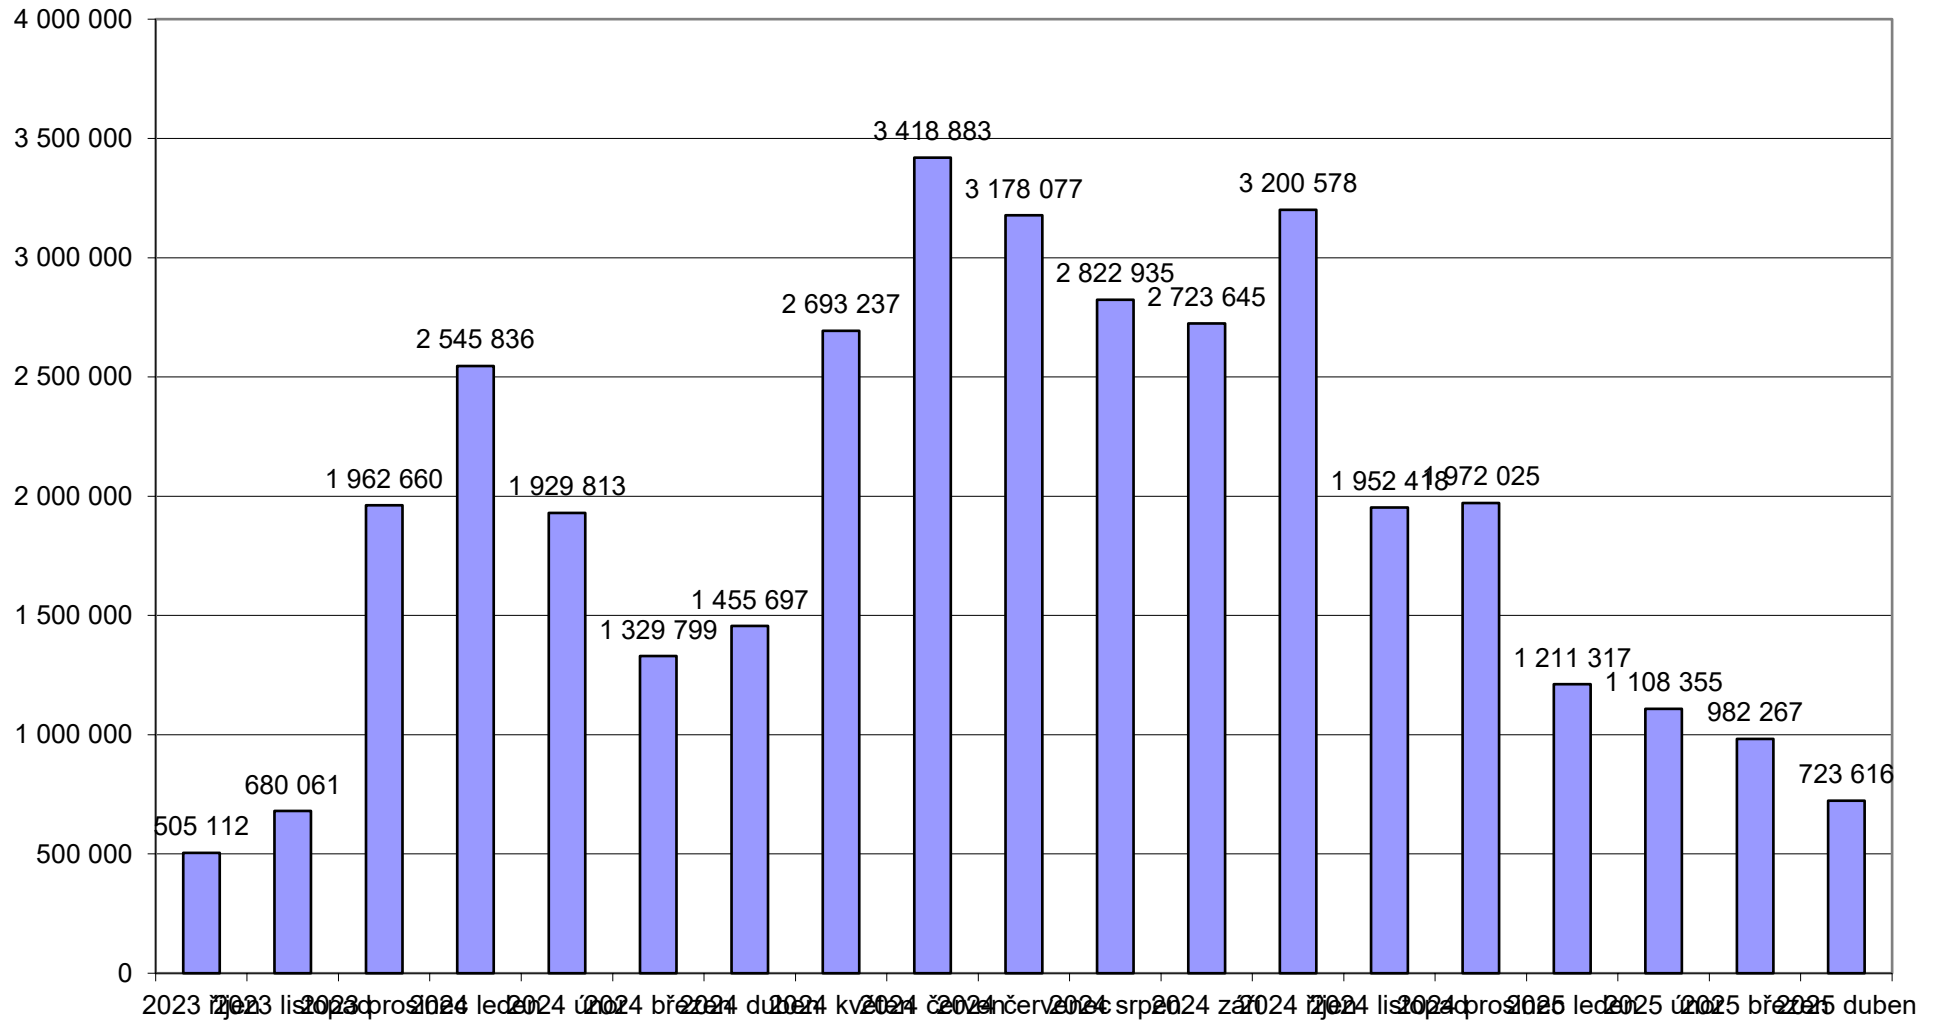

Součtový finanční harmonogram

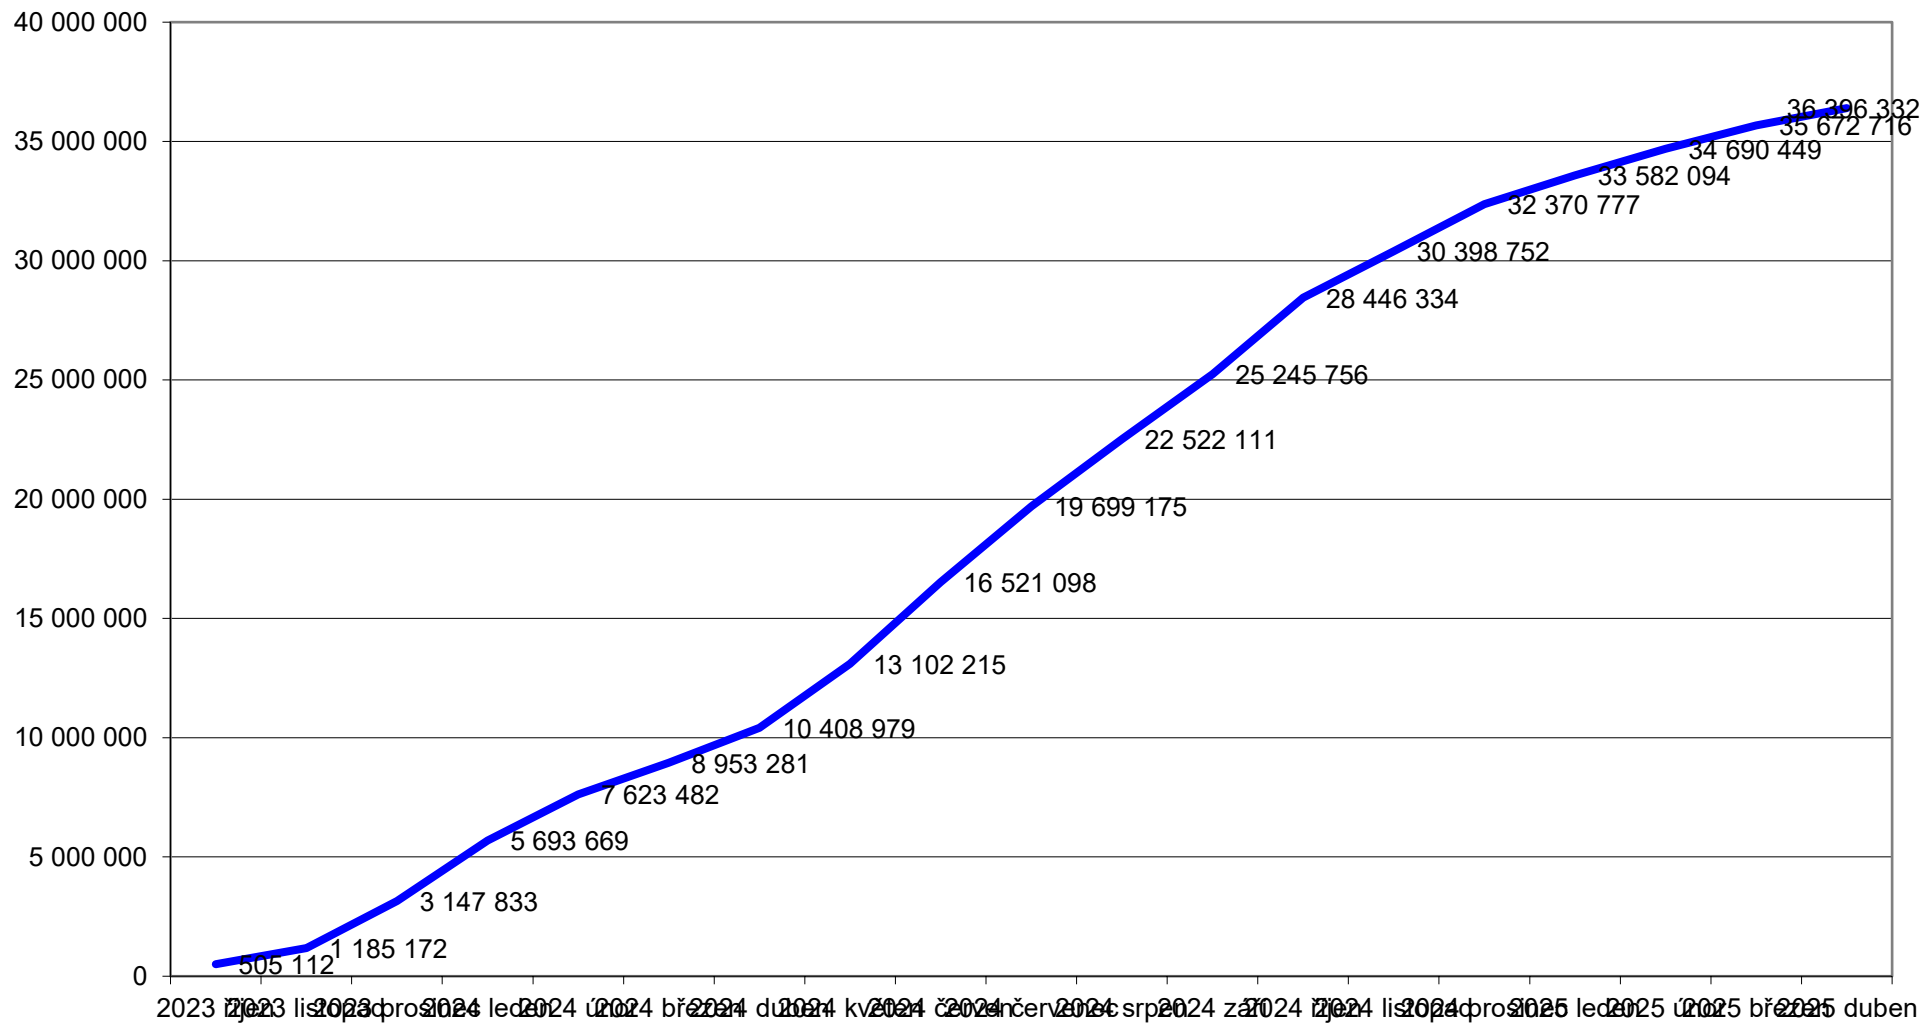

Ing. Jiří Rozehnal
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2024.03.08
07:34:47 +01'00'

Petr Klár
Digitálně podepsal
Petr Klár
Datum: 2024.03.06
12:55:16 +01'00'
