


22971\_ Přesun pasových filtrů+komerční zóna odlety v T1

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	25.02.16		18.03.16		18.03.16		20.03.16		21.03.16		21.03.16		27.03.16		13.04.16		27.03.16		18.04.16		18.04.16	
						Út 24	St 11.5	Út 26.7	St 30.8	So 18.6	Čt 7.7	Út 26.7	Ne 14.8	Pá 2.9	St 21.9	Po 10.10	So 29.10	Čt 17.11	Út 6.12	Ne 20.12	Pá 13.1	St 12	Po 20.2	So 11.3	Čt 30.3	Út 18.4	Ne 7.5
1	<b>Pasové filtry a OZ Terminál 1 Ruzyně</b>	346 dny	4.6.16	15.5.17																							
2	Předání plochy pro zařízení staveniště	0 dny	4.6.16	4.6.16		4.6.																					
3	Vybudování zařízení staveniště	5 dny	4.6.16	8.6.16																							
4	<b>OZ: Požární úniková schodiště</b>	86 dny	4.6.16	29.8.16																							
5	Předání staveniště PS Zhotoviteli	0 dny	4.6.16	4.6.16		4.6.																					
6	Požární schodiště - sever	72 dny	4.6.16	14.8.16	5																						
7	Požární schodiště - východ	72 dny	18.6.16	28.8.16																							
8	Předání díla a staveniště Objednateli	0 dny	29.8.16	29.8.16	7																						
9	<b>VP schodiště</b>	59 dny	4.7.16	31.8.16																							
10	Předání staveniště VIP Zhotoviteli	0 dny	4.7.16	4.7.16		4.7.																					
11	Realizace VIP	55 dny	5.7.16	28.8.16	10																						
12	Předání díla a staveniště VIP Objednateli	2 dny	30.8.16	31.8.16	11																						
13	<b>Stavba pasových filtrů a přeložek sítí v prostoru 5002</b>	96 dny	12.8.16	15.11.16																							
14	Předání staveniště SO 02 Zhotoviteli	0 dny	12.8.16	12.8.16																							
15	Realizace SO 02	92 dny	15.8.16	14.11.16	14																						
16	Předání díla a staveniště SO 02 Objednateli	1 den	15.11.16	15.11.16	15																						
17	Realizace - 5. zóna	21 dny	25.10.16	14.11.16																							
18	<b>OZ: Obchodní zóna práce typu Shell&amp;Core</b>	155 dny	9.9.16	10.2.17																							
19	Předání staveniště OZ Zhotoviteli	0 dny	9.9.16	9.9.16																							
20	Realizace - 1. zóna	55 dny	9.9.16	2.11.16	19																						
21	Realizace - 2. zóna	41 dny	31.12.16	9.2.17																							
22	3. zóna - souběh provozu stávajících a nových pasových filtrů dle PCR	11 dny	28.11.16	8.12.16																							
23	Realizace - 3. zóna	38 dny	3.1.17	9.2.17																							
24	Realizace - 4. zóna	27 dny	9.9.16	5.10.16																							
25	Předání díla - zóna 4 a staveniště Objednateli	0 dny	6.10.16	6.10.16	24																						
26	Předání díla - zóna 1 a staveniště Objednateli	0 dny	10.2.17	10.2.17	20																						
27	Předání díla - zóna 2 a staveniště Objednateli	0 dny	10.2.17	10.2.17	21																						
28	Předání díla - zóna 3 a staveniště Objednateli	0 dny	10.2.17	10.2.17	23																						
29	<b>OZ: Instalace ústředny EPS v IDF4</b>	56 dny	9.9.16	3.11.16																							
30	Dodávka a montáž	56 dny	9.9.16	3.11.16																							
31	<b>OZ: Instalace PER</b>	154 dny	9.9.16	9.2.17																							
32	Dodávka a montáž	154 dny	9.9.16	9.2.17																							
33	<b>OZ: Instalace technologie IDF9</b>	38 dny	26.9.16	2.11.16																							
34	Dodávka a montáž	38 dny	26.9.16	2.11.16																							
35	Odstranění zařízení staveniště	1 den	15.5.17	15.5.17	39																						
36	<b>Transformové přepážky</b>	93 dny	11.2.17	14.5.17																							
37	Realizace transformových přepážek SDK kce vč. rozvodů TZB	34 dny	11.2.17	16.3.17	28																						
38	Nábytek - Výrobní PD, výroba, mtž.	50 dny	17.3.17	5.5.17	37																						
39	Realizace kompletní rozvodní sílny a slabotransferových přepážek vč. odzkoušení	9 dny	6.5.17	14.5.17	38																						
40	Předání díla objednateli	1 den	15.5.17	15.5.17	39																						

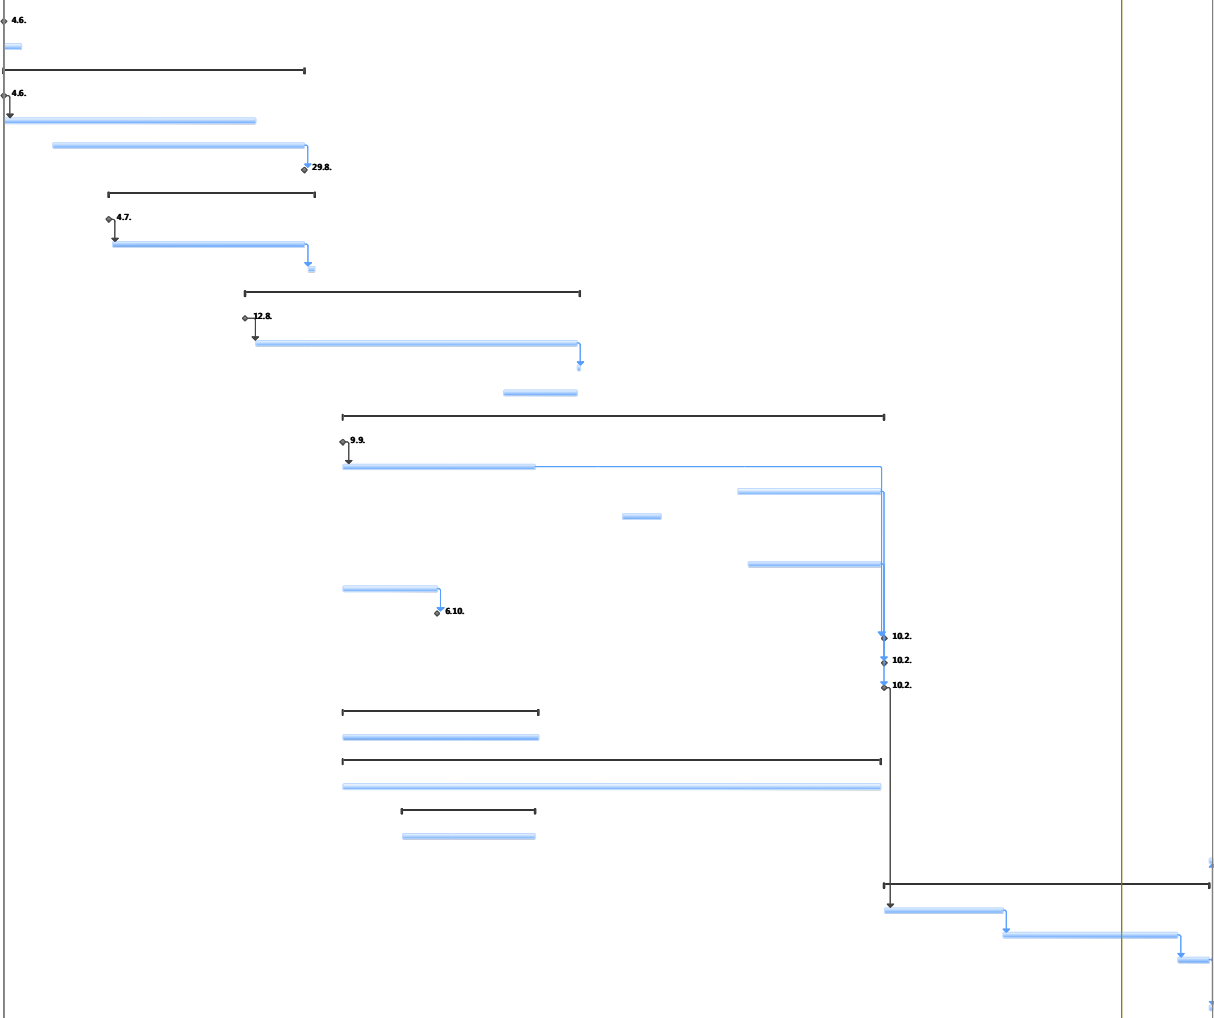

Projekt: Příchod KZ a PF - Ter  
Datum: 204.17

Úkol		Souhrnný		Neaktivní míra		Práce s dílnou trval		Práce zahájení		Wijší míra		Průběh realizace zadáního úkolu
Rozlišení		Souhrnný přehled		Neaktivní souhrn		Práce s datem dokončení		Práce s datem dokončení		Konečný termín		
Mínka		Neaktivní úkol		Ruční úkol		Ruční souhrn		Vnější úkol		Příběh		
