

Dohoda Stran o prodloužení Doby pro dokončení

Smluvní strany

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem:

IČO:

zastoupená:

(dále jen „**Objednatel**“)

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

000 85 031

Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

1. zástupcem statutárního
orgánu organizace na základě pověření

a

EUROVIA CZ a.s.,

se sídlem:

IČO:

zastoupená:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

452 74 924

Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu
Morava jih

provozně-obchodním
náměstkem

hlavním
stavbyvedoucím

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „**Strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne tuto dohodu (dále jen „**Dohoda**“).

Preamble

- A. Strany uzavřely dne 30.04.2024 smlouvu o dílo č. Objednatele SMLO-35/1153/200/20/2024, č. Zhotovitele 198/1/2024 (1856.4241198TSE) (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II. etapa**“ (dále jen „**Dílo**“). Práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci plnění na základě Smlouvy se řídí Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).
- B. V průběhu realizace Díla došlo ke vzniku několika skutečností, které byly řešeny prostřednictvím Variací a které se podle Smlouvy považují za okolnost náležející do rizika Objednatele a se kterými Smlouva spojuje vznik časového nároku Zhotovitele podle Pod-čl. 7.3 OP/ZP ve spojení s Pod-čl. 6.1 písm. l) a m) OP/ZP na prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP a Přílohy. Konkrétně se jedná o skutečnost, kdy se z důvodu prodloužení výběrového řízení došlo k podpisu Smlouvy až dne 30.04.2024. Stavební povolení nabylo právní moci ke dni



20.04.2024, ovšem jednou z podmínek bylo kácení stromů v době vegetačního klidu, který již skončil ke dni 31.03.2024. Dále bylo součástí realizace Díla provedení přeložky kabelového vedení společnosti ČEZ a.s., ačkoli byla za tímto účelem urgována, k provedení přeložky došlo se zpožděním. Také byly v průběhu prací zastiženy mělce uložené plynovodní přípojky k rodinným domům, z toho důvodu bylo nutné provedení přepojení přeložek plynu. Na provedení přeložek byly navázány další práce jako montáž mostního provizoria. Při provádění prací na demolici starého mostu Zhotovitel narazil na skalní podklad a tato skutečnost si vyžádala provedení časově náročné Variace prací. V průběhu betonáže opěr mostu došlo k zaplavení Staveniště v důsledku záplav, které způsobilo pozastavení provádění prací a následné práce na likvidaci škod. Dále byly při provádění zemních prací zastiženy mělké plynové přípojky k rodinným domům, pro které musely být provedeny přeložky. V předmětném úseku Stavby byl také nalezen starý most bez přítoku a kamenný skládaný propustek, které bylo nutné odstranit. Předmětné skutečnosti zanesl Zhotovitel do svého aktualizovaného harmonogramu prací a byly potvrzeny také vyjádřením technického dozoru stavebníka. (dále jen „**Okolnost**“)

- C. Zhotovitel v souvislosti s Okolností uplatnil ve smyslu Pod-čl. 7.3 OP/ZP nárok na prodloužení Doby pro dokončení do dne 30.07.2025. (dále jen „**Časový nárok**“).
- D. Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Časovým nárokem anebo Okolností neuplatnil vůči Objednateli žádné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci. (dále jen „**Finanční nárok**“)
- E. Strany mají zájem vyřešit s konečnou platností veškeré nesrovnalosti a spory, které vyplývají z Okolností a Časového nároku.

Strany se dohodly následovně:

I.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má na základě a/nebo v souvislosti s Okolností výhradně a pouze tento časový nárok a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí:

nárok na prodloužení Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP) podle Pod-čl. 7.3 OP/ZP o 212 dní do dne 30.07.2025.

(dále jen „**Přiznaný časový nárok**“)

II.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Okolností a Časovým nárokem, resp. takovým sporům předcházet, se Strany dohodly na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Strany přitom podepisují tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v této Dohodě:

- i. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků bez ohledu na jejich charakter a právní kvalifikaci, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Okolností a Objednatel s tímto souhlasí.



IV.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem připojením uznávaných elektronických podpisů oprávněných zástupců Stran.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a Strany obdrží její elektronický originál.

Přílohy: č. 1 HMG

Č. 2 detailní claim zhotovitele

Za Objednatele:

Digitálně
[Redacted Signature]
15.02.04 10:00

Ing. Jiří Synek

1. zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření


Za Zhotovitele:

[Redacted Signature]
[Redacted Signature]
2025.01.03

Ing. Ludvík Šumbera

ředitel
závodu Morava jih



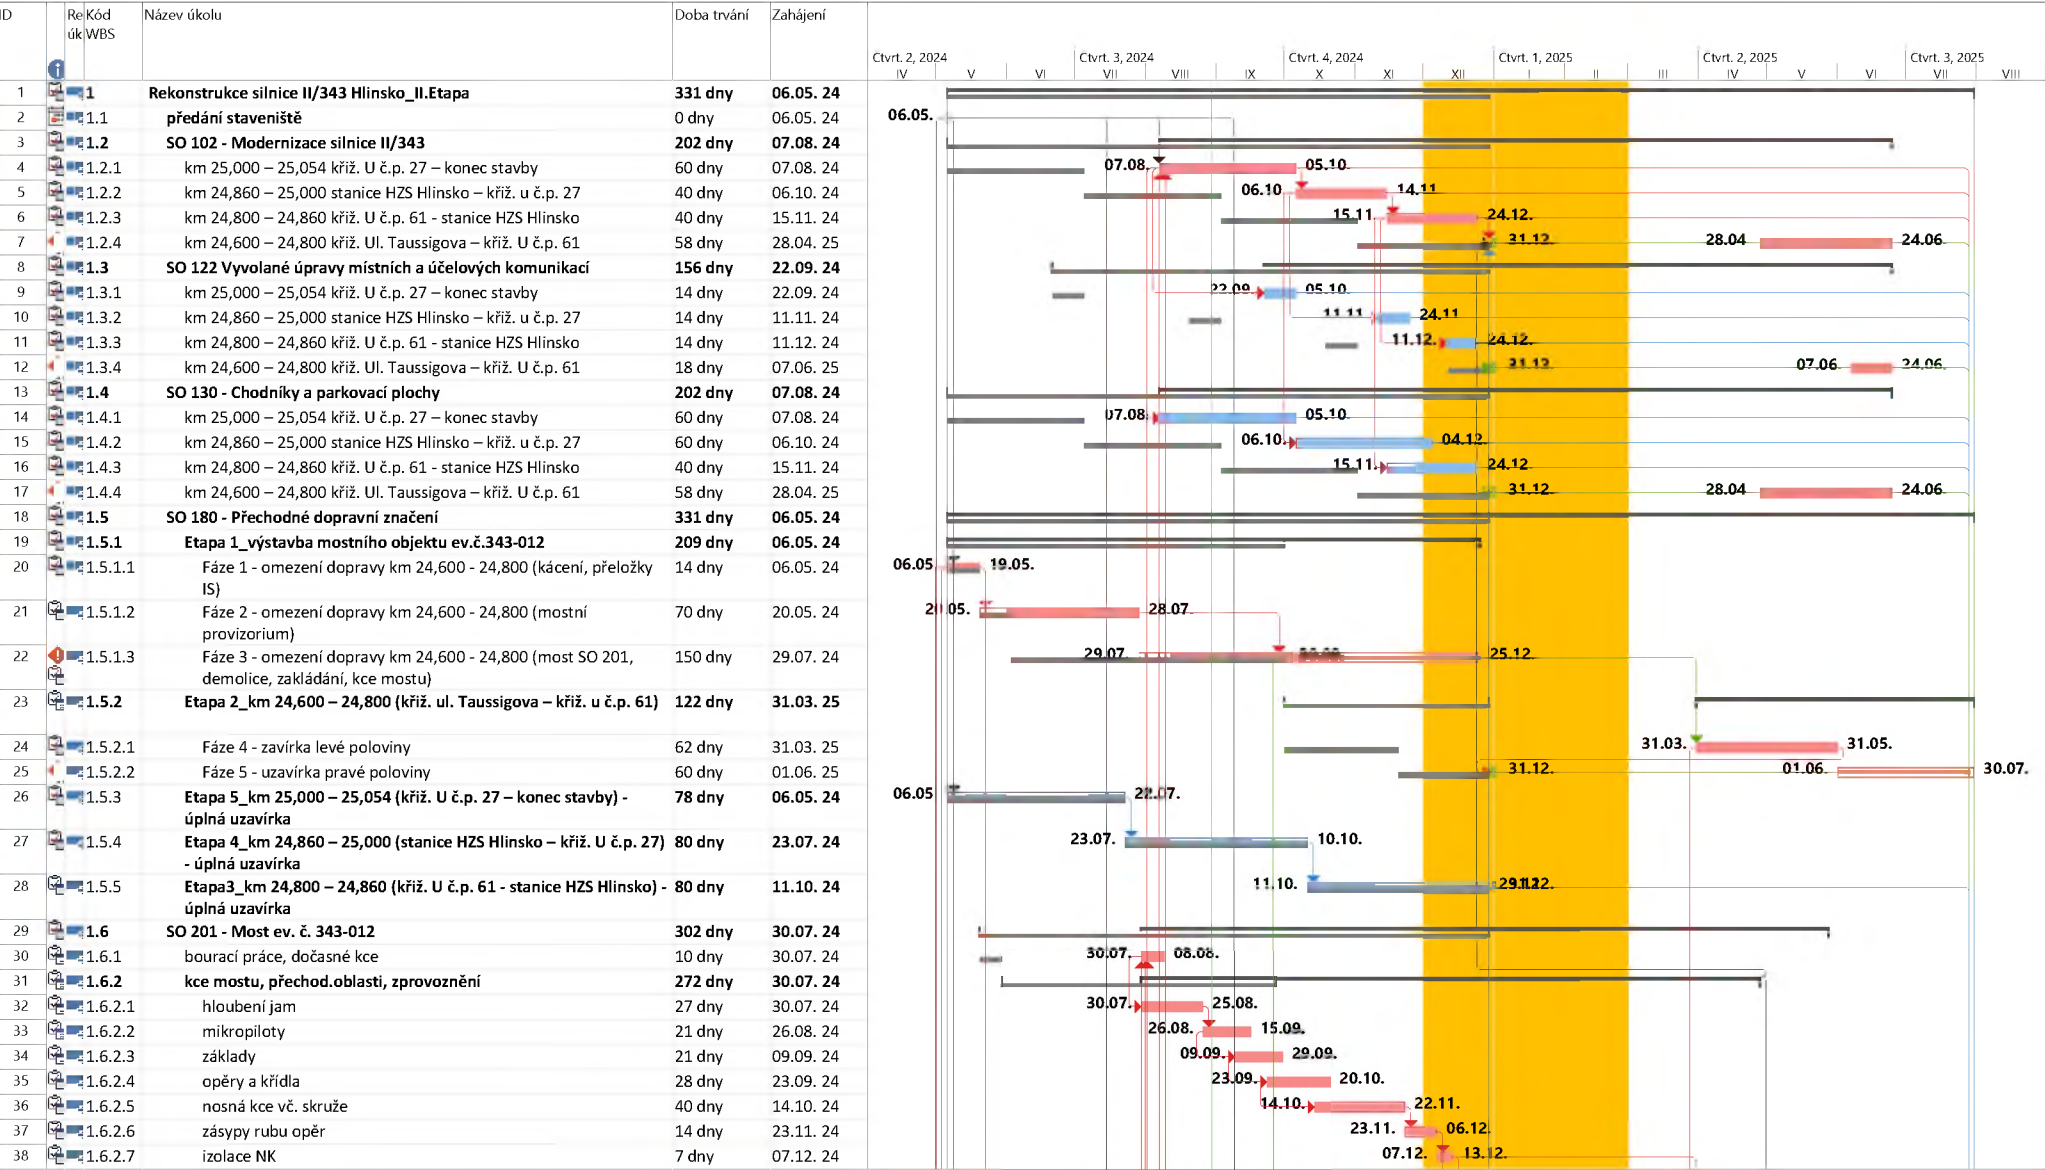

Projekt: Hlinsko_II.etapa_SP_v.04_zpoždění SO řady 400_SP_v.02

Úkol

Rozdělení

Milník

.....

◆

.....

◆

.....

◆

Souhrnný

Souhrn projektu

Konečný termín

Kritický


Kritické rozdělení

Směrný plán

Milník podle směrného plánu

Souhrnný úkol směrného plánu

Průběh

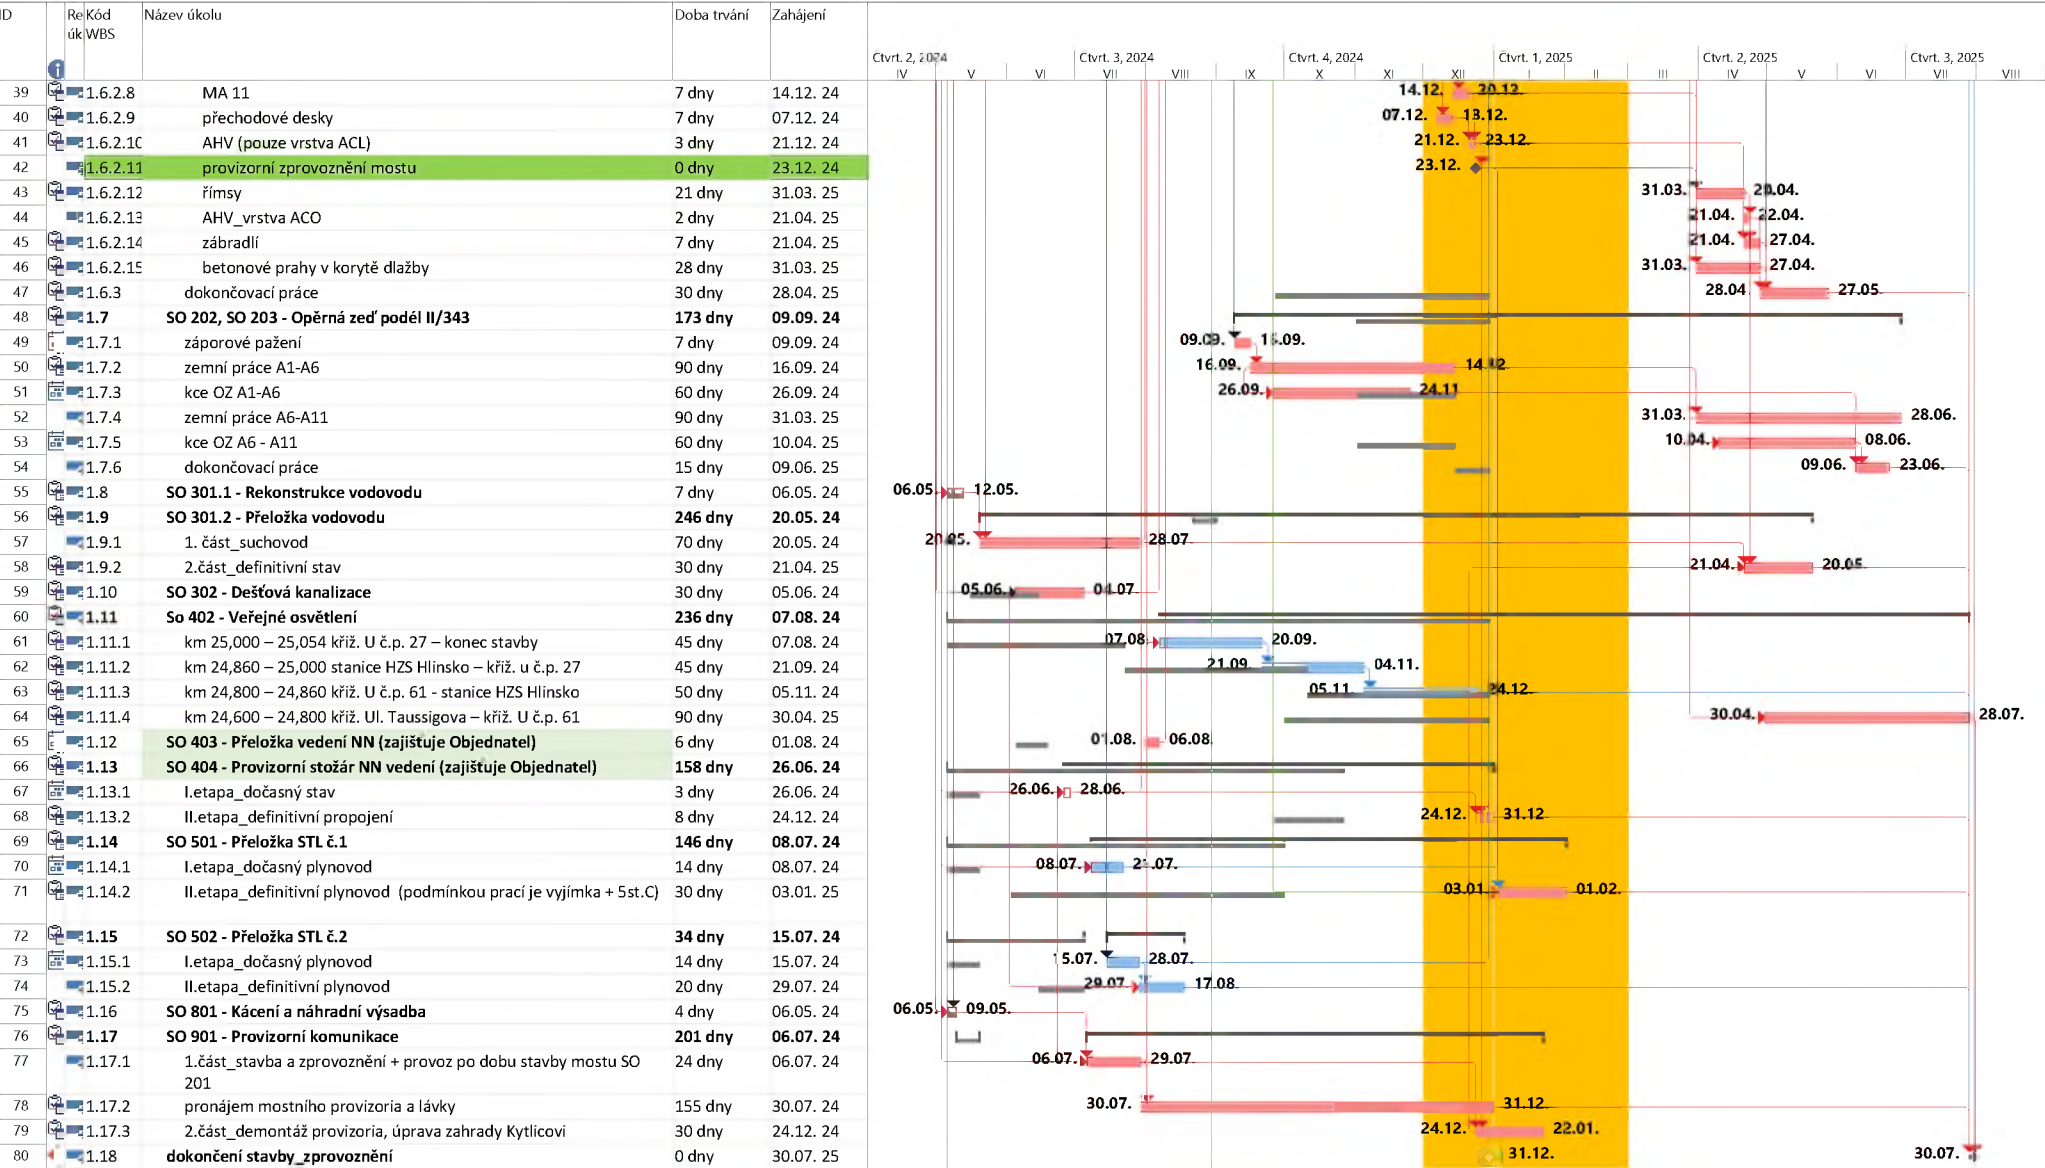

Projekt: Hlinsko_II.etapa_SP_v.04_zpoždění SO řady 400_SP_v.02

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Směrný plán

Milník podle směrného plánu

Souhrnný úkol směrného plánu

Průběh

EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2
Michle, 140 00 Praha 4

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice

Naše značka:
006/SUS/1198TSE

Vyřizuje/telefon:
[redacted] 26

V Jihlavě dne:
31. srpna 2024

Stavba: Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko, II. etapa

Věc: Zdůvodnění zpoždění realizace stavby

Související Pod-články Smlouvy: 6.1; 7.3; 8.3; 10.1

ZCELA DETAILNÍ CLAIM ZHOTOVITELE Č. 2
v souladu s Pod-článkem 10.3 Smluvních podmínek

Vážený pane,

Zhotovitel v návaznosti na zaslané oznámení předkládá Objednateli zcela detailní claim s uvedením všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu požadovaného prodloužení doby a požadované dodatečné platby.

Zhotovitel v předchozím oznámení upozornil na zpoždění způsobené stavebními pracemi, jejichž dodávka není předmětem zasmělných prací a jejichž realizace předchází realizací stavebních objektů nacházejících se od samého začátku na kritické cestě.

Zhotovitel pro přehlednost předkládá časový sled událostí, které přímo či nepřímo ovlivnily současně zpoždění celé stavby:

1. Podpis smlouvy na konci měsíce dubna 2024
2. Předání staveniště 6. 5. 2025 na základě výzvy Objednatele ze dne 30. 4. 2024
3. Zpoždění realizace přeložky NN – SO 403 a 404 ze strany ČEZ bylo z důvodu nevyřešených podkladů v DÚR, následně vedlo ke zpoždění vydání rozhodnutí o umístění stavby – Zhotovitel a ani Objednatel neměli možnost tento problém jakkoliv ovlivnit. Daná situace měla vliv na
 - zahájení prací na SO 102 v km25,000 – KÚ,
 - na termín demontáže stávající lávky pro pěší v SO 201.
 - Související zpoždění realizace suchovodů pro STL plynovod SO 501 a vodovod 301.2.
 - Další související zpoždění bylo v provádění propojů STL plynovodu, stanovený termín propojů GasNet 18. 7. respektive 11. 7. 2024
4. Pozdní vydání souhlasů k povolení propojů STL plynovodu v návaznosti na změnu schémat propojů stanovených správcem sítě GasNet. Nově požadovaná změna řešení schémat propojů na ZÚ a KÚ přeložky, a pozdní schválení výjimky ze strany GAsNet ze smlouvy o zajištění přeložky č. 4000252607.
 - toto způsobilo zpoždění realizaci vodovodu SO 301
 - a zpoždění dokončení přechodových oblastí provizorního mostu SO 901

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 1561

5. Změna způsobu pažení stavební jámy mostu SO 201 z důvodu zastižení skalního podloží GT3 v hloubkách od 5 m, úpravou technologie došlo k zvýšení časové náročnosti na tyto práce a ke zpoždění prací na zakládání mostu cca 10 dnů

Navržená opatření k zmírnění následků současného zpoždění realizace stavby:

- Provizorní zprovoznění stavby mostu SO 201 do konce roku 2024
- Realizace zimních opatření souvisejících s provizorními přeložkami STL plynovodu a vodovodu, (zajištění vytápěných stanů pro realizaci propojů vody a STL plynovodu, vytápěná hala pro skladování trubních materiálů)
- Realizace zimních opatření souvisejících s dopravou a údržbou (provizorní opravy povrchů komunikací a chodníků v místě staveniště)
- Demontáž provizorního mostu vč. demontáží opěr O1 a O2, demontáž lávky v případě souhlasu správce vodovodu a mostu s provizorním umístěním vodovodu do upravené horizontální polohy pod novou kci mostu SO 201
- Realizace přeložky STL plynovodu SO 501 (podmínkou je souhlas správce sítě GasNet a optimální teploty min. 5 st. C)
- Provádění stavebních objektů SO 201, 202, 203 v období nařízené ZTP 24/25 (podmínkou je souhlas SUSPK a optimální teploty min. 5 st. C a realizace záporového pažení, kterým dojde k zajištění polohy přeložených IS STL plynovodu a vodovodu, zajištění stability svahu, proti sesunutí svahu stavební jámy, zatíženého stavební technikou a veřejnou dopravou na PK)
- Projednání úpravy stanovení přechodného dopravního značení pro ZTP 24/25, prodloužení uzavírky pro rok 2025, realizace DIO dle rozhodnutí a stanovení

Zhotovitel tímto zdvořile žádá Objednatele o prodloužení Doby pro dokončení stavby a Doby pro uvedení stavby do provozu dle přiložené aktualizace Harmonogramu, současně Zhotovitel žádá o Pokyn k Variaci navržených opatření k zmírnění následků zpoždění. Náklady související se zpožděním a náklady na zmírňující opatření budou vyčísleny a zaslány do 14 dnů od doručení tohoto dopisu.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Za Zhotovitele


DN: cn=Tomáš Sedlák, o=EUROVIA CZ, a.s., ou=18002482,
email=tomas.sedlak@eurovia.cz
Reason: Schvaluji tento dokument.
Location: Kosovská 5517/20, 586 01 Jihlava
Date: 2024.09.13 12:06:27 +02'00'

Ing. Tomáš Sedlák, DiS.

Zástupce Zhotovitele a zaměstnanec EUROVIA CZ a.s.

Přílohy:

- HMG – směrný plán
- HMG – aktualizace č. 01

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 1561
