


ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	024	XI	XII	Čtvrt. 1, 2025	I	II	III	Čtvrt. 2, 2025	IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2025	VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2025	X	XI	XII	Čtvrt. 1, 2026	I	II	III	Čtvrt. 2, 2026	IV	V	VI
1			Rekonstrukce opěrné zdi v ŽST. Roudnice n.L.																																
2																																			
3			výluka nepřetržitá	218 dny	21.04. 25	24.11. 25																													
4			Zahájení stavby	0 dny	20.12. 24	20.12. 24																													
5																																			
6			SO 11-20-01, Opěrná zeď v ŽST. Roudnice n.L.	346 dny?	20.12. 24	30.11. 25																													
7																																			
8			1. Stavební postup - přípravné práce	122 dny?	20.12. 24	20.04. 25																													
9			Odstranění hnízd, zasíťování konzol	31 dny?	06.01. 25	05.02. 25																													
10			VTD - zpracování a schválení	36 dny?	20.12. 24	24.01. 25		11																											
11			Výroba chodníkových prefabrikátů a zábradlí	86 dny?	25.01. 25	20.04. 25	10																												
12			kácení dřevin	15 dny	15.01. 25	29.01. 25																													
13																																			
14			2. Stavební postup - Stavební práce bez výluky	230 dny?	15.04. 25	30.11. 25																													
15			postupná stavba lešení podél zdi	230 dny	15.04. 25	30.11. 25																													
16			celoplošné otryskání zdi	99 dny	25.05. 25	31.08. 25																													
17			hloubkové spárování zdiva pilířů	183 dny?	01.06. 25	30.11. 25																													
18			celoplošná sanace zdi	230 dny?	15.04. 25	30.11. 25																													
19			odláždění a terénní úpravy	122 dny?	01.08. 25	30.11. 25																													
20																																			
21			3. Stavební postup - Stavební práce ve výluce	218 dny?	21.04. 25	24.11. 25																													
22			I. Etapa	133 dny	21.04. 25	31.08. 25																													
23			dmt žel svršku a spodku	7 dny	21.04. 25	27.04. 25		24																											
24			bourání stav. Žlb. římsy	30 dny	28.04. 25	27.05. 25	23	25FS-28 dny																											
25			kotvení říms, bednění, armatūra	90 dny	30.04. 25	28.07. 25	24FS-28 dn	26FS-70 dny																											
26			betonáž říms	85 dny	20.05. 25	12.08. 25	25FS-70 dn	27FS-50 dny																											
27			mont chodníkových desek a zábradlí	55 dny	24.06. 25	17.08. 25	26FS-50 dn	28FS-5 dny																											
28			hydroizolace	12 dny	13.08. 25	24.08. 25	27FS-5 dny	29																											
29			zásypy, konstrukční vrstvy	7 dny	25.08. 25	31.08. 25	28	32																											
30																																			
31			II. Etapa	85 dny?	01.09. 25	24.11. 25																													
32			úprava TV a SSZ	1 den?	01.09. 25	01.09. 25	29	33																											
33			dmt žel svršku a spodku	5 dny	02.09. 25	06.09. 25	32	34																											
34			bourání stav. Žlb. římsy	15 dny	07.09. 25	21.09. 25	33	35FS-10 dny																											
35			kotvení říms, bednění, armatūra	39 dny	12.09. 25	20.10. 25	34FS-10 dn	36FS-35 dny																											
36			betonáž říms	39 dny	16.09. 25	24.10. 25	35FS-35 dn	37FS-5 dny																											
37			mont chodníkových desek a zábradlí	12 dny	20.10. 25	31.10. 25	36FS-5 dny	38																											
38			hydroizolace	5 dny	01.11. 25	05.11. 25	37	39																											
39			zásypy, konstrukční vrstvy	8 dny	06.11. 25	13.11. 25	38	40																											
40			mont žel svršku	6 dny	14.11. 25	19.11. 25	39	41																											
41			úprava TV a SSZ	3 dny	20.11. 25	22.11. 25	40	42																											
42			kontrolní prohlídka a uvedení do provozu	2 dny	23.11. 25	24.11. 25	41																												
43																																			
44			Dokončení stavebních prací	365 dny	20.12. 24	19.12. 25																													
45																																			
46			Dokončení díla	476 dny	20.12. 24	19.05. 26																													

</

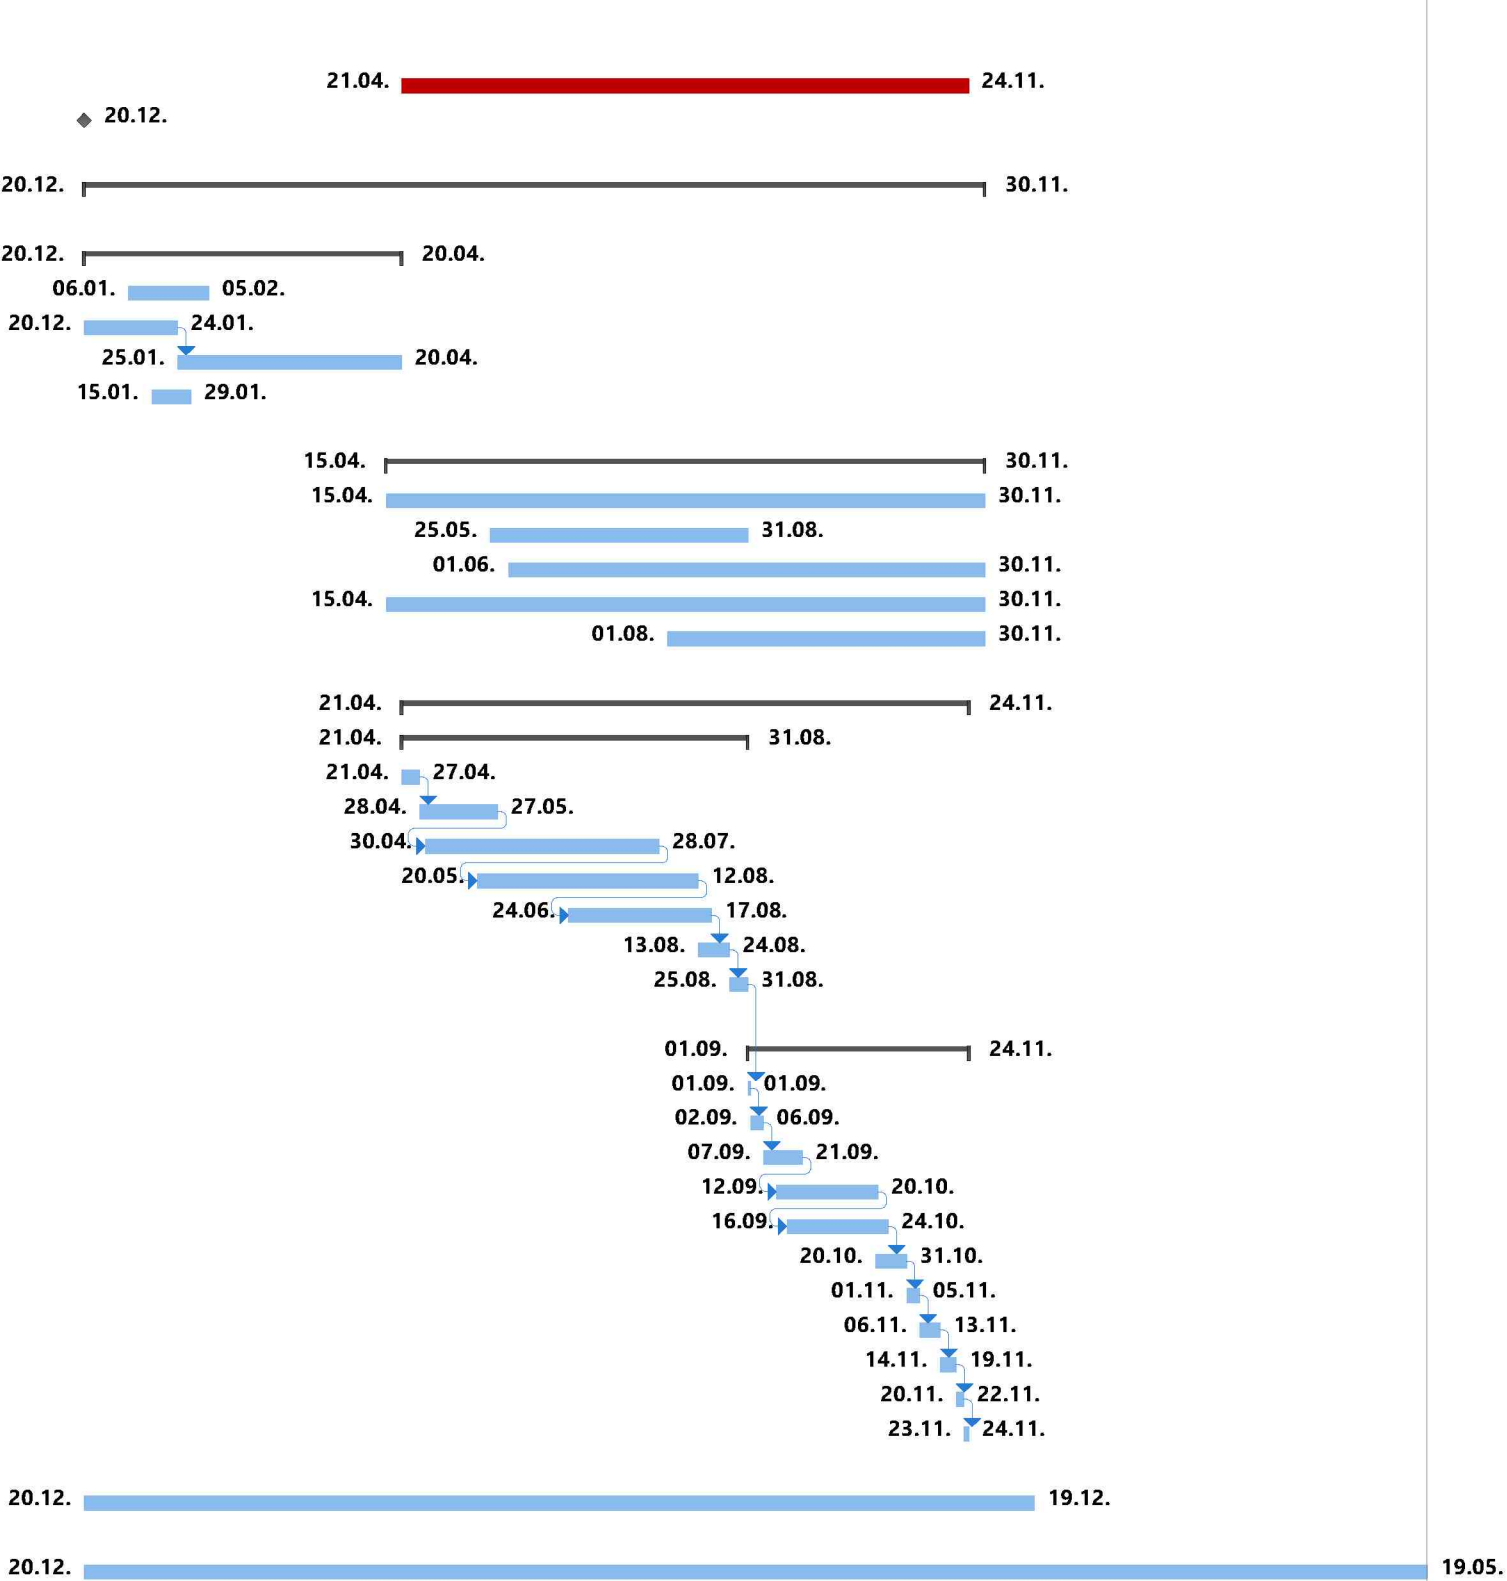

Finanční harmonogram																
Měsíc:	12. 2024	01. 2025	02. 2025	03. 2025	04. 2025	05. 2025	06. 2025	07. 2025	08. 2025	09. 2025	10. 2025	11. 2025	12. 2025	01. 2026	02. 2026	03. 2026
Kč:																
Celkem:	69.915.147,46 Kč															
