


	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časová rezerva dokončení
1	HMG EXPOZICE ARKTYDY – LEDNÍ MEDVĚDI	1276 dny	14.01.2025	12.07.2028	0 dny
2	Přehled milníků	1126 dny	14.04.2025	14.05.2028	60 dny
3	Kácení	0 dny	14.04.2025	14.04.2025	1186 dny
4	Demolice výhledu lehnarů a klanů	0 dny	14.04.2025	14.04.2025	1186 dny
5	Výbudování provozních průchozů staveništěm pro veřejnost, a to včetně Jetení lávky	0 dny	12.11.2025	12.11.2025	974 dny
6	Zkoušky vodotěsnosti zhotovených altů	0 dny	12.11.2027	12.11.2027	243 dny
7	Osazení skel	0 dny	12.02.2028	12.02.2028	152 dny
8	Individuální a komplexní zkoušky pro klíčové technologie	0 dny	14.05.2028	14.05.2028	60 dny
9	Přehled funkčních zkoušek	1216 dny	14.01.2025	14.05.2028	60 dny
10	SO 01a	0 dny	11.02.2028	11.02.2028	152 dny
11	SO 01b	0 dny	11.02.2028	11.02.2028	152 dny
12	SO 07a	0 dny	12.08.2027	12.08.2027	335 dny
13	SO 10	0 dny	13.10.2026	13.10.2026	1276 dny
14	SO 12	0 dny	13.10.2026	13.10.2026	1276 dny
15	SO 13a	0 dny	13.10.2026	13.10.2026	638 dny
16	SO 13b	0 dny	13.10.2026	13.10.2026	638 dny
17	SO 13c	0 dny	13.10.2026	13.10.2026	638 dny
18	IO 01	0 dny	12.11.2027	12.11.2027	243 dny
19	IO 02	0 dny	12.11.2027	12.11.2027	243 dny
20	IO 03	0 dny	12.11.2027	12.11.2027	243 dny
21	IO 04	0 dny	12.11.2027	12.11.2027	243 dny
22	IO 05	0 dny	12.11.2027	12.11.2027	243 dny
23	IO 06	0 dny	12.11.2027	12.11.2027	243 dny
24	IO 07	0 dny	12.04.2028	12.04.2028	822 dny
25	Finální funkční zkoušky pro TZB a technologie	0 dny	14.05.2028	14.05.2028	60 dny
26	Připravné práce	17 dny	14.01.2025	30.01.2025	0 dny
27	Podpis SoD	0 dny	14.01.2025	14.01.2025	0 dny
28	Předání staveniště	1 den	22.01.2025	22.01.2025	0 dny
28	Úzeň 1 - Předání staveniště	0	22.01.2025	22.01.2025	0 dny
29	Zařízení staveniště	14 dny	22.01.2025	30.01.2025	0 dny
29	Úzeň 2 - Zařízení staveniště	0	30.01.2025	30.01.2025	0 dny
30	Etapizace dle ZOV	1259 dny	31.01.2025	12.07.2028	0 dny
31	Etapa 1	104 dny	31.01.2025	14.05.2025	0 dny
31	Úzeň 3 - Etapa 1	0	14.05.2025	14.05.2025	0 dny
32	Etapa 2	213 dny	15.05.2025	13.12.2025	0 dny
32	Úzeň 4 - Etapa 2	0	13.12.2025	13.12.2025	0 dny
33	Etapa 3	517 dny	14.12.2025	14.05.2027	0 dny
33	Úzeň 5- Etapa 3	0	14.05.2027	14.05.2027	0 dny
34	Etapa 4	90 dny	15.05.2027	12.08.2027	0 dny
34	Úzeň 6 - Etapa 4	0	12.08.2027	12.08.2027	0 dny
35	Etapa 5	183 dny	13.08.2027	11.02.2028	0 dny
35	Úzeň 7 - Etapa 5	0	11.02.2028	11.02.2028	0 dny
36	Etapa 6	152 dny	12.02.2028	12.07.2028	0 dny
36	Úzeň 8 - Etapa 6	0	12.07.2028	12.07.2028	0 dny
37	Stavební část	1272 dny	18.01.2025	12.07.2028	0 dny
38	Stavební část – seznam stavebních objektů (SO)	1272 dny	18.01.2025	12.07.2028	0 dny
39	SO 01a Ubikace ledních medvědů - samec	183 dny	13.08.2027	11.02.2028	0 dny
40	HSV	90 dny	13.08.2027	10.11.2027	0 dny
40	Úzeň 9 - HSV	0	10.11.2027	10.11.2027	0 dny
41	PSV	90 dny	12.10.2027	08.01.2028	0 dny
41	Úzeň 10 - PSV	0	08.01.2028	08.01.2028	0 dny
42	TZB včetně funkčních zkoušek	80 dny	14.12.2027	11.02.2028	0 dny
42	Úzeň 11 - TZB včetně funkčních zkoušek	0	11.02.2028	11.02.2028	0 dny
43	SO 01b Ubikace ledních medvědů - samice	183 dny	13.08.2027	11.02.2028	152 dny
44	HSV	90 dny	13.08.2027	10.11.2027	152 dny
45	PSV	90 dny	12.10.2027	08.01.2028	152 dny
46	TZB včetně funkčních zkoušek	80 dny	14.12.2027	11.02.2028	152 dny
47	SO 02 Lední medvědi – rezervní výběh + bazén	183 dny	13.08.2027	11.02.2028	152 dny
47	HSV	90 dny	13.08.2027	10.11.2027	152 dny
48	PSV	90 dny	11.11.2027	11.02.2028	152 dny
50	SO 03 Lední medvědi – výběh samec	335 dny	12.09.2026	12.08.2027	0 dny
51	HSV	250 dny	12.09.2026	19.05.2027	0 dny
51	Úzeň 12 - HSV	0	19.05.2027	19.05.2027	0 dny
52	PSV	120 dny	15.04.2027	12.08.2027	0 dny
52	Úzeň 13 - PSV	0	12.08.2027	12.08.2027	0 dny
53	SO 04 Lední medvědi – bazén samec	245 dny	12.09.2026	14.05.2027	425 dny
54	HSV	180 dny	12.09.2026	10.03.2027	425 dny
55	PSV	120 dny	15.01.2027	14.05.2027	425 dny
56	SO 05 Lední medvědi – bazén samec	245 dny	12.09.2026	14.05.2027	425 dny
57	HSV	180 dny	12.09.2026	10.03.2027	425 dny
58	PSV	120 dny	15.01.2027	14.05.2027	425 dny
59	SO 06 Lední medvědi – výběh samice	335 dny	12.09.2026	12.08.2027	335 dny
60	HSV	250 dny	12.09.2026	19.05.2027	335 dny
61	PSV	120 dny	15.04.2027	12.08.2027	335 dny
62	SO 07a, SO 07b Bystřina, čerpací stanice pro bystřinu	182 dny	12.02.2027	12.08.2027	335 dny
63	HSV	100 dny	12.02.2027	22.09.2027	335 dny
64	PSV	70 dny	23.04.2027	01.07.2027	335 dny
65	TZB včetně funkčních zkoušek	70 dny	04.06.2027	12.08.2027	335 dny
66	SO 08 Lední medvědi – bazén samice	245 dny	12.09.2026	14.05.2027	425 dny
67	HSV	180 dny	12.09.2026	10.03.2027	425 dny
68	PSV	120 dny	15.01.2027	14.05.2027	425 dny
69	SO 09 Vyhledková rampa, terasa B, průhledy A+B	65 dny	12.09.2026	15.11.2026	605 dny
70	HSV	60 dny	12.09.2026	10.11.2026	605 dny
71	PSV	60 dny	17.09.2026	15.11.2026	605 dny
72	SO 10 Expozice pod vodou	304 dny	14.12.2025	13.10.2026	0 dny
73	HSV	150 dny	14.12.2025	12.05.2026	0 dny
73	Úzeň 14 - HSV	0	12.05.2026	12.05.2026	0 dny
74	PSV	120 dny	29.03.2026	26.07.2026	0 dny
74	Úzeň 15 - PSV	0	26.07.2026	26.07.2026	0 dny
75	TZB včetně funkčních zkoušek	120 dny	16.06.2026	13.10.2026	0 dny
75	Úzeň 16 - TZB včetně funkčních zkoušek	0	13.10.2026	13.10.2026	0 dny
76	SO 11a Expozice tuleňů – bazén A	304 dny	14.12.2025	13.10.2026	638 dny
77	HSV	230 dny	14.12.2025	31.07.2026	638 dny
78	PSV	130 dny	06.06.2026	13.10.2026	638 dny



79	SO 11b Expozice tůleňů – bazén B	304 dny	14.12.2025	13.10.2026	638 dny
80	HSV	230 dny	14.12.2025	31.07.2026	638 dny
81	PSV	130 dny	06.06.2026	13.10.2026	638 dny
82	SO 12 Venkovní terasa vč. Sezónního baru	230 dny	14.12.2025	31.07.2026	712 dny
83	HSV	140 dny	14.12.2025	02.05.2026	712 dny
84	PSV	120 dny	03.04.2026	31.07.2026	712 dny
86	SO 13a Občerstvení, zázemí, technologie	304 dny	14.12.2025	13.10.2026	638 dny
87	HSV	140 dny	14.12.2025	02.05.2026	638 dny
88	PSV	120 dny	03.04.2026	31.07.2026	638 dny
89	TZB včetně funkčních zkoušek	120 dny	16.06.2026	13.10.2026	638 dny
90	SO 13b Zázemí tůleňů	304 dny	14.12.2025	13.10.2026	638 dny
91	HSV	160 dny	14.12.2025	12.05.2026	638 dny
92	PSV	120 dny	29.03.2026	26.07.2026	638 dny
93	TZB včetně funkčních zkoušek	120 dny	16.06.2026	13.10.2026	638 dny
94	SO 13c Technologie	304 dny	14.12.2025	13.10.2026	199 dny
95	HSV	100 dny	14.12.2025	29.03.2026	199 dny
96	PSV	50 dny	22.02.2026	12.04.2026	199 dny
97	TZB včetně funkčních zkoušek	200 dny	28.03.2026	13.10.2026	199 dny
98	SO 14 Zpevněné plochy (cesty, rampy, zásobování)	182 dny	13.01.2026	05.07.2026	0 dny
99	Zpevněné plochy, cesty	182 dny	13.01.2026	05.07.2026	0 dny
100	SO 15 Sružený objekt retenčních nádrží	182 dny	13.05.2025	12.11.2025	31 dny
101	Stavební práce	150 dny	15.05.2025	11.10.2025	0 dny
101	Úzel 17 - Stavební práce	0	11.10.2025	11.10.2025	0 dny
102	Vytrojení	40 dny	04.10.2025	12.11.2025	31 dny
103	SO 16 Opěrná zeď č.1	730 dny	14.12.2025	13.12.2027	212 dny
104	Zemní práce	247 dny	14.12.2025	13.12.2027	212 dny
105	ŽBK konstrukce	700 dny	13.01.2026	13.12.2027	212 dny
106	SO 17 Opěrná zeď č.2	60 dny	13.08.2027	11.10.2027	275 dny
107	Zemní práce	20 dny	13.08.2027	01.09.2027	275 dny
108	ŽBK konstrukce	80 dny	23.08.2027	11.10.2027	275 dny
109	SO 18 Opěrná zeď č.3	90 dny	14.12.2025	13.03.2026	852 dny
110	Zemní práce	60 dny	14.12.2025	11.02.2026	852 dny
111	ŽBK konstrukce	60 dny	13.01.2026	13.03.2026	852 dny
112	SO 19 Opěrná zeď č.4	32 dny	14.12.2025	14.01.2026	910 dny
113	Zemní práce	10 dny	14.12.2025	23.12.2025	910 dny
114	ŽBK konstrukce	25 dny	21.12.2025	14.01.2026	910 dny
115	SO 21 Sadové úpravy a závlahy	1216 dny	15.03.2025	05.07.2026	0 dny
116	Kácení	31 dny	15.03.2025	14.04.2025	1186 dny
117	Sadové úpravy	183 dny	12.01.2026	05.07.2026	0 dny
117	Úzel16 - Sadové úpravy	0	05.07.2026	05.07.2026	0 dny
118	SO 22 Zajištění svahu proti sesuvu	607 dny	14.12.2025	12.08.2027	335 dny
119	SO 23 Terénní úpravy	1272 dny	18.01.2025	12.07.2026	0 dny
120	Provizorní komunikace	25 dny	18.01.2025	11.02.2025	0 dny
120	Úzel 19 - Provizorní komunikace	0	11.02.2025	11.02.2025	0 dny
121	Demolice stávajících objektů	74 dny	31.01.2025	14.04.2025	0 dny
121	Úzel 20 - Demolice stávajících objektů	0	14.04.2025	14.04.2025	0 dny
122	Zemní práce	1004 dny	16.04.2025	13.01.2026	0 dny
122	Úzel 21 - Zemní práce	0	13.01.2026	13.01.2026	0 dny
123	Modelace terénu	640 dny	12.10.2026	12.07.2026	0 dny
123	Úzel 22 - Modelace terénu	0	12.07.2026	12.07.2026	0 dny
124	SO 24 Expoziční doplňky	244 dny	11.11.2027	05.07.2028	1 den
125	Realizace	244 dny	11.11.2027	05.07.2028	1 den
125	Úzel 23 - Realizace	0	05.07.2028	05.07.2028	1 den
126	SO 25 Amfiteatr	517 dny	14.12.2025	14.05.2027	425 dny
127	SO 26 Geotermální vrtý a navazující trubní trasy	108 dny	27.07.2025	12.11.2025	973,88 dny
128	SO 27 Jelení lávka	273 dny	15.03.2025	12.12.2025	943 dny
129	Realizace lávky	243 dny	15.03.2025	12.11.2025	943 dny
130	Kolaudace jelení lávky	30 dny	13.11.2025	12.12.2025	943 dny
131	Stavební část – seznam inženýrských objektů (IO)	1004 dny	12.02.2025	12.11.2027	243 dny
132	Provizorní napojení/přelozky	92 dny	12.02.2025	14.05.2025	1155 dny
133	IO 01 Jednotná kanalizace	912 dny	15.05.2025	12.11.2027	243 dny
134	Realizace hlavníh/páteřních rozvodů	882 dny	15.05.2025	13.10.2027	243 dny
135	Dokončení včetně funkčních zkoušek	30 dny	14.10.2027	12.11.2027	243 dny
136	IO 02 Dešťová kanalizace	912 dny	15.05.2025	12.11.2027	243 dny
137	Realizace hlavníh/páteřních rozvodů	882 dny	15.05.2025	13.10.2027	243 dny
138	Dokončení včetně funkčních zkoušek	30 dny	14.10.2027	12.11.2027	243 dny
139	IO 03 Technologické kanalizační trubní trasy	912 dny	15.05.2025	12.11.2027	243 dny
140	Realizace hlavníh/páteřních rozvodů	882 dny	15.05.2025	13.10.2027	243 dny
141	Dokončení včetně funkčních zkoušek	30 dny	14.10.2027	12.11.2027	243 dny
142	IO 04 Trubní rozvody pitné vody	912 dny	15.05.2025	12.11.2027	243 dny
143	Realizace hlavníh/páteřních rozvodů	882 dny	15.05.2025	13.10.2027	243 dny
144	Dokončení včetně funkčních zkoušek	30 dny	14.10.2027	12.11.2027	243 dny
145	IO 05 Trubní rozvody provozní vody	912 dny	15.05.2025	12.11.2027	243 dny
146	Realizace hlavníh/páteřních rozvodů	882 dny	15.05.2025	13.10.2027	243 dny
147	Dokončení včetně funkčních zkoušek	30 dny	14.10.2027	12.11.2027	243 dny
148	IO 06 Kabelové trasy	912 dny	15.05.2025	12.11.2027	30 dny
149	Realizace hlavníh/páteřních rozvodů	882 dny	15.05.2025	13.10.2027	30 dny
150	Dokončení včetně funkčních zkoušek	30 dny	14.10.2027	12.11.2027	30 dny
151	IO 07 Trubní rozvody - plynovod	90 dny	13.01.2026	12.04.2026	822 dny
152	Realizace hlavníh/páteřních rozvodů	60 dny	13.01.2026	13.03.2026	822 dny
153	Dokončení včetně funkčních zkoušek	30 dny	14.03.2026	12.04.2026	822 dny
154	Technologická část stavby – seznam provozních objektů (PS). Realizace včetně kompletací	974 dny	12.11.2025	12.07.2026	0 dny
155	PS 01 Strojovna pro úpravu vody medvědí	365 dny	13.10.2026	12.10.2027	0 dny
155	Úzel 24 - PS 01 Strojovna pro úpravu vody medvědí	0	12.10.2027	12.10.2027	0 dny
156	PS 02 Ledovnače	80 dny	11.02.2026	30.04.2026	73 dny
157	PS 03 Strojovna pro úpravu vody tůleňů	365 dny	13.10.2026	12.10.2027	204 dny
158	PS 04 Společná technologie pro zázemí	365 dny	13.10.2026	12.10.2027	204 dny
159	PS 05 Retenční nádrže	245 dny	12.11.2025	14.07.2026	729 dny
160	PS 06 Chemické hospodářství	365 dny	13.10.2026	12.10.2027	0 dny
160	Úzel 25 - PS 06 Chemické hospodářství	0	12.10.2027	12.10.2027	0 dny
161	PS 07 Elektro-technologická část	325 dny	15.06.2027	04.05.2028	0 dny
161	Úzel 26 - PS 07 Elektro-technologická část	0	04.05.2028	04.05.2028	0 dny
162	PS 08 SRTp	325 dny	15.06.2027	04.05.2028	0 dny
162	Úzel 27 - PS 08 SRTp	0	04.05.2028	04.05.2028	0 dny
163	Dokončení technologické části a kompletace	70 dny	04.05.2028	05.07.2028	0 dny
163	Úzel 28 - Dokončení technologické části a kompletace	0	05.07.2028	05.07.2028	0 dny

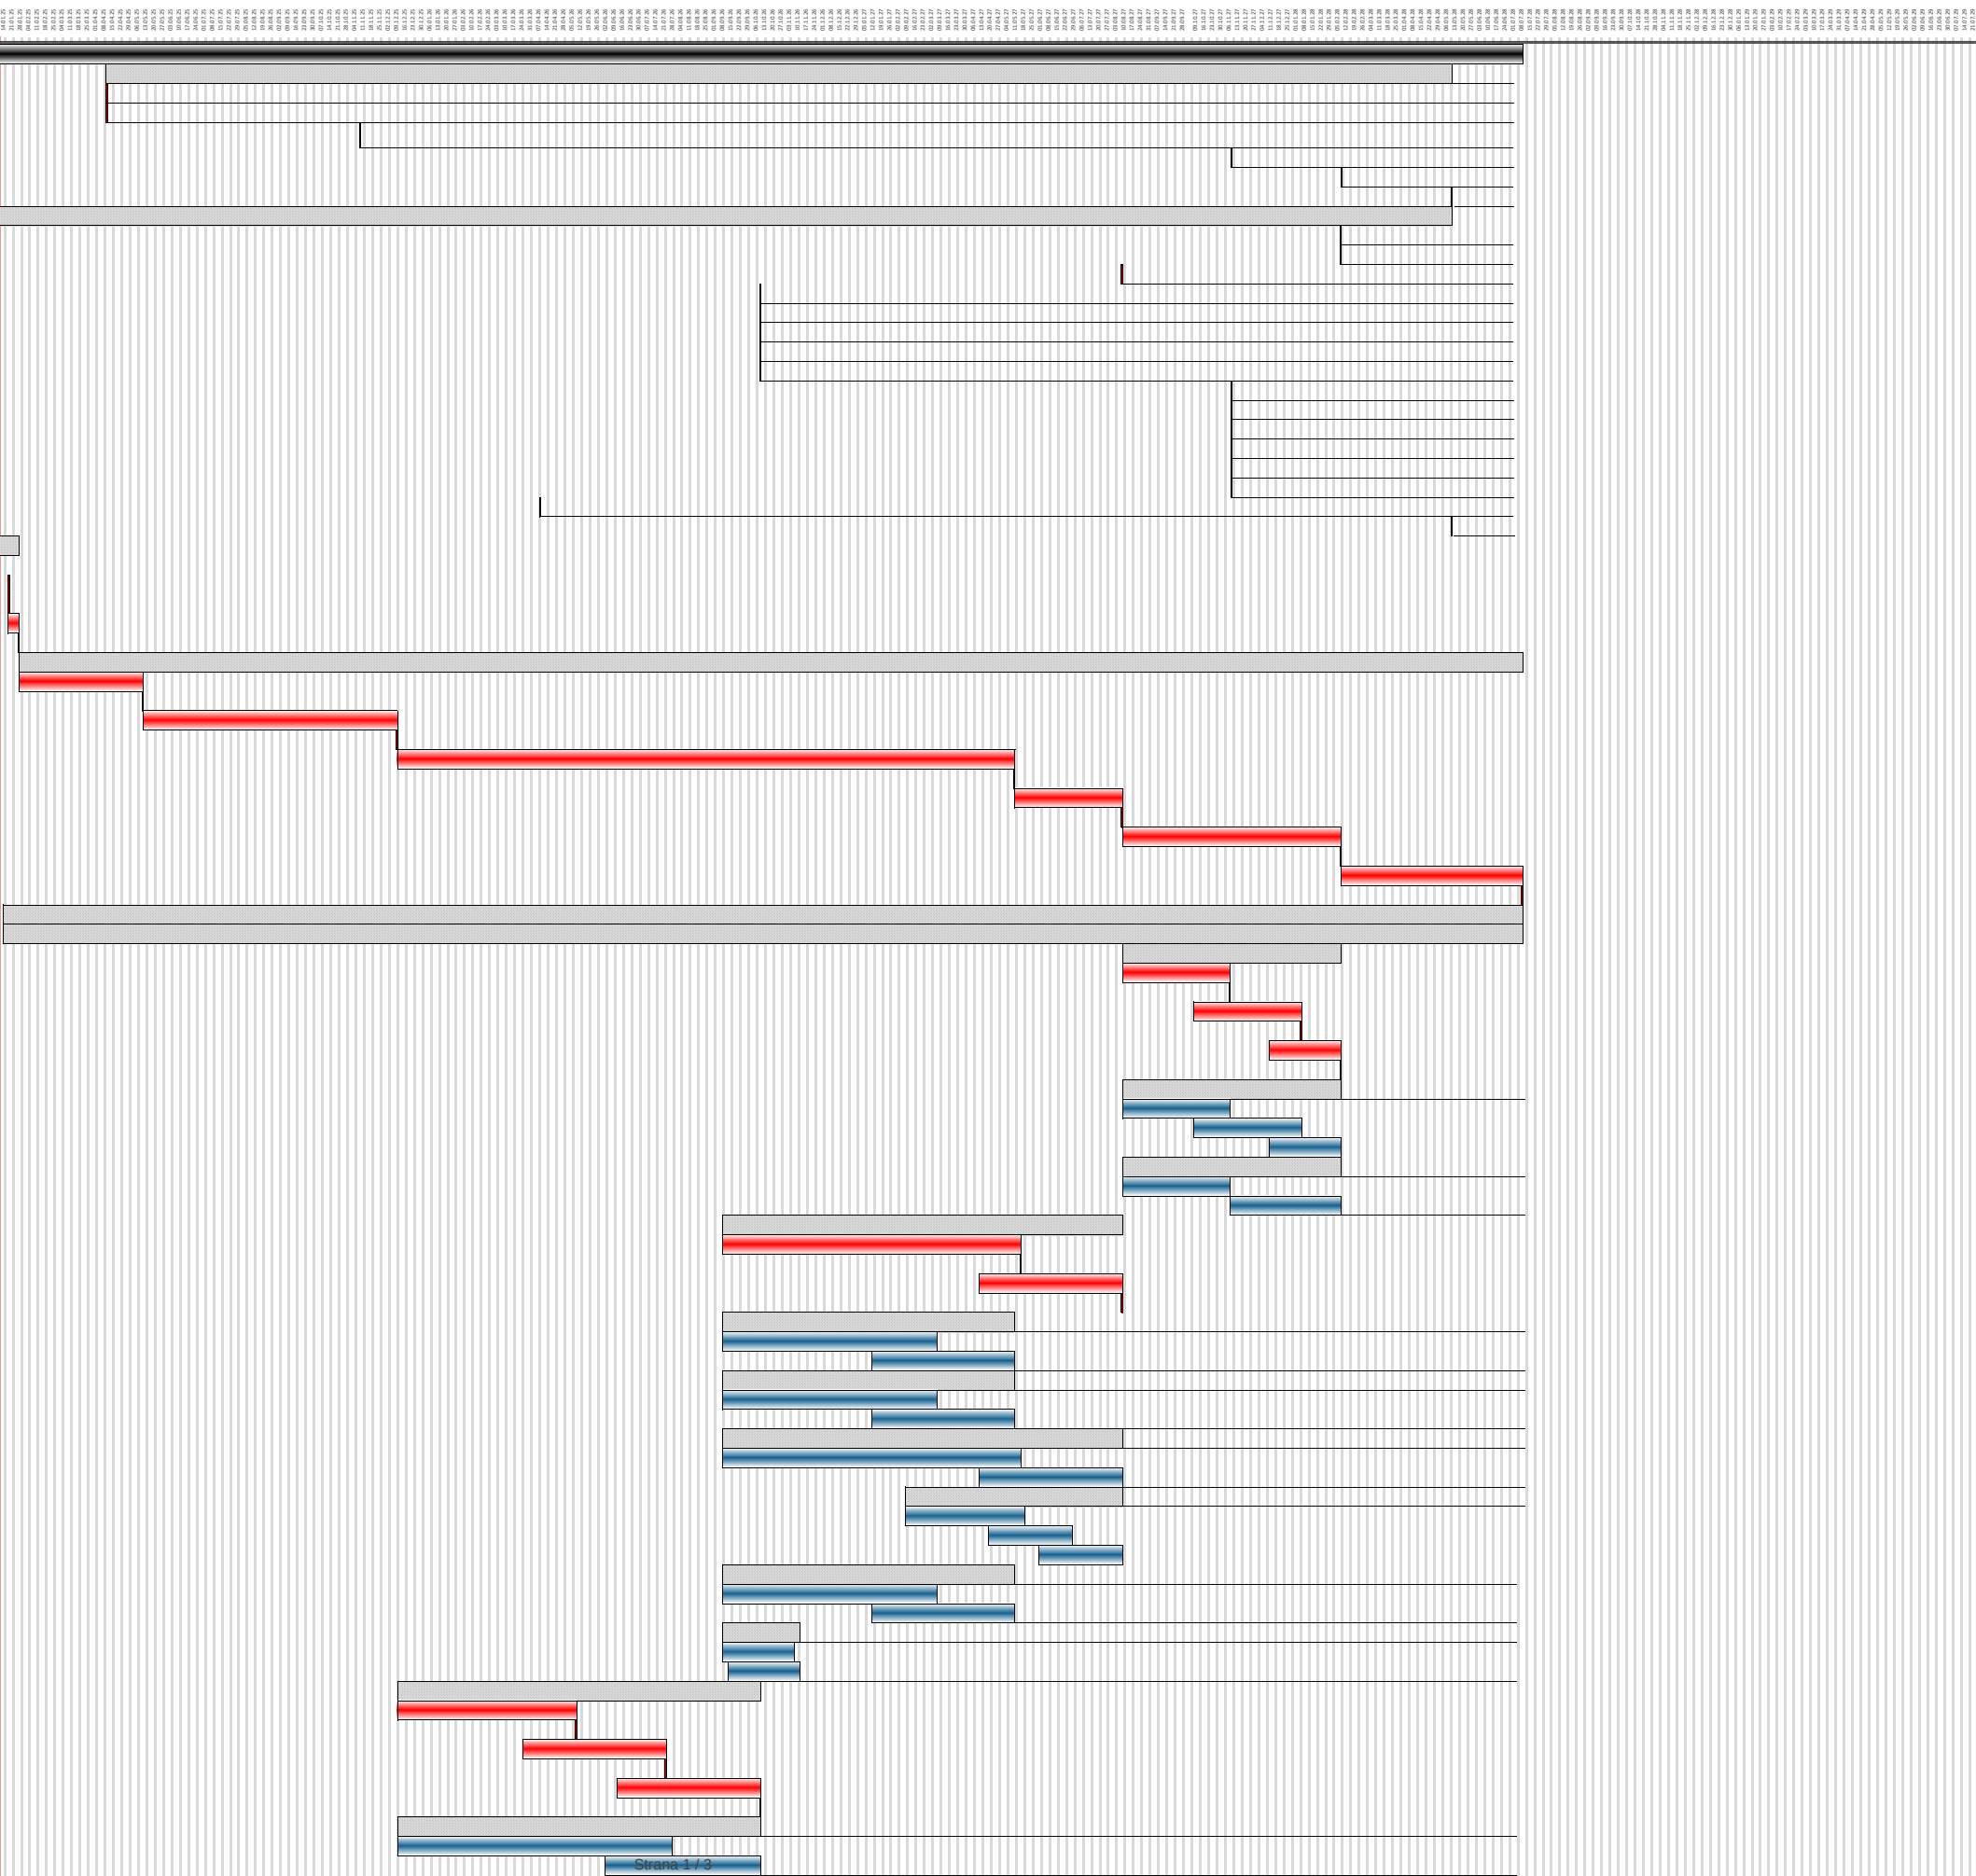

164	Dokončení a předání díla	120 dny	15.03.2028	12.07.2028	0 dny	
165	Finální funkční zkoušky pro TZB a technologie	60 dny	15.03.2028	14.05.2028	60 dny	
166	Závěrečné převzetí díla	0 dny	12.07.2028	12.07.2028	0 dny	
167	Kolaudační řízení	60 dny	14.05.2028	12.07.2028	0 dny	
167	Uzel 29 - Kolaudační řízení	0	12.07.2028	12.07.2028	0 dny	
168	Zkušební provoz (není započteno v době realizace)					

