

Harmonogram stavby: 0108 Demolice přístavby - Moravská

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac. dní	Prům. počet prac.				
								10	11	12	13
0108	Demolice přístavby - Moravská	10.02.2025	14.03.2025	616 536	1 658	25	1	96	88	82	69
0108	Demolice - Moravská, Aš	10.02.2025	14.03.2025	616 536	1 658	25	1	96	88	82	69
108	Demolice přístavku - Moravská	10.02.2025	14.03.2025	616 536	1 658	25	1	96	88	82	69
1	Zemní práce	10.02.2025	26.02.2025	64 881	96	13	1	6	6	6	6
94	Lešení a stavební výtahy	10.02.2025	17.02.2025	6 762	42	6	1	5	5	5	5
96	Bourání konstrukcí	10.02.2025	14.03.2025	130 749	416	25	1	13	13	13	13
97	Prorážení otvorů	10.02.2025	12.02.2025	101 128	17	3	1	6	6	6	
98	Demolice	10.02.2025	14.03.2025	240 978	814	25	1	25	25	25	25
99	Staveništní přesun hmot	10.02.2025	07.03.2025	36 692	157	20	1	6	6	6	6
712	Živičné krytiny	10.02.2025	11.02.2025	4 349	13	2	1	6	6		
713	Izolace tepelné	10.02.2025	14.02.2025	4 985	38	5	1	8	8	8	8
725	Zařizovací předměty	10.02.2025	10.02.2025	744	5	1	1	5			
762	Konstrukce tesařské	10.02.2025	14.02.2025	5 410	35	5	1	7	7	7	7
764	Konstrukce klempířské	10.02.2025	12.02.2025	1 939	23	3	1	8	8	8	
766	Konstrukce truhlářské	10.02.2025	10.02.2025	362	3	1	1	3			
VN	Vedlejší náklady	10.02.2025	10.02.2025	17 557	0	1	1	0			
	Nh za měsíc										
	Nh za rok										

únor 2025

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
69	54	54	54	49	49	49	49	49	49	49	49	49	43	43
69	54	54	54	49	49	49	49	49	49	49	49	49	43	43
69	54	54	54	49	49	49	49	49	49	49	49	49	43	43
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
5	5	5	5											
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8														
7														
1 094														
1 658														

březen 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	43	43	43	43	43	37	37	37	37	37	37	37
43	43	43	43	43	43	43	37	37	37	37	37	37	37
43	43	43	43	43	43	43	37	37	37	37	37	37	37
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
6	6	6	6	6	6	6	6						


564

Harmonogram stavby: 0108 Demolice přístavby - Moravská

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac.	Prům. počet	2 025	
								únor	březen
0108	Demolice přístavby - Moravská	10.02.2025	14.03.2025	616 536	1 658	25	1	448 955	167 581
0108	Demolice - Moravská, Aš	10.02.2025	14.03.2025	616 536	1 658	25	1	448 955	167 581
108	Demolice přístavku - Moravská	10.02.2025	14.03.2025	616 536	1 658	25	1	448 955	167 581
1	Zemní práce	10.02.2025	26.02.2025	64 881	96	13	1	64 881	
94	Lešení a stavební výtahy	10.02.2025	17.02.2025	6 762	42	6	1	6 762	
96	Bourání konstrukcí	10.02.2025	14.03.2025	130 749	416	25	1	75 280	55 469
97	Prorážení otvorů	10.02.2025	12.02.2025	101 128	17	3	1	101 128	
98	Demolice	10.02.2025	14.03.2025	240 978	814	25	1	138 745	102 233
99	Staveništní přesun hmot	10.02.2025	07.03.2025	36 692	157	20	1	26 814	9 879
712	Živičné krytiny	10.02.2025	11.02.2025	4 349	13	2	1	4 349	
713	Izolace tepelné	10.02.2025	14.02.2025	4 985	38	5	1	4 985	
725	Zařizovací předměty	10.02.2025	10.02.2025	744	5	1	1	744	
762	Konstrukce tesařské	10.02.2025	14.02.2025	5 410	35	5	1	5 410	
764	Konstrukce klempířské	10.02.2025	12.02.2025	1 939	23	3	1	1 939	
766	Konstrukce truhlářské	10.02.2025	10.02.2025	362	3	1	1	362	
VN	Vedlejší náklady	10.02.2025	10.02.2025	17 557	0	1	1	17 557	
	Cena za měsíc							448 955	167 581
	Cena za rok							616 536	

Finanční harmonogram

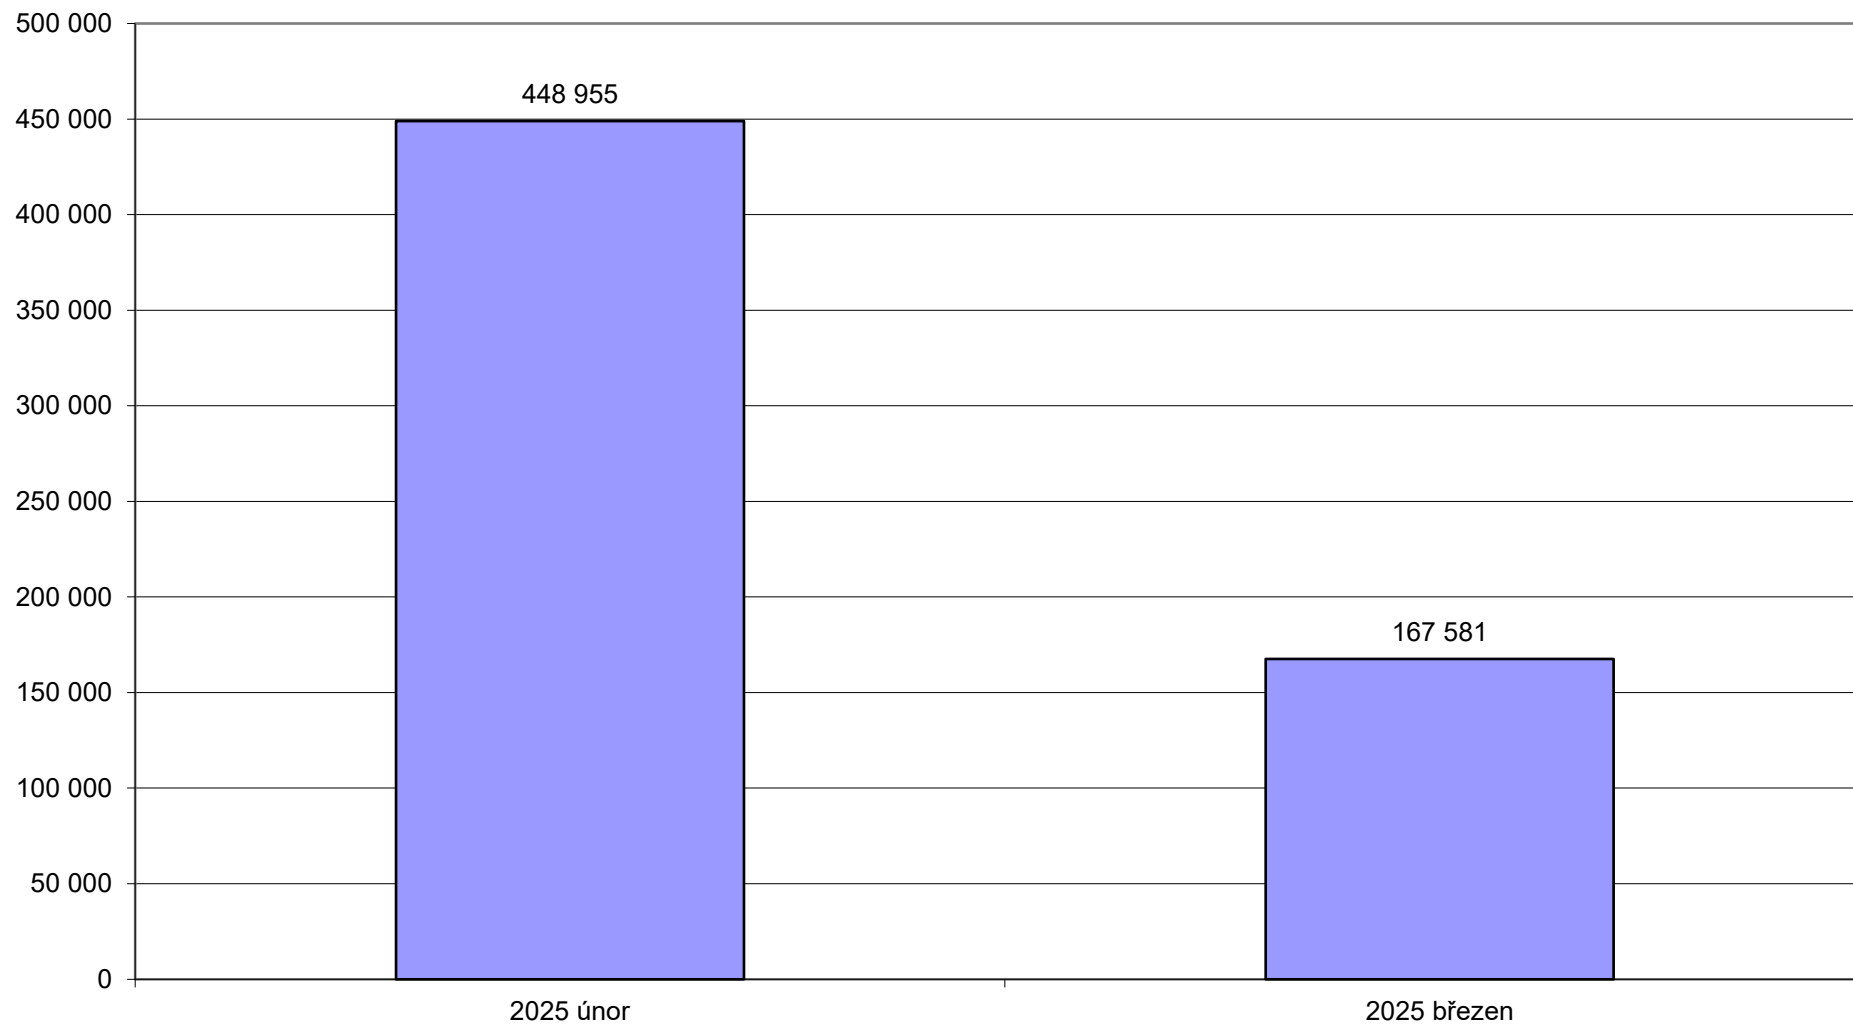

Součtový finanční harmonogram

