


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	25	S	Č	P	S	N
1	Rekonstrukce prostor pro laboratoře FŽP (stavební práce + interiérové vybavení) - 2025/005	289 dny	23.09. 25	30.10. 26						
2										
3	 Nabytí účinnosti smlouvy+10 dní	1 den	22.09. 25	22.09. 25						
4	Oznámení o zahájení stavebních prací stavebnímu úřadu	1 den	23.09. 25	23.09. 25						
5	Převzetí staveniště+10 dní	1 den	02.10. 25	02.10. 25						
6	Zahájení stavby	1 den	14.10. 25	14.10. 25						
7	Zařízení staveniště	20 dny	15.10. 25	11.11. 25						
8	Vyznačení tras, demolic, rozvodů	20 dny	15.10. 25	11.11. 25						
9	Bourání příček	60 dny	12.11. 25	03.02. 26						
10	Bourání podlah	60 dny	12.11. 25	03.02. 26						
11	Prostupy	10 dny	04.02. 26	17.02. 26						
12	Podhledy	10 dny	04.02. 26	17.02. 26						
13	Bourání otvorů	5 dny	04.02. 26	10.02. 26						
14	Nové konstrukce	60 dny	11.02. 26	05.05. 26						
15	Podlahy	30 dny	06.05. 26	16.06. 26						
16	Dveře	60 dny	06.05. 26	28.07. 26						
17		1 den?	28.08. 25	28.08. 25						
18	VZT rozvody	120 dny	12.11. 25	28.04. 26						
19										
20	Elektro	120 dny	12.11. 25	28.04. 26						
21										
22	Laboratorní nábytek	60 dny	06.05. 26	28.07. 26						
23										
24	 Kolaudace zahájení	1 den	28.08. 26	28.08. 26						
25	Kolaudace dokončení - předpoklad???	45 dny	28.08. 26	29.10. 26						
26	Výzva k převzetí díla -30 dní	1 den	29.09. 26	29.09. 26						
27	Převzetí díla	1 den	29.10. 26	29.10. 26						
28	Vyklizení staveniště+20dní	20 dny	22.10. 26	18.11. 26						

Projekt: HMG smlouva Datum: 10.09. 25	Úkol		Milník		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
	Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	

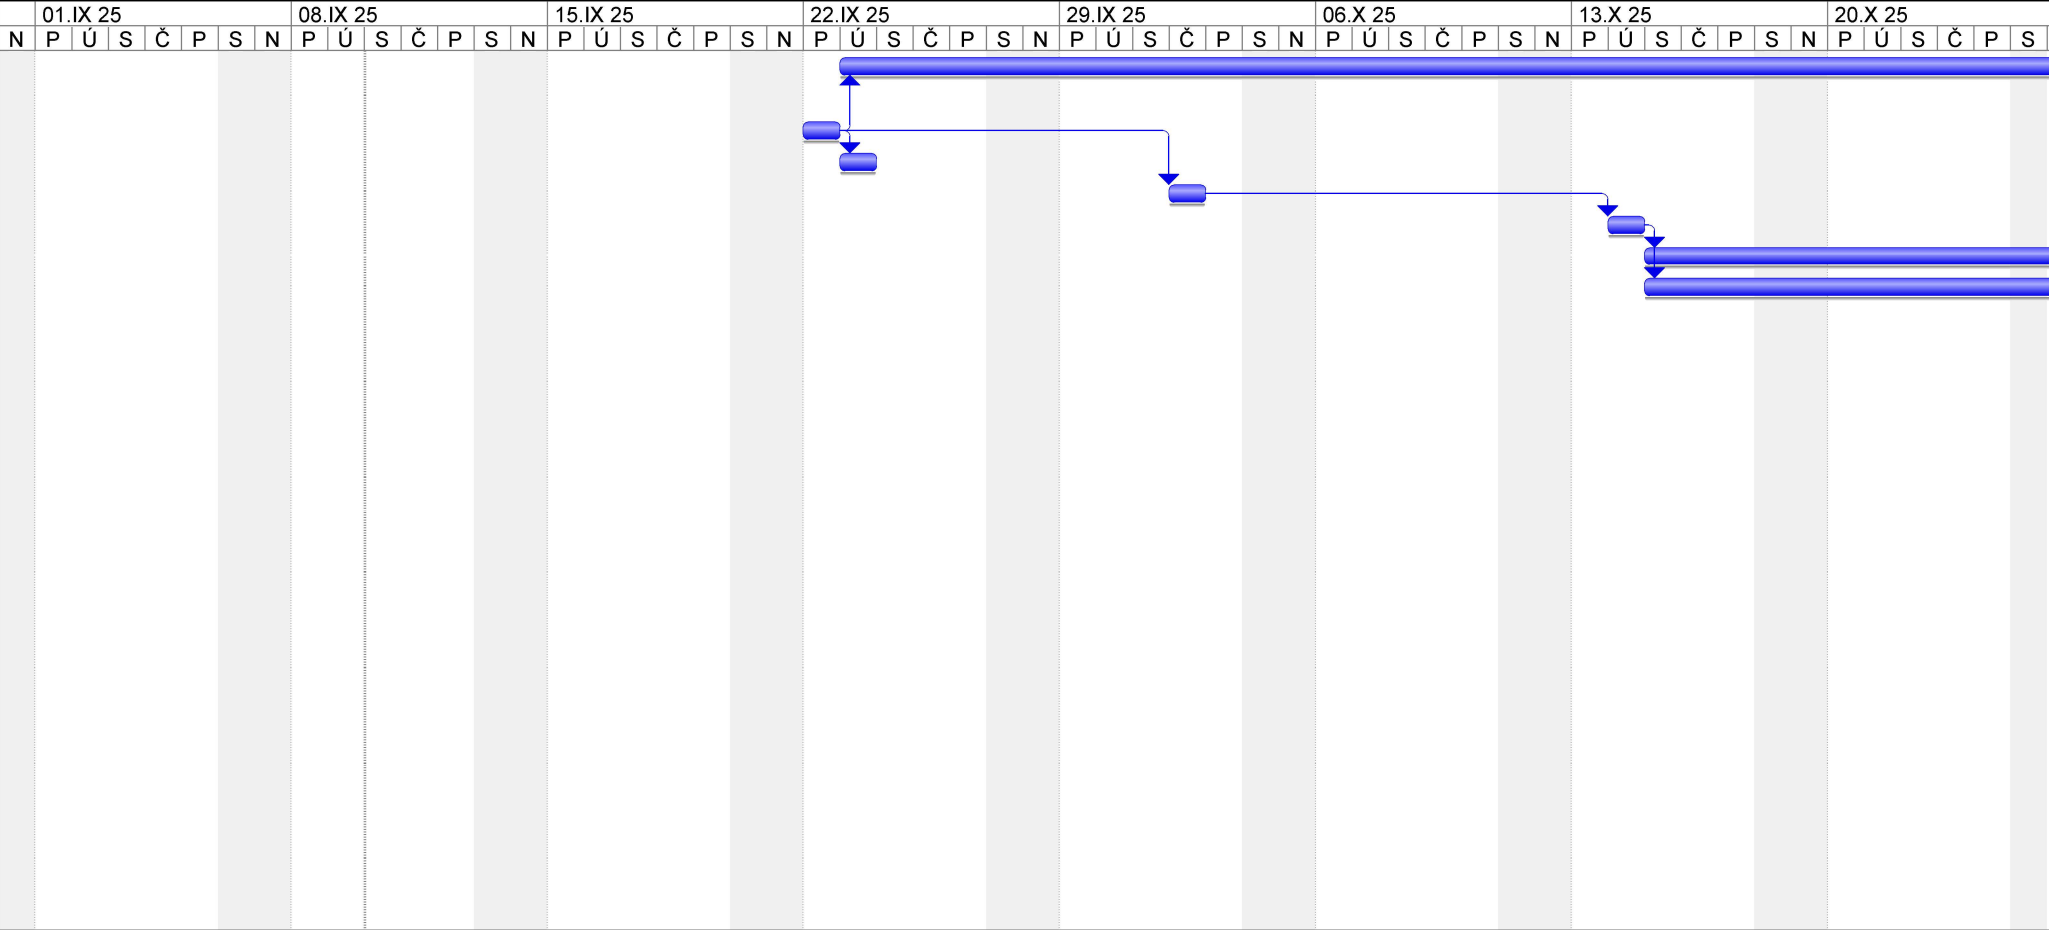

Projekt: HMG smlouva
Datum: 10.09. 25

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

27.X.25							03.XI.25							10.XI.25							17.XI.25							24.XI.25							01.XII.25							08.XII.25							15.XII.25						
N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N						

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Projekt: HMG smlouva

Datum: 10.09. 25

Stránka 3

22.XII 25							29.XII 25							05.I 26							12.I 26							19.I 26							26.I 26							02.II 26							09.II 26						
N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N						
</																																																							

13.IV 26							20.IV 26							27.IV 26							04.V 26							11.V 26							18.V 26							25.V 26							01.VI 26						
N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N						

08.VI 26							15.VI 26							22.VI 26							29.VI 26							06.VII 26							13.VII 26							20.VII 26							27.VII 26						
N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N						

03.VIII 26							10.VIII 26							17.VIII 26							24.VIII 26							31.VIII 26							07.IX 26							14.IX 26							21.IX 26						
N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N						
<																																																							

28.IX 26							05.X 26							12.X 26							19.X 26							26.X 26							02.XI 26							09.XI 26							16.XI 26						
N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N						
<																																																							
