


„Náměstí Běchovice – náměstí“

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	XI	XII	Čtvrť. 1, 2026	I	II	III
1		„Náměstí Běchovice – náměstí“	12.11. 25	26.02. 26						
2		<i>Aktuálně předpokládaný termín započetí prací na SEKTORU 1 s ohledem na aktuální stav stavby "Výstavba 3. pavilonu Centra sociálních služeb Běchovice", tj. podmínka pro započetí prací na tomto SEKTORU (okolnost vyplývající ze skutečností třetí strany)</i>	01.12. 25	01.12. 25						
3		Stavební práce na SEKTORU 1	01.12. 25	29.01. 26						
4		Dokončení prací na SEKTROU 1	29.01. 26	29.01. 26						
5		<i>Možný termín započetí / obnovení prací na SEKTORU 3 s ohledem na částečné dokončení přeložky NN (VN) PRE s napojením na rozvadeč, tj. podmínka pro započetí prací na tomto SEKTORU (okolnost vyplývající ze skutečností třetí strany)</i>	12.11. 25	12.11. 25						
6		Stavební práce na SEKTORU 3	12.11. 25	19.12. 25						
7		Dokončení prací na SEKTORU 3	19.12. 25	19.12. 25						
8		<i>Možný termín započetí / obnovení prací na SEKTORU 2 s ohledem na technické návaznosti s dokončením prací na SEKTORECH 1 a 3, tj. výškové a konstrukční návaznosti na SEKTORY 1 a 3 (minimálně dokončení přímých návazností na tyto sektory)</i>	22.01. 26	22.01. 26						
9		Stavební práce SEKTORU 2	22.01. 26	26.02. 26						
10		Dokončení prací na SEKTORU 2	26.02. 26	26.02. 26						
11		Dokončení „Náměstí Běchovice – náměstí“	26.02. 26	26.02. 26						

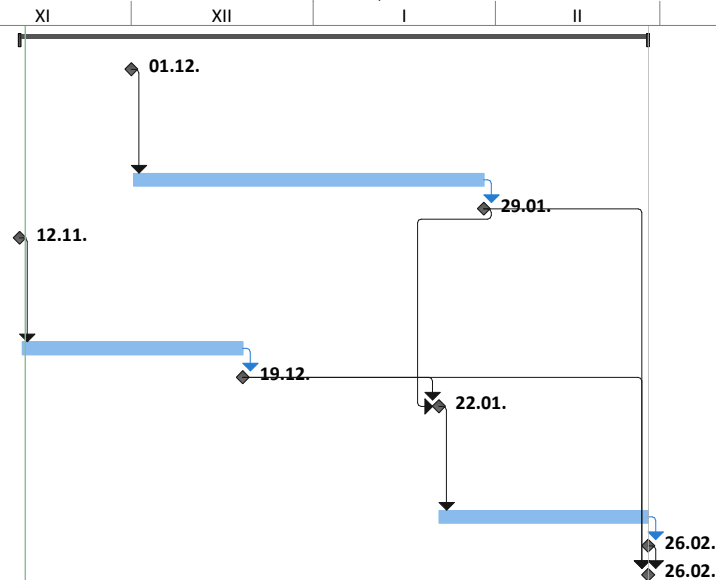

Projekt: „Náměstí Běchovice – nám
Datum: 13.11. 25

Úkol		Neaktivní úkol		Pouze zahájení	
Rozdělení		Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení	
Mezník		Neaktivní souhrn		Konečný termín	
Souhrnný		Ruční úkol		Průběh	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Průběh ručně zadaného úkolu	
Vnější úkoly		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu			
Vnější milník		Ruční souhrn			
