

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Nazýv zdrojů
1	✖	Dokončení revize přeřazených podkladů DK8	10 dny	04.09.17	15.09.17		VRV;G
2	✖	Kontrola stanovisek orgánů státní správy DK8	10 dny	04.09.17	15.09.17		G;VRV
3	✖	M12c	0 dny	15.09.17	15.09.17		
4	✖	Zpracování technického zadání DK8	15 dny	15.09.17	05.10.17		G;VRV
5	✖	M12f	0 dny	05.10.17	05.10.17		
6	✖	Dokončení revize podkladů RNK	7 dny	04.09.17	12.09.17		G;VRV
7	✖	Zpracování studie proveditelnosti, posouzení variant RNK	10 dny	12.09.17	25.09.17		G;VRV
8	✖	Výběr konečné varianty RNK	3 dny	26.09.17	28.09.17	7	
9	✖	Zpracování studie klimatických dopadů RNK	7 dny	29.09.17	09.10.17	8	GEO;G;VRV
10	✖	Dokončení revize podkladů RNČM	7 dny	04.09.17	12.09.17		G;VRV
11	✖	M12a,M12b	0 dny	12.09.17	12.09.17		
12	✖	Zpracování studie proveditelnosti, posouzení variant RNČM	9 dny	13.09.17	25.09.17	10;6	VRV;G
13	✖	M14a	0 dny	25.09.17	25.09.17		
14	✖	Výběr konečné varianty RNČM	3 dny	26.09.17	28.09.17	12	API;G;VRV
15	✖	Zpracování studie klimatických dopadů RNČM	7 dny	29.09.17	09.10.17	14	G;GEO;VRV
16	✖	M14b	0 dny	09.10.17	09.10.17		
17	✖	Vypracování technického zadání RN	16 dny	10.10.17	31.10.17	4;8;14;9	G;VRV
18	✖	M12d,M12e	0 dny	31.10.17	31.10.17		
19	✖	Zahájení výběrového řízení na zhotovitele designových	129 dny	01.11.17	30.04.18	17	G;HH&P;VRV
20	✖	Výběr nejnižšího zhotovitele a uzavření SOD	23 dny	01.05.18	31.05.18	19	API;G;HH&P;VRV
21	✖	Zpracování DSP a zajištění SP pro RN	109 dny	01.06.18	31.10.18	20	G;VRV
22	✖	Zpracování žádosti o dotaci včetně projednání	33 dny	01.11.17	15.12.17		G;VRV
23	✖	M14c	0 dny	15.12.17	15.12.17		
24	✖	Zpracování DUR - objednatel	67 dny	29.09.17	31.12.17	14;8	
25	✖	Podání žádosti na SFŽP, projednání, doplnění	14 dny	01.01.18	18.01.18	24;22	API;G;VRV
26	✖	M1 konec podání žádosti	0 dny	18.01.18	18.01.18		
27	✖	Kontrola formálních náležitostí Fonde	22 dny	19.01.18	19.02.18	25	API;G;VRV
28	✖	Kontrola přijatelnosti Fonde, 44d píneří kritérií	44 dny	20.02.18	20.04.18	27	API;G;VRV
29	✖	Vydání seznamu hodnocených projektů - SFŽP	9 dny	23.04.18	03.05.18	28	
30	✖	Postoupení výběrové komisi - SFŽP	20 dny	04.05.18	31.05.18	29	
31	✖	Schválení projektu, doporučení k financování - SFŽP	15 dny	01.06.18	21.05.18	30	
32	✖	Zpracování zadávací dokumentace pro DK8, odsouhlasení Fonde	61 dny	22.06.18	14.09.18	31	API;G;HH&P;VRV
33	✖	Výběr zhotovitele díla DK8	130 dny	17.09.18	15.03.19	32	API;G;HH&P;VRV
34	✖	Uzavření smlouvy se zhotoviteli	20 dny	18.03.19	12.04.19	33	G;HH&P;VRV
35	✖	Předání SOD a povinné přílohy k ROPD	12 dny	15.04.19	30.04.19	34;21	API;G;VRV
36	✖	M14d	0 dny	30.04.19	30.04.19		
37	✖	Realizace díla viz samostatný harmonogram	652 dny	03.06.19	30.11.21	35	API;BKOM;G;GEO;HH&P;RP4
38	✖	M17,M20,M22	0 dny	30.11.21	30.11.21		
39	✖	Účast při kontrole vad a nedodělků z přejiřmácho řízení díla	130 dny	01.12.21	31.05.22	37	API;G;VRV
40	✖	Kompletace podkladů pro ZVA a jeho odevzdání na SFŽP	66 dny	01.03.22	31.05.22		API;G;VRV
41	✖	M14e	0 dny	31.05.22	31.05.22		

Čtvr. 1, 2018

III


VIII

Kritický Rozdělení kritického úkolu Průběh kritického úkolu Úkol Rozdělení Průběh úkolu

Ruční dílo Pouze zahájení Pouze s datem dokončení

Pouze s dobou trvání Směrný plán Rozdělení podle směrného plánu

Milník podle směrného Milník Průběh souhrnného

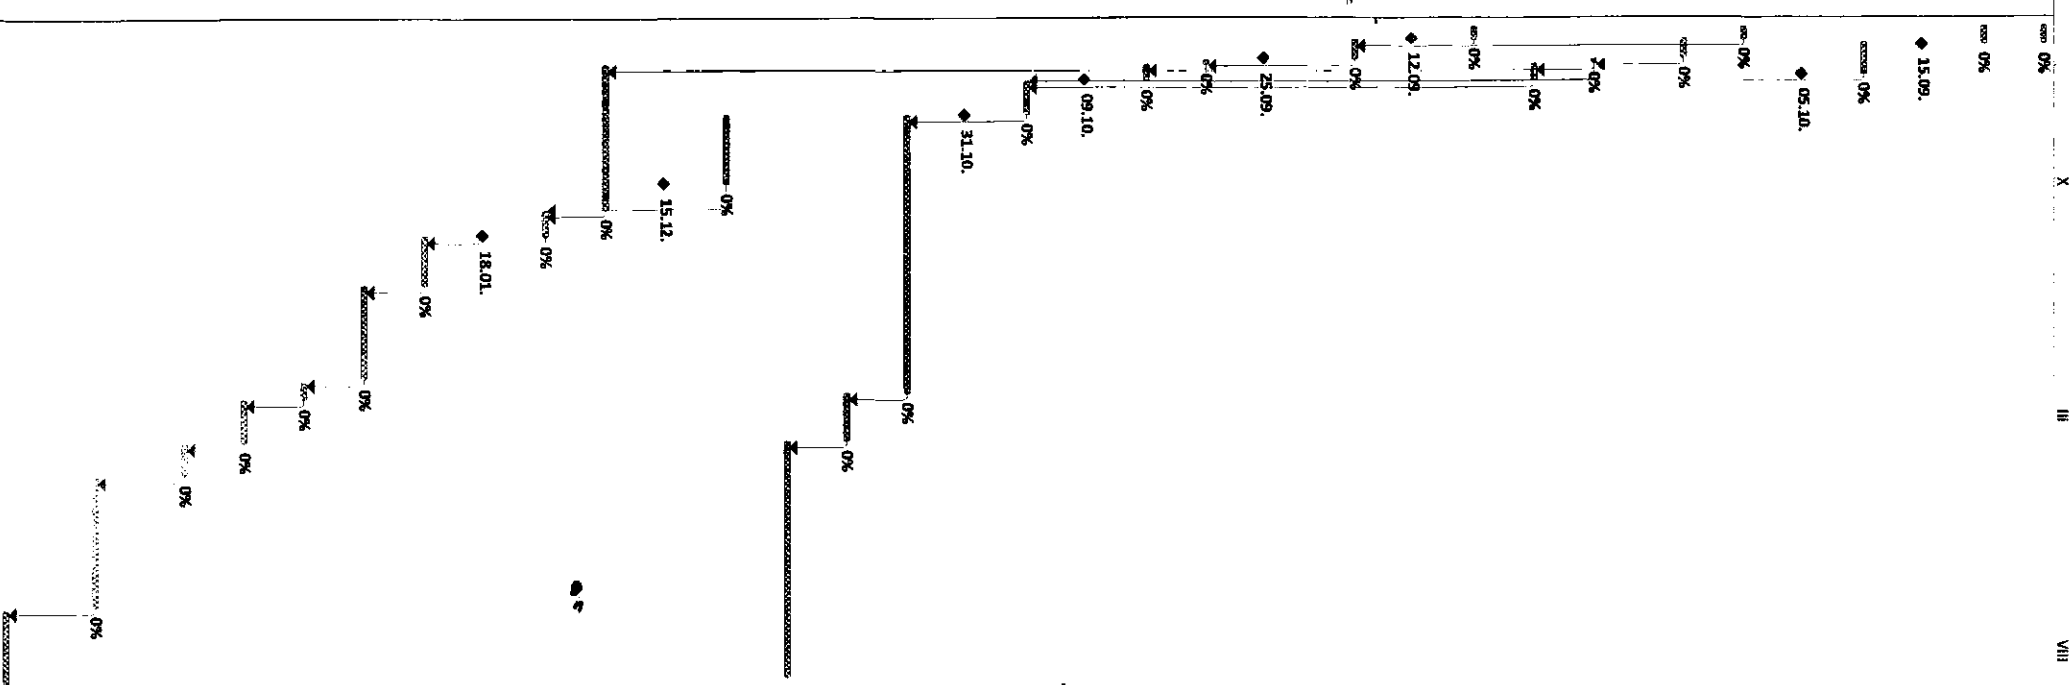

VI

XI

IV


IX

II

VII

XII

V

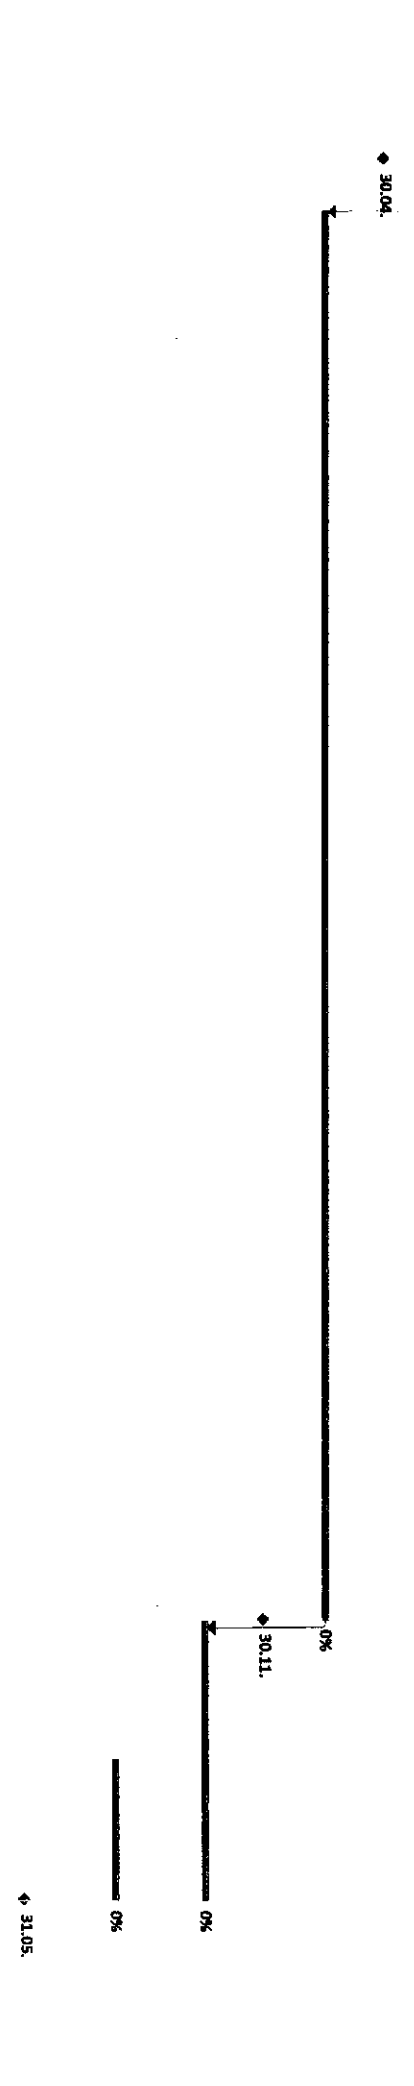

Souhrnný	Vnější úkoly	Neaktivní mlhik
Ruční souhrn	Vnější mlhik	Neaktivní souhrn
Souhrn projektu	Neaktivní díkai	Konečný termín
