


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	17	XII 2017	I 2018	II 2018	III 2018	IV 2018	V 2018	VI 2018	VII 2018	VIII 2018	IX 2018	X 2018	XI 2018	XII 2018
					13.20.27	4. 11.18.25	1. 8. 15.22.29	5. 12.19.26	5. 12.19.26	2. 9. 16.23.30	7. 14.21.28	4. 11.18.25	2. 9. 16.23.30	6. 13.20.27	3. 10.17.24	1. 8. 15.22.29	5. 12.19.26	3. 10.17
1	Brno-FN-Operační sály	371 dny	1.12. 17	6.12. 18														
2	Převzetí staveniště	1 den	1.12. 17	1.12. 17														
3	Zřízení ZS	3 dny	2.12. 17	4.12. 17														
4	I.etapa	117 dny	5.12. 17	31.3. 18														
5	Demontáže,demolice	20 dny	5.12. 17	24.12. 17														
6	Svislé konstrukce,SDK	40 dny	10.12. 17	18.1. 18														
7	Podlahy hrubé	20 dny	25.12. 17	13.1. 18														
8	Podlahy finální	35 dny	23.2. 18	29.3. 18														
9	Výplně otvorů	18 dny	14.1. 18	31.1. 18														
10	Podhledy	45 dny	19.1. 18	23.3. 18														
11	Dokončovací konstrukce	72 dny	19.1. 18	31.3. 18														
12	ZTI+UT	100 dny	20.12. 17	29.3. 18														
13	SIInoproud+Slaboproud	85 dny	30.12. 17	24.3. 18														
14	Rozvody medicialních plynů	80 dny	4.1. 18	24.3. 18														
15	PS01 Zdravotnícka technologie	67 dny	19.1. 18	26.3. 18														
16	PS02 Vzduchotechnika a chlazení	80 dny	25.12. 17	14.3. 18														
17	PS03 MaR	50 dny	3.2. 18	24.3. 18														
18	PS04 EPS	45 dny	29.1. 18	14.3. 18														
19	milník č.1- dokončení I.etapy vč. Předání a převzetí I.etapy do 31.03.2018	1 den	31.3. 18	31.3. 18														
20	II.etapa	107 dny	1.3. 18	15.6. 18														
21	milník č.2- zahájení prací na II.etapě od 01.03.2018	1 den	1.3. 18	1.3. 18														
22	Demontáže,demolice	21 dny	1.3. 18	21.3. 18														
23	Svislé konstrukce,SDK	40 dny	7.3. 18	15.4. 18														
24	Podlahy hrubé	20 dny	22.3. 18	10.4. 18														
25	Podlahy finální	26 dny	19.5. 18	13.6. 18														
26	Výplně otvorů	18 dny	11.4. 18	28.4. 18														
27	Podhledy	45 dny	16.4. 18	10.6. 18														
28	Dokončovací konstrukce	61 dny	16.4. 18	15.6. 18														
29	ZTI+UT	89 dny	17.3. 18	13.6. 18														
30	SIInoproud+Slaboproud	77 dny	27.3. 18	11.6. 18														
31	Rozvody medicialních plynů	75 dny	1.4. 18	14.6. 18														
32	PS01 Zdravotnícka technologie	59 dny	16.4. 18	13.6. 18														
33	PS02 Vzduchotechnika a chlazení	85 dny	22.3. 18	14.6. 18														
34	PS03 MaR	50 dny	26.4. 18	14.6. 18														
35	PS04 EPS	55 dny	18.4. 18	11.6. 18														
36	PS05 Náhradní zdroj	40 dny	6.5. 18	14.6. 18														
37	milník č.3- dokončení II.etapy vč. Předání a převzetí II.etapy do 15.06.2018	1 den	15.6. 18	15.6. 18														
38	III.etapa	110 dny	15.5. 18	1.9. 18														

Projekt: operační sály Datum: 2.11. 17	Úkol		Neaktivní souhrn		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Ruční úkol		Vnější milník	
	Milník		Pouze s dobou trvání		Konečný termín	
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh	
	Souhrn projektu		Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Neaktivní úkol		Pouze zahájení			
	Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2017	XII 2017	I 2018	II 2018	III 2018	IV 2018	V 2018	VI 2018	VII 2018	VIII 2018	IX 2018	X 2018	XI 2018	XII 2018
					13.20.27	4. 11.18.25	1. 8. 15.22.29	5. 12.19.26	5. 12.19.26	2. 9. 16.23.30	7. 14.21.28	4. 11.18.25	2. 9. 16.23.30	6. 13.20.27	3. 10.17.24	1. 8. 15.22.29	5. 12.19.26	3. 10.17
39	milník č.4- zahájení prací na III.etapě od 15.05.2018	1 den	15.5. 18	15.5. 18														
40	Demontáže,demolice	21 dny	15.5. 18	4.6. 18														
41	Svislé konstrukce,SDK	40 dny	21.5. 18	29.6. 18														
42	Podlahy hrubé	20 dny	5.6. 18	24.6. 18														
43	Podlahy finální	31 dny	30.7. 18	29.8. 18														
44	Výplně otvorů	18 dny	25.6. 18	12.7. 18														
45	Podhledy	45 dny	30.6. 18	25.8. 18														
46	Dokončovací konstrukce	64 dny	30.6. 18	1.9. 18														
47	ZTI+UT	92 dny	31.5. 18	30.8. 18														
48	SIlnoproud+Slaboproud	82 dny	10.6. 18	30.8. 18														
49	Rozvody medicialních plynů	75 dny	15.6. 18	28.8. 18														
50	PS01 Zdravotnícka technologie	63 dny	30.6. 18	31.8. 18														
51	PS02 Vzduchotechnika a chlazení	85 dny	5.6. 18	28.8. 18														
52	PS03 MaR	50 dny	12.7. 18	30.8. 18														
53	PS04 EPS	55 dny	7.7. 18	30.8. 18														
54	milník č.5- dokončení III.etapy vč. Předání a převzetí III.etapy do 01.09.2018	1 den	1.9. 18	1.9. 18														
55	VI.etapa	122 dny	1.8. 18	30.11. 18														
56	milník č.6- zahájení prací na IV.etapě od 01.08.2018	1 den	1.8. 18	1.8. 18														
57	Demontáže,demolice	21 dny	1.8. 18	21.8. 18														
58	Svislé konstrukce,SDK	40 dny	7.8. 18	15.9. 18														
59	Podlahy hrubé	20 dny	22.8. 18	10.9. 18														
60	Podlahy finální	34 dny	21.10. 18	23.11. 18														
61	Výplně otvorů	18 dny	11.9. 18	28.9. 18														
62	Podhledy	45 dny	16.9. 18	24.11. 18														
63	Dokončovací konstrukce	76 dny	16.9. 18	30.11. 18														
64	ZTI+UT	105 dny	17.8. 18	29.11. 18														
65	SIlnoproud+Slaboproud	95 dny	27.8. 18	29.11. 18														
66	Rozvody medicialních plynů	75 dny	1.9. 18	14.11. 18														
67	PS01 Zdravotnícka technologie	75 dny	16.9. 18	29.11. 18														
68	PS02 Vzduchotechnika a chlazení	98 dny	22.8. 18	27.11. 18														
69	PS03 MaR	49 dny	11.10. 18	28.11. 18														
70	PS04 EPS	52 dny	6.10. 18	26.11. 18														
71	milník č.7- dokončení IV.etapy vč. Předání a převzetí IV.etapy do 30.11.2018	1 den	30.11. 18	30.11. 18														
72	Likvidace ZS	7 dny	30.11. 18	6.12. 18														
73	Předání stavby	1 den	6.12. 18	6.12. 18														

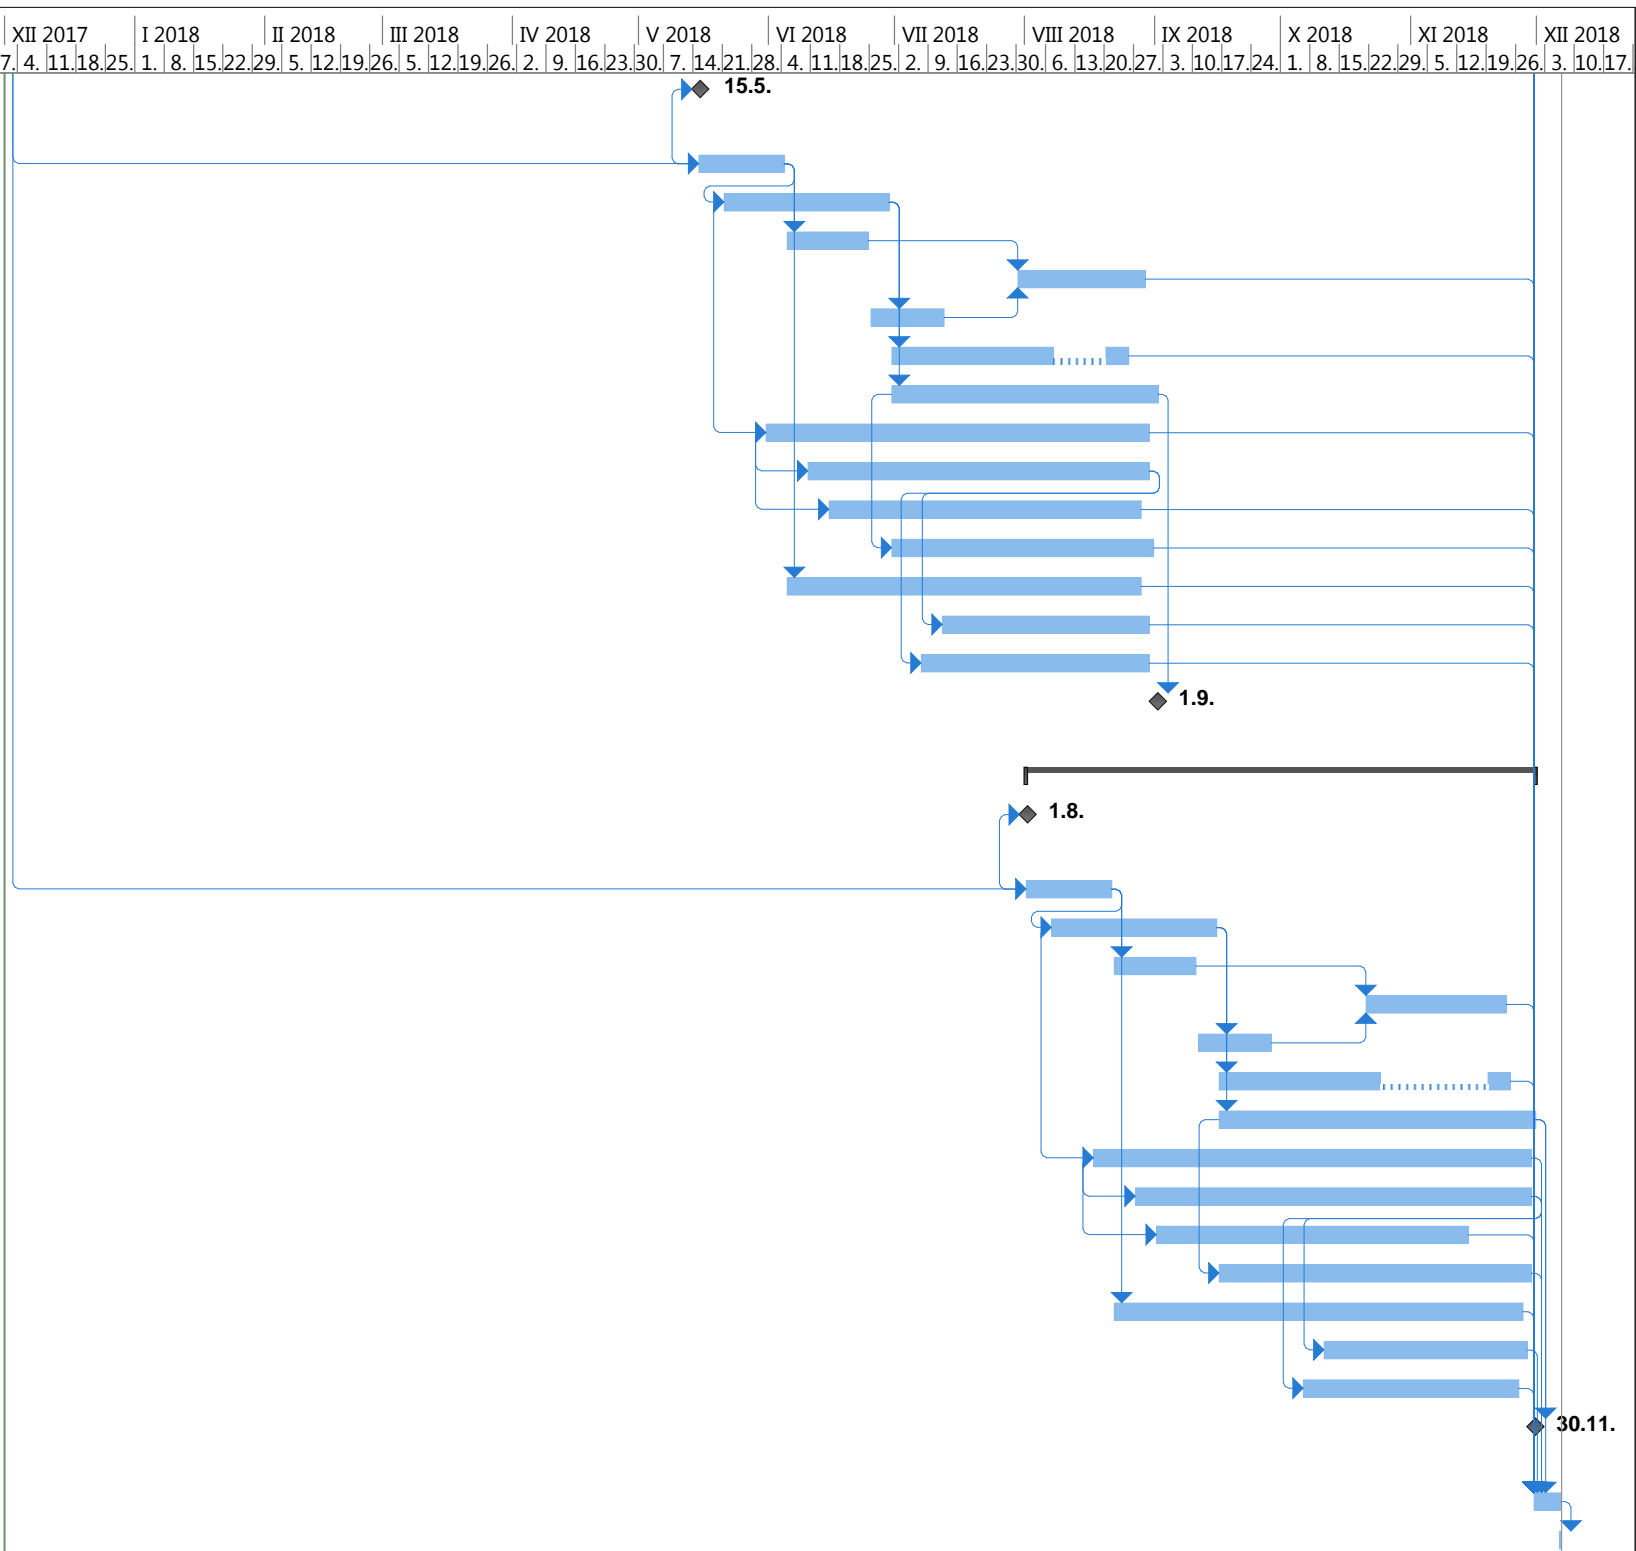

Projekt: operační sály Datum: 2.11. 17	Úkol		Neaktivní souhrn		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Ruční úkol		Vnější milník	
	Milník		Pouze s dobou trvání		Konečný termín	
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh	
	Souhrn projektu		Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Neaktivní úkol		Pouze zahájení			
	Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení			
