


Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí - ev.č. 256, 257, 258

K. D. J. T. C. J.



ID	SO, PS	Nazev úkolu	Doba trvání	časový plán										
				měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9	měsíc 10	měsíc 11
1		Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí - 256, 257, 258	304 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
2		Projektové práce a autorský dozor	304 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
3		Stavební dozor investora	304 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
4		Zahájení stavby	0 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
5		Dočasné zřízení stavby	304 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
6		Eskaletorový tunel (směr Karlovo náměstí)	304 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
7		Úroveň vestibulu (směr Karlovo náměstí)	304 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
8		Úroveň podchodu (směr Karlovo náměstí)	89 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
9		Úroveň faronu (výřezání dojezvní stěny pro stavbu)	304 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
10		Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí - SO, PS	303 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
11		Úroveň nástupišť, Eskaletorový tunel, Úroveň vestibulu	303 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
12		Zábor - zařízení staveniště	3 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
13	SO 01	Stavební část - ochrana stávajících povrchů	8 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
14	SO 04	Informační systém	4 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
15	SO 04	Montáž provizorního informačního systému	2 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
16	SO 04	Demontáž stávajícího informačního systému	2 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
17	SO 06	Reklamní systém - demontáž	2 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
18	SO 01	Stavební část - demontáž okradů	10 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
19	PS 94	Strojní zařízení - dočasna demontáž esk. ev. č. 260, 261 (ÚN - spojovací chodba)	14 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
20	PS 94	Strojní zařízení - kompletní demontáž esk. ev. č. 256, 257, 258	35 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
21	SO 02	Elektroinstalace, osvětlení - demontáž	7 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
22	PS 93-1	Slaboproudá zařízení - demontáž	7 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
23		Zařízení staveniště - osvětlení - montáž	7 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
24	SO 01	Stavební část	145 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
25	SO 01	Vybourání stropu pod eskaletorem	14 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
26	SO 01	Vybourání schodiště v kabalovém kanálu, boky esk. tunelu	14 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
27	SO 01	Vybourání původních esk. základů	7 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
28	SO 01	Demontáž zónů	10 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
29	SO 01	Sanace tybinex	28 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
30	SO 01	Stávající konstrukce - sanace	14 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
31	SO 01	Nosné konstrukce (strop po eskaletorem, schodiště atd.)	28 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
32	SO 01	Stavební přípravenost pro montáž nových eskaletorů	14 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
33	SO 01	Zpevněná montáž zónů	21 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
34	SO 01	Lokální výměna dílů	21 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
35	PS 91-1	Silové rozvody	20 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
36	PS 95	VZT	22 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
37	SO 03	ZTf	20 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
38	PS 94	Strojní zařízení - eskalátory ev. č. 256, 257, 258	76 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
39	PS 94	transport - hruba montáž eskaletorů	28 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
40	PS 94	definitivní uložení eskaletorů	48 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
41	SO 02	Elektroinstalace, osvětlení - montáž	39 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
42	PS 93-1	Slaboproudá zařízení - montáž	15 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
43		Zařízení staveniště - osvětlení - demontáž	5 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
44	SO 01	Stavební část - montáž okradů	14 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										
45		Strojní zařízení - zpevněná montáž esk. ev. č. 260, 261 (ÚN - spojovací chodba)	30 dny	[Gantt chart bars for months 1-11]										

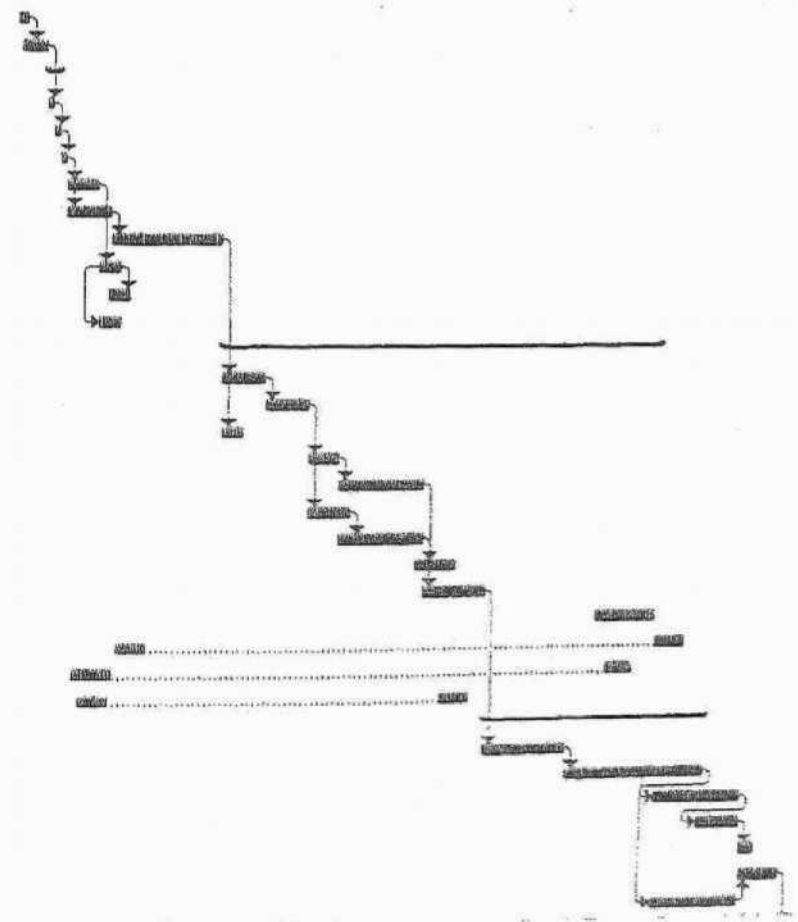

Příloha č. 5

27

