


Harmonogram stavby :

PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE, MASARYKOVO NÁM. 1,

Zhotovitel : JS - abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32 Hustopeče

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	březen				duben				květen							
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
2017/59	PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE, MASARYKOVO NÁM. 1,	05.03.18	21.12.18																
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	05.03.18	21.12.18																
VN	Vedlejší náklady	05.03.18	21.12.18																
ON	Ostatní náklady	05.03.18	21.12.18																
D.1.1	AS ŘEŠENÍ	05.03.18	21.12.18																
000	Projektová dokumentace	05.03.18	09.03.18																
1	Zemní práce	12.03.18	25.05.18																
2	Základy a zvláštní zakládání	02.04.18	25.05.18																
22	Piloty	02.04.18	25.05.18																
3	Svislé a kompletní konstrukce	21.05.18	27.07.18																
38_SK	Těžká montáž	21.05.18	06.07.18																
399	Sádkartonové kce	01.10.18	07.12.18																
43_VT	Venkovní schodiště a terasy	01.11.18	18.12.18																
5	Komunikace	12.11.18	14.12.18																
61	Úpravy povrchů vnitřní	09.07.18	14.09.18																
62	Úpravy povrchů vnější	01.10.18	23.11.18																
63	Podlahy a podlahové konstrukce	20.08.18	26.10.18																
94	Lešení a stavební výtahy	18.06.18	23.11.18																
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.10.18	21.12.18																
96	Bourání konstrukcí	05.03.18	20.04.18																
97	Prorážení otvorů	05.03.18	20.04.18																
99	Staveništní přesun hmot	05.03.18	21.12.18																
994	Požární ochrana	12.11.18	05.12.18																
711	Izolace proti vodě	19.05.18	23.11.18																
712	Živičné krytiny	09.07.18	28.09.18																
713	Izolace tepelné	09.07.18	26.10.18																
762	Konstrukce tesařské	09.07.18	28.09.18																
764	Konstrukce klempířské	09.07.18	28.09.18																
766	Konstrukce truhlářské	01.11.18	19.12.18																
767	Konstrukce zámečnické	17.10.18	14.12.18																

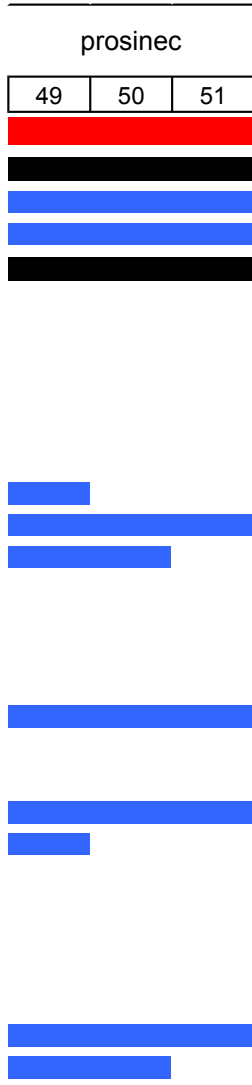

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	březen				duben				květen				23
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
769	Otvorové prvky z plastu	02.07.18	24.08.18													
771	Podlahy z dlaždic a obklady	22.10.18	19.12.18													
776	Podlahy povlakové	12.11.18	21.12.18													
781	Obklady keramické	08.10.18	07.12.18													
784	Malby	17.10.18	07.12.18													
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	12.03.18	11.05.18													
D.1.4.1	ZTI	16.04.18	18.12.18													
1	Zdravotechnika	16.04.18	18.12.18													
D.1.4.2	PLYNOVOD	04.06.18	14.09.18													
1	Plynovod	04.06.18	14.09.18													
D.1.4.4	ELEKTROINSTALACE	04.06.18	07.12.18													
SP01	Elektroinstalace	04.06.18	07.12.18													
Měsíční finanční průběh				563 908,00 Kč				1 409 745,00 Kč				2 208 354,00 Kč				3

červen			červenec				srpen					září				říjen				listopad				
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
497 256,00 Kč			2 118 906,00 Kč				1 356 872,00 Kč					1 201 963,00 Kč				1 572 653,00 Kč							2 194 352,00 Kč	

prosinec		
49	50	51
774 649,00 Kč		
