


PŘÍLOHA Č. 8 Harmonogram

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Responsibility	2018				2019				
						Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	Harmonogram Školka (1.NP A1)	190 days	Wed 11/10/17	Sun 01/07/18										
2	Smlouva, příprava, projekční práce, ocenění	82 days	Wed 11/10/17	Thu 01/02/18										
3	Finální dispozice	0 days	Wed 11/10/17	Wed 11/10/17	Nájemce									
4	Projekční práce: Realizační dokumentace	45 days	Wed 11/10/17	Tue 12/12/17	Pronajímatel									
5	Základní technická specifikace včetně TZB	0 days	Wed 18/10/17	Wed 18/10/17	Nájemce									
6	Předání finální detailní specifikace	0 days	Fri 27/10/17	Fri 27/10/17	Nájemce									
7	Ocenění	25 days	Fri 01/12/17	Thu 04/01/18	Pronajímatel									
8	Odsouhlasení cen/komentáře a úpravy cen a návrhu	25 days	Fri 29/12/17	Thu 01/02/18	Nájemce									
9	Povolovací proces	65 days	Wed 13/12/17	Tue 13/03/18										
10	Povolovací proces	65 days	Wed 13/12/17	Tue 13/03/18	Pronajímatel									
11	Stavební práce	113 days	Fri 26/01/18	Sun 01/07/18										
12	Stavební práce Fit-out	100 days	Fri 26/01/18	Wed 13/06/18	Pronajímatel									
13	Práce nájemce - vybavení kuchyně kolaudačním minimem	5 days	Thu 07/06/18	Wed 13/06/18	Nájemce									
14	Kolaudace	1 day	Thu 14/06/18	Thu 14/06/18	Pronajímatel									
15	Předání prostor nájemci	0 days	Sun 01/07/18	Sun 01/07/18	Nájemce									
16	Datum začátku nájmu	0 days	Sun 01/07/18	Sun 01/07/18										

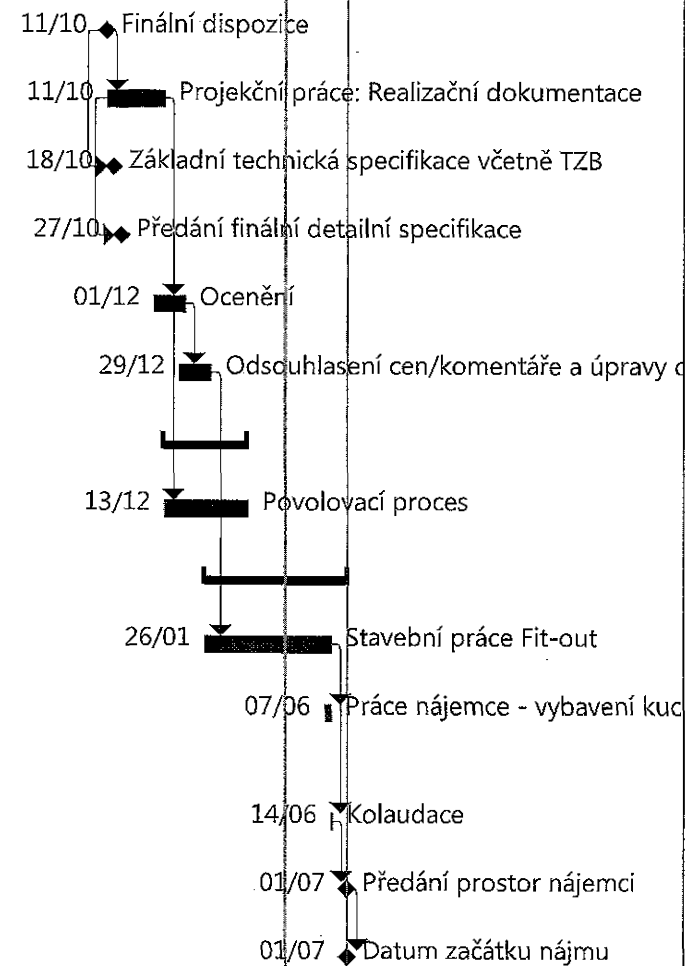

Milníky, termíny a data dodání jsou platná pouze v případě, že Práce Nájemce jsou striktně omezeny, tak jak je definováno v příloze č. 9 Nájemní smlouvy. Pronajímatel budovy nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakákoli prodlení způsobená Prácesmí Nájemce.
