


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Náklady1	2018	VI 2018	VII 2018	VIII 2018	IX 2018	X 2018	XI 2018	
								07.14.21	28.04.11	18.25	02.09.16	23.30.06.13	20.27.03.10.17	24.01.08.15	22.29.05.12.19.
1	Lyžařský svah Písek	67,6 dny	03.09. 18	14.11. 18			0,00 Kč								
2	podpis smlouvy	0 dny	03.09. 18	03.09. 18		3FS+10 dny	0,00 Kč								
3	předání staveniště	1 den	13.09. 18	13.09. 18	2FS+10 dny	5;9FS+21 dny;6FS+10	0,00 Kč								
4	SO 01 - Lyžařské plochy	30 dny	05.10. 18	07.11. 18	10		0,00 Kč								
5	SO 02 - dopravní zařízení	54 dny	17.09. 18	14.11. 18	3		0,00 Kč								
6	SO 03 - Zasněžovací systém	30 dny	25.09. 18	27.10. 18	3FS+10 dny	7FF+5 dny	0,00 Kč								
7	SO 04 - Osvětlení svahu	15 dny	17.10. 18	02.11. 18	6FF+5 dny		0,00 Kč								
8	SO 05 - Oplocení areálu	15 dny	05.10. 18	23.10. 18	10		0,00 Kč								
9	IO 05.6 - Přípojky IS	15 dny	08.10. 18	24.10. 18	3FS+21 dny		0,00 Kč								
10	SO 07 - Demolice a demontáž	10 dny	25.09. 18	05.10. 18	3FS+10 dny	8;4	0,00 Kč								

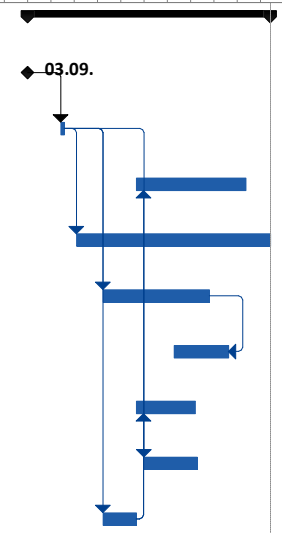

Projekt: harmonogram_lyzarsky_s
Datum: 26.06. 18

Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	
