


Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. březen		1. květen		1. červenec		1. září		1. listopad		1. leden		1. b
				15.2.	14.3.	11.4.	9.5.	6.6.	4.7.	1.8.	29.8.	26.9.	24.10.	21.11.	19.12.	16.1.
1																
2	Vozovna Kobyliisy - HMG s časovým dopadem vlivem podchycení stěi	340 dny	14.3. 16	16.2. 17												
3	Předání a převzetí staveniště	0 dny	14.3. 16	14.3. 16												
4	Předání díla	0 dny	16.2. 17	16.2. 17												16.2.
5	Přípravné práce lodí č.1 (šterky ,oplocení , zástěna,přeložka vody,pasport,geodetické práce-vytyčovací síť)	14 dny	15.3. 16	28.3. 16												
6	Projekční práce	65 dny	14.3. 16	17.5. 16												
7	Zahájení Etapy 1	0 dny	19.3. 16	19.3. 16												
8	Dokončení Etapy 1	0 dny	26.7. 16	26.7. 16												
9	Zahájení Etapy 2	0 dny	27.7. 16	27.7. 16												
10	Dokončení Etapy 2	0 dny	2.10. 16	2.10. 16												
11	Zahájení Etapy 3	0 dny	3.10. 16	3.10. 16												
12	Dokončení Etapy 3	0 dny	1.12. 16	1.12. 16												
13	Zahájení Etapy 4	0 dny	2.12. 16	2.12. 16												
14	Dokončení Etapy 4	0 dny	16.2. 17	16.2. 17												16.2.
15	Loď I-IV	335 dny	19.3. 16	16.2. 17												
16	Loď I (Etapa 1)	130 dny	19.3. 16	26.7. 16												
17	Loď I (Etapa 1) - demoliční práce a práce zrealizované v souběhu se zajištěním	70 dny	19.3. 16	27.5. 16												
18	Zajištění záporami včetně provedení výdřevy,vzpěr	9 dny	11.4. 16	19.4. 16												
19	vrtání zápor	7 dny	11.4. 16	17.4. 16												
20	výdřeva	5 dny	15.4. 16	19.4. 16												
21	Podezdívání základů včetně zemních prací	23 dny	12.4. 16	4.5. 16												
22	Podezdívka Zadní část lodí až sloup č. 4	8 dny	12.4. 16	19.4. 16												
23	Podezdívání sloup č.4 až č.8	8 dny	18.4. 16	25.4. 16												
24	Podezdívání sloup č.8 až přední část lodí	10 dny	25.4. 16	4.5. 16												
25	Demolice základu na koleji č.1 včetně zemních prací a podkladních betonů a dobetonávky u stávajícího základu .	20 dny	20.4. 16	9.5. 16												
26	Demolice základu na koleji č.1 včetně zemních prací podkladních betonů včetně příčných pasů kolej č.1 a č.2 + dobetonávka u stávajícího základu.Mezi osami Zadní části lodí a sloupem č.4	7 dny	20.4. 16	26.4. 16												
27	Demolice základu na koleji č.1 včetně zemních prací a podkladních betonů + dobetonávka u stávajícího základu. Sloup č. 4 až č.8	7 dny	26.4. 16	2.5. 16												
28	Demolice základu na koleji č.1 včetně zemních prací a podkladních betonů + dobetonávka u stávajícího základu. Sloup č. 8 až čelo lodí	7 dny	3.5. 16	9.5. 16												
29	Základ pod stěnu ochozu	16 dny	27.4. 16	12.5. 16												




Projekt: Vozovna Kobyliisy
 Datum: 20.4.2016
 HMG dopad podchycení stěny

Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn
Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení
Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín
Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh

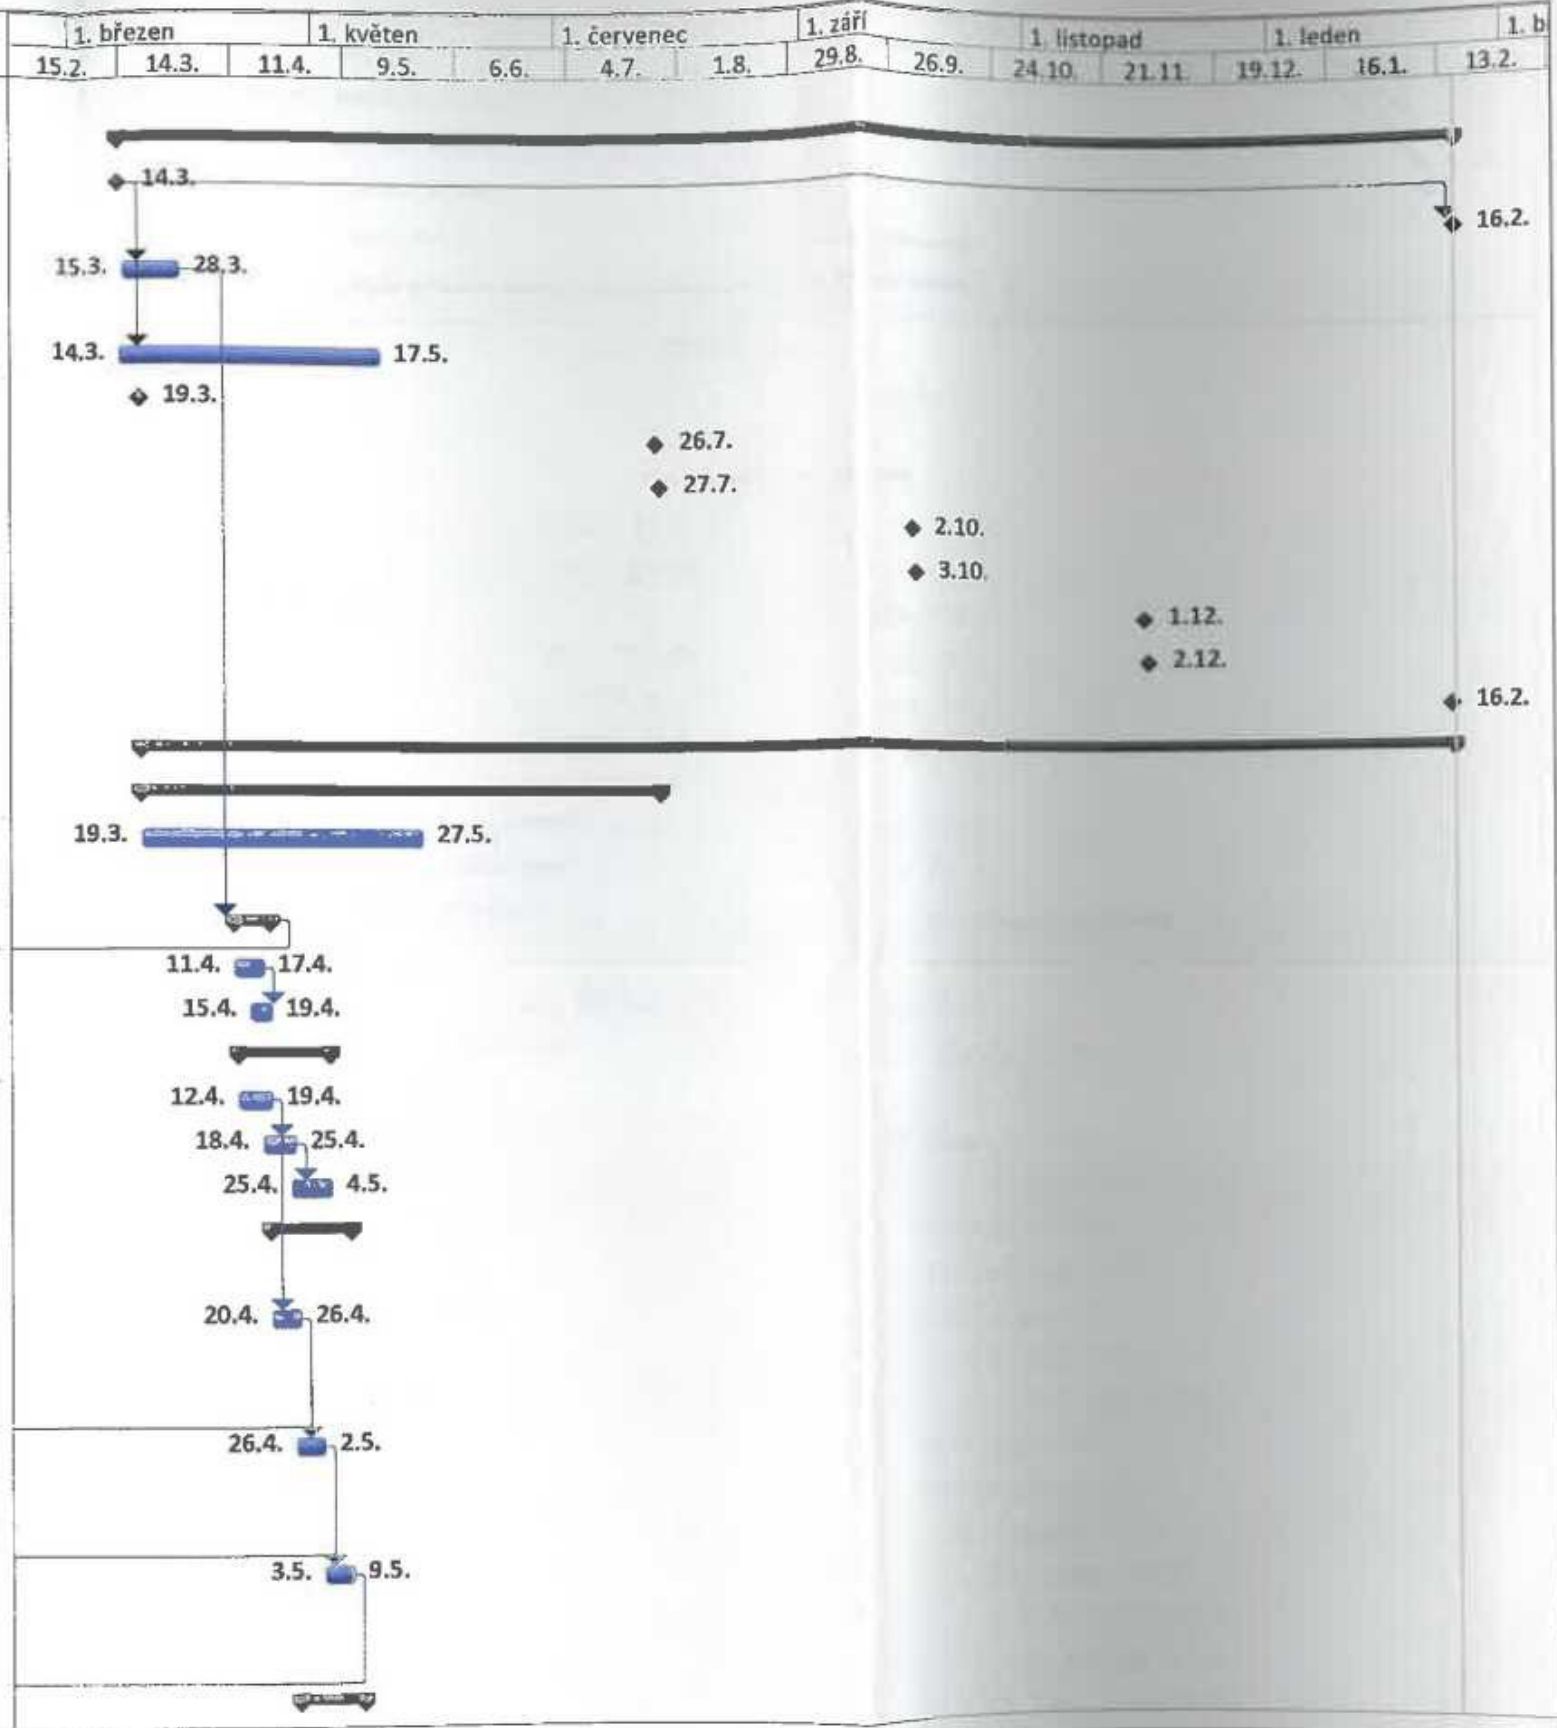

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. březen		1. květen		1. červenec		1. září	1. listopad		1. leden		1. b
					15.2.	14.3.	11.4.	9.5.	6.6.	4.7.	1.8.	29.8.	26.9.	24.10.	21.11.	19.12.
30	úsek zadní část lodí až sloup č.4	3 dny	27.4. 16	29.4. 16			27.4.	29.4.								
31	úsek sloup č.4 až sloup č.8	3 dny	3.5. 16	5.5. 16			3.5.	5.5.								
32	úsek sloup č.8 až přední část lodí	3 dny	10.5. 16	12.5. 16			10.5.	12.5.								
33	Vyzdívky kolej č.1	15 dny	30.4. 16	14.5. 16												
34	úsek zadní část lodí až sloup č.4	2 dny	30.4. 16	1.5. 16			30.4.	1.5.								
35	úsek sloup č.4 až sloup č.8	2 dny	7.5. 16	8.5. 16			7.5.	8.5.								
36	úsek sloup č.8 až přední část lodí	2 dny	13.5. 16	14.5. 16			13.5.	14.5.								
37	Strop- plechy, podpěrka, betonáž	15 dny	5.5. 16	19.5. 16												
38	úsek zadní část lodí až sloup č.4	5 dny	5.5. 16	9.5. 16			5.5.	9.5.								
39	úsek sloup č.4 až sloup č.8	5 dny	10.5. 16	14.5. 16			10.5.	14.5.								
40	úsek sloup č.8 až přední část lodí	5 dny	15.5. 16	19.5. 16			15.5.	19.5.								
41	Prefa montáž - kolej č. 1,2 úsek ZK 24 - ZB20	4 dny	2.5. 16	5.5. 16			2.5.	5.5.								
42	Zemní práce od Z18 - příčné pasy po ZB 15	3 dny	10.5. 16	12.5. 16			10.5.	12.5.								
43	Montáž kolejové dráhy PJ 1. část	4 dny	16.5. 16	19.5. 16			16.5.	19.5.								
44	Montáž kolejové dráhy PJ 2.část	2 dny	24.5. 16	25.5. 16			24.5.	25.5.								
45	Montáž portálového jeřábu včetně dráhy	2 dny	5.6. 16	6.6. 16					5.6.	6.6.						
46	Zemní práce výkopy včetně kanalizace	22 dny	10.5. 16	31.5. 16			10.5.	31.5.								
47	Zemní práce výkopy včetně podkl.betonu kolej č.3	10 dny	3.6. 16	12.6. 16					3.6.	12.6.						
48	Podkladní betony pod prefu	20 dny	14.5. 16	2.6. 16			14.5.	2.6.								
49	Zdění stěn	20 dny	26.5. 16	14.6. 16			26.5.	14.6.								
50	Montáž prefa Kolej č. 1, 2, 4, 5 od ZB 20 směrem k čelu lodě	57 dny	13.4. 16	8.6. 16			13.4.	8.6.								
51	Montáž prefa Kolej č. 3	14 dny	7.6. 16	20.6. 16					7.6.	20.6.						
52	Zatahování kolejnic včetně kotvení do monolitů	10 dny	9.7. 16	18.7. 16					9.7.	18.7.						
53	Základy pod obvodové zdivo (nástupiště)	39 dny	4.4. 16	12.5. 16			4.4.	12.5.								
54	Základy pod kyvné stojky a ztužidla	49 dny	16.5. 16	3.7. 16			16.5.	3.7.								
55	Svislé konstrukce - ztužidla	33 dny	6.6. 16	8.7. 16					6.6.	8.7.						
56	Zásypy	19 dny	24.6. 16	12.7. 16					24.6.	12.7.						
57	Podlahy v montážní jámě	9 dny	10.7. 16	18.7. 16					10.7.	18.7.						
58	Nové nástupiště včetně úprav dvora a žb desky	8 dny	13.7. 16	20.7. 16					13.7.	20.7.						
59	profese - VZT, Elektro kompletace	8 dny	14.7. 16	21.7. 16					14.7.	21.7.						
60	Dřevěné podlahy a schodiště	6 dny	18.7. 16	23.7. 16					18.7.	23.7.						
61	Stěna u koleje č. 6	14 dny	20.4. 16	3.5. 16			20.4.	3.5.								
62	Vyčištění objektu	2 dny	22.7. 16	23.7. 16					22.7.	23.7.						
63	Vyčištění trakce,Předání díla + Zahájení zkušebního provozu	3 dny	24.7. 16	26.7. 16					24.7.	26.7.						
64	Loď II (Etapa 2)	68 dny	27.7. 16	2.10. 16												
65	Loď II (Etapa 2) - zahájení činnosti	0 dny	27.7. 16	27.7. 16												
66	Předání staveniště včetně úpravy trakce	2 dny	27.7. 16	28.7. 16					27.7.	28.7.						
67	Demontáže a bourání včetně podepření nástupišť	20 dny	29.7. 16	17.8. 16					29.7.	17.8.						

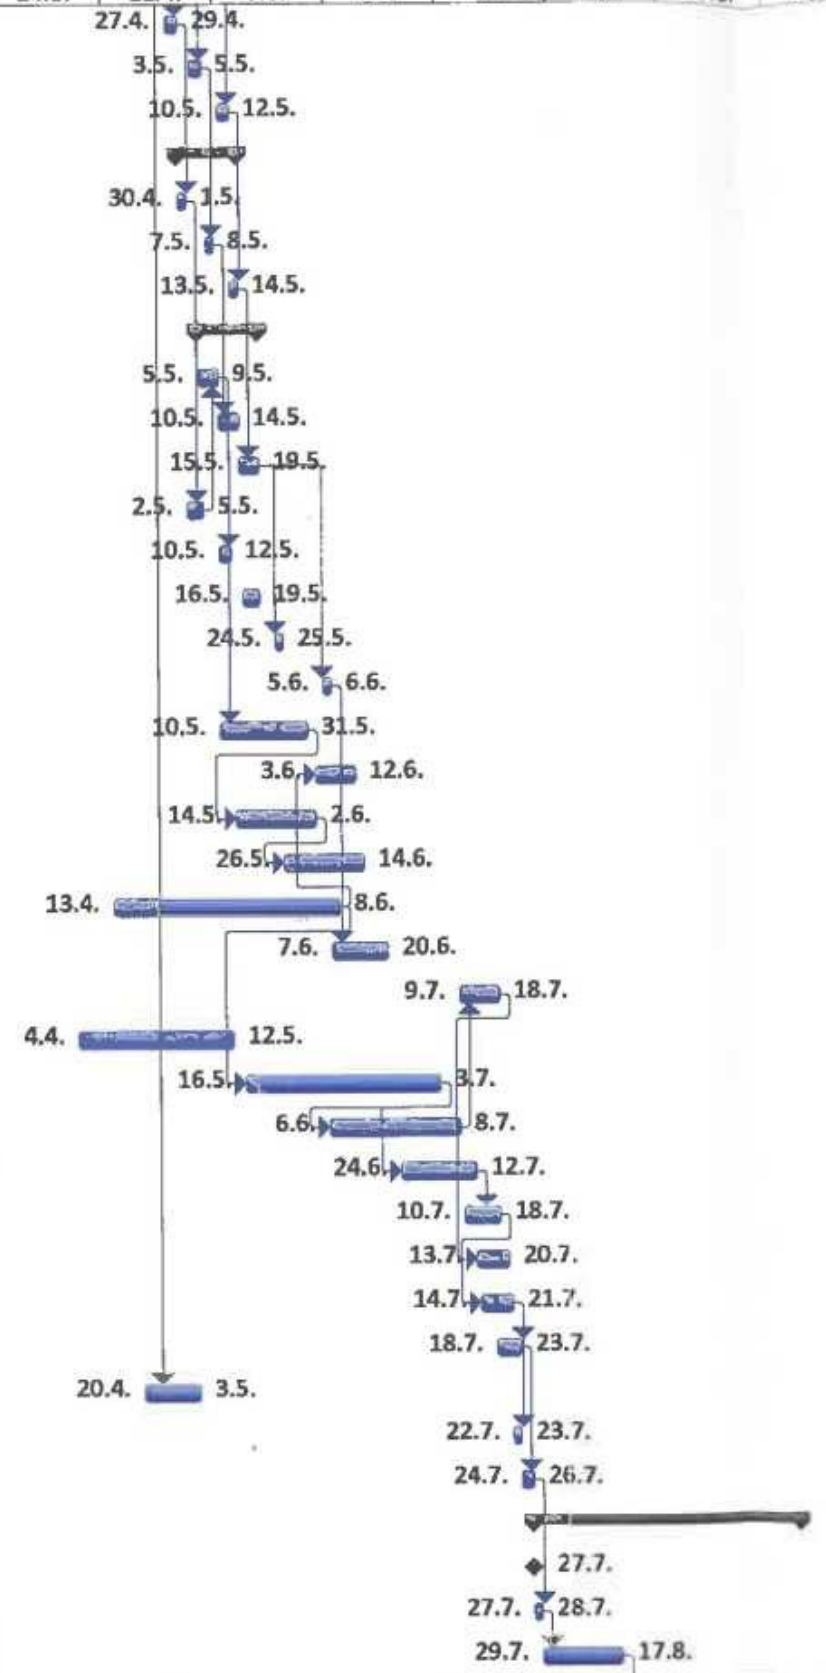

Projekt: Vozovna Kobylisy Datum: 20.4.2016 HMG dopad podchycení stěny	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	




Projekt: HMG dopad

Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. březen		1. květen		1. červenec		1. září		1. listopad		1. leden		1. březen
				15.2.	14.3.	11.4.	9.5.	6.6.	4.7.	1.8.	29.8.	26.9.	24.10.	21.11.	19.12.	16.1.
68	Montáž portálového jeřábu včetně dráhy	5 dny	7.8. 16	11.8. 16						7.8.	11.8.					
69	Zemní práce - bez koleje č. 8	17 dny	8.8. 16	24.8. 16						8.8.	24.8.					
70	Zemní práce výkopy včetně podkl.betonu kolej č.8	10 dny	12.8. 16	21.8. 16						12.8.	21.8.					
71	Podkladní betony pod prefa a vyzdívky bez koleje č.8	12 dny	16.8. 16	27.8. 16						16.8.	27.8.					
72	Zdění stěn	20 dny	20.8. 16	8.9. 16						20.8.	8.9.					
73	Montáž prefa Kolej č. 6,7,9,10	12 dny	19.8. 16	30.8. 16						19.8.	30.8.					
74	Montáž prefa Kolej č. 8	10 dny	14.8. 16	23.8. 16						14.8.	23.8.					
75	Zatahování kolejnic včetně kotvení do monolitů	10 dny	16.9. 16	25.9. 16							15.9.	25.9.				
76	Základy pod obvodové zdivo (nástupiště)	12 dny	18.8. 16	29.8. 16						18.8.	29.8.					
77	Základy pod kyvné stojky a ztužidla bez koleje č.8	22 dny	21.8. 16	11.9. 16						21.8.	11.9.					
78	Svislé konstrukce - ztužidla	20 dny	27.8. 16	15.9. 16						27.8.	15.9.					
79	Zásypy	16 dny	2.9. 16	17.9. 16						2.9.	17.9.					
80	Podlahy v montážní jámě	12 dny	15.9. 16	26.9. 16						15.9.	26.9.					
81	Nové nástupiště včetně úprav dvora a žb desky	9 dny	20.9. 16	28.9. 16						20.9.	28.9.					
82	profese - VZT, Elektro kompletace	7 dny	22.9. 16	28.9. 16						22.9.	28.9.					
83	Dřevěné podlahy a schodiště	6 dny	25.9. 16	30.9. 16						25.9.	30.9.					
84	HEVERY a MOTORY - konstrukce	19 dny	18.8. 16	5.9. 16						18.8.	5.9.					
85	Vyčištění objektu	2 dny	29.9. 16	30.9. 16						29.9.	30.9.					
86	Vyčištění trakce,Předání díla + Zahájení zkušebního provozu	2 dny	1.10. 16	2.10. 16						1.10.	2.10.					
87	Loď III (Etapa 3)	60 dny	3.10. 16	1.12. 16												
88	Loď III (Etapa 3) - zahájení činnosti	0 dny	3.10. 16	3.10. 16							3.10.					
89	Předání staveniště včetně úpravy trakce	1 den	3.10. 16	3.10. 16						3.10.	3.10.					
90	Demontáže a bourání včetně podepření nástupišť	20 dny	4.10. 16	23.10. 16						4.10.	23.10.					
91	Montáž portálového jeřábu včetně dráhy	5 dny	12.10. 16	16.10. 16						12.10.	16.10.					
92	Zemní práce výkopy - bez koleje č. 13	15 dny	10.10. 16	24.10. 16						10.10.	24.10.					
93	Zemní práce výkopy včetně podkl.betonu kolej č.13	10 dny	27.10. 16	5.11. 16						27.10.	5.11.					
94	Podkladní betony pod prefa a bez koleje č.13	12 dny	16.10. 16	27.10. 16						16.10.	27.10.					
95	Zdění stěn	20 dny	20.10. 16	8.11. 16						20.10.	8.11.					
96	Montáž prefa Kolej č. 11,12,14,15	14 dny	19.10. 16	1.11. 16						19.10.	1.11.					
97	Montáž prefa Kolej č. 13	10 dny	29.10. 16	7.11. 16						29.10.	7.11.					
98	Zatahování kolejnic včetně kotvení do monolitů	10 dny	12.11. 16	21.11. 16						12.11.	21.11.					
99	Základy pod obvodové zdivo (nástupiště)	12 dny	18.10. 16	29.10. 16						18.10.	29.10.					
100	Základy pod kyvné stojky a ztužidla bez koleje č.13	24 dny	19.10. 16	11.11. 16						19.10.	11.11.					
101	Svislé konstrukce - ztužidla	18 dny	25.10. 16	11.11. 16						25.10.	11.11.					
102	Zásypy	14 dny	2.11. 16	15.11. 16						2.11.	15.11.					
103	ŽB podlahy v montážní jámě	12 dny	13.11. 16	24.11. 16						13.11.	24.11.					
104	Nové nástupiště včetně úprav dvora a žb desky	10 dny	16.11. 16	25.11. 16						16.11.	25.11.					
105	profese - VZT, Elektro kompletace,SV, Vysavač	8 dny	20.11. 16	27.11. 16						20.11.	27.11.					

Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	

Projekt: Vozovna Kobylisy
Datum: 20.4.2016
HMG dopad podchycení stěny

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. březen		1. květen		1. červenec		1. září	1. listopad		1. leden		1. b
					15.2.	14.3.	11.4.	9.5.	6.6.	4.7.	1.8.	29.8.	26.9.	24.10.	21.11.	19.12.
106	Dřevěné podlahy a schodiště	6 dny	24.11. 16	29.11. 16								24.11.	29.11.			
107	Podlahy snížení betonové včetně VSŽ plechů	15 dny	2.11. 16	16.11. 16								2.11.	16.11.			
108	Vyčištění objektu	2 dny	28.11. 16	29.11. 16								28.11.	29.11.			
109	Vyčištění trakce, Předání díla + Zahájení zkušebního provozu	2 dny	30.11. 16	1.12. 16								30.11.	1.12.			
110	Loď IV (Etapa 4)	77 dny	2.12. 16	16.2. 17												
111	Loď IV (Etapa 4) - zahájení činnosti	0 dny	2.12. 16	2.12. 16								2.12.	2.12.			
112	Předání staveniště včetně úpravy trakce	1 den	2.12. 16	2.12. 16								2.12.	2.12.			
113	Demontáže a bourání včetně podepření nástupišť	20 dny	3.12. 16	22.12. 16								3.12.	22.12.			
114	Montáž portálového jeřábu včetně dráhy	5 dny	11.12. 16	15.12. 16								11.12.	15.12.			
115	Zemní práce výkopy - bez koleje č. 18	17 dny	9.12. 16	25.12. 16								9.12.	25.12.			
116	Zemní práce výkopy včetně podkl. betonu kolej č.18	10 dny	28.12. 16	6.1. 17								28.12.	6.1.			
117	Podkladní betony pod prefa a bez koleje č.18	12 dny	17.12. 16	28.12. 16								17.12.	28.12.			
118	Zdění stěn	20 dny	21.12. 16	9.1. 17								21.12.	9.1.			
119	Montáž prefa Kolej č. 16,17,19,20	14 dny	20.12. 16	2.1. 17								20.12.	2.1.			
120	Montáž prefa Kolej č. 18	10 dny	30.12. 16	8.1. 17								30.12.	8.1.			
121	Zatahování kolejnic včetně kotvení do monolitů	10 dny	28.1. 17	6.2. 17									28.1.	6.2.		
122	Základy pod obvodové zdivo (nástupiště)	12 dny	19.12. 16	30.12. 16								19.12.	30.12.			
123	Základy pod kyvné stojky a ztužidla bez koleje č.13	24 dny	20.12. 16	12.1. 17								20.12.	12.1.			
124	Svislé konstrukce - ztužidla	33 dny	26.12. 16	27.1. 17								26.12.	27.1.			
125	Přerušení prací od 23.12.2016 do 1.1.2016	10 dny	23.12. 16	1.1. 17								23.12.	1.1.			
126	Zásypy	21 dny	3.1. 17	23.1. 17								3.1.	23.1.			
127	ŽB podlahy v montážní jámě	10 dny	22.1. 17	31.1. 17									22.1.	31.1.		
128	Nové nástupiště včetně úprav dvora a žb desky	10 dny	1.2. 17	10.2. 17									1.2.	10.2.		
129	profese - VZT, Elektro kompletace, Vysavač, Mazání zpětná mo	6 dny	30.1. 17	4.2. 17									30.1.	4.2.		
130	Dřevěné podlahy a ok schodiště	10 dny	5.2. 17	14.2. 17									5.2.	14.2.		
131	Zámečnické konstrukce	9 dny	2.2. 17	10.2. 17									2.2.	10.2.		
132	Podlahy snížení betonové včetně VSŽ plechů	24 dny	3.1. 17	26.1. 17								3.1.	26.1.			
133	Vyčištění objektu	1 den	15.2. 17	15.2. 17										15.2.	15.2.	
134	Vyčištění trakce, Předání díla + Zahájení zkušebního provozu	2 dny	15.2. 17	16.2. 17										15.2.	16.2.	

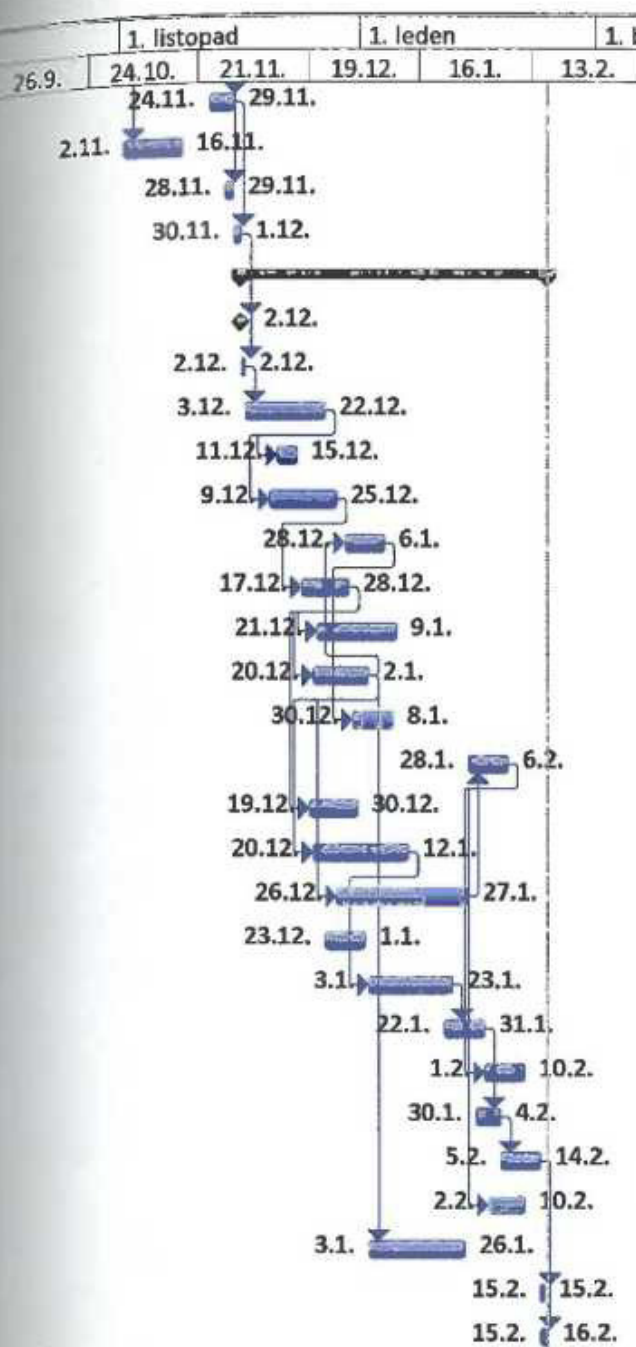

Projekt: Vozovna Kobylisy
Datum: 20.4.2016
HMG dopad podchycení stěny

Úkol		Vnější milník
Rozdělení		Neaktivní úkol
Milník		Neaktivní milník
Souhrnný		Neaktivní souhrn
Souhrn projektu		Ruční úkol
Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání

	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
	Ruční souhrn
	Pouze zahájení
	Pouze s datem dokončení
	Konečný termín
	Průběh
